



بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين

مدينة يطا



وثيقة الخطة التنموية المحلية لمدينة يطا 2023 – 2026



بمشاركة

بلدية يطا والمؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمع المحلي

آذار / 2023



صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية
Municipal Development & Lending Fund

أ.	كلمة رئيس البلدية	4
ب.	قرار مجلس الهيئة المحلية باعتماد الخطة التنموية المحلية.....	5
ج.	الوثيقة المجتمعية	6
د.	ملخص تنفيذي	10
1.0	مقدمة	14
1.1	أهداف الخطة	14
1.2	منهجية إعداد الخطة	14
2.0	نبذة عن مدينة يطا	18
2.5	حدود الصلاحيات الفلسطينية.....	20
3.	بلدية يطا	21
3.1	النشأة.....	21
3.2	الرسالة والرؤية والقيم	21
3.3	الهيكلية	21
3.4	الخدمات المقدمة	22
4	السكان والديموغرافيا	23
4.1	النمو السكاني.....	23
4.2	التطور السكاني	23
5.	التحليل التشخيصي - تشخيص المجالات التنموية.....	26
5.1	البيئة والبنية التحتية	27
	قطاع المياه	28
5.2	مجال تنمية الاقتصاد المحلي	31
	الصناعة.....	33
5.3	مجال التنمية الاجتماعية	36
	التربية والتعليم	37
	الصحة.....	38
	الشباب الرياضة.....	42
5.4	الإدارة والحكم الرشيد.....	43
6	الإطار التنموي المحلي	47
6.1	جدول القضايا والأهداف والبرامج.....	47
6.2	ملخص ارتباط التشخيص بقطاعات التكيف مع المناخ وتحليل القضايا وأثرها من منظور التكيف مع التغير المناخي	55

61.....	7. خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم.....
61.....	7.1 خطة التنفيذ (رباعية) اربع سنوات.....
85.....	7.2 خطة التنفيذ (السنة الأولى 2023)
92.....	7.3 خطة المتابعة والتقييم.....
98.....	8 . شمولية الخطة التنموية للمشاريع المستجيبة لاحتياجات الفئات المهمشة وتحسين البيئة والمناخ:.....
102.....	9. البعد المكاني لمكونات البرامج/المشاريع
105.....	10. الملاحق
105.....	10.1 اللجان التي شاركت في اعداد الخطة
110.....	10.2 البرامج التنموية
138.....	10.3 وصف مكونات بعض المشاريع والبرامج المهمة

أتقدم بالشكر الجزيل، وعظيم الامتنان لكل من ساهم في صياغة هذه الخطة، من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني وخبراء وأفراد كل باسمه ولقبه، حيث تم صياغة الخطة التنموية المحلية لمدينة يطا للأعوام 2023-2026, بعد تفانيكم وابداعكم في التحليل والدراسة ووضع الرؤية والأهداف التي نصبو إليها.

ولا يسعنا إلا أن نشكر وزارة الحكم المحلي و صندوق تطوير وإقراض البلديات لتمويلهم وإشرافهم على اعداد الخطة، وهذا يأتي ضمن رؤيتهم وهدفهم لتطوير واقع المدن والبلدات الفلسطينية بشكل علمي ومدرّوس.

والشكر موصول للمكتب الاستشاري (شركة بيلارز) لمتابعتها الحثيثة لكل الأنشطة والمواد المستخدمة خلال فترة اعداد الخطة.

ونشير هنا، أن المرحلة الأولى قد تمت بنجاح ولله الحمد، وهنا بدانا المرحلة الأصعب، وهي تحقيق الأهداف والمشاريع التي تضمنتها الخطة، حيث يبدأ دورنا جميعا، لنتكاتف معا، والعمل بروح الفريق الواحد، واضعين كل جهدنا وخبراتنا ومقدراتنا لتنفيذ خطتنا على أرض الواقع، من خلال التشبيك مع الجهات الحكومية والمانحين والترويج لمشاريع الخطة بكل قوة ونسأل الله السداد والتوفيق، لأن مدينتنا واهلنا يستحقون منا الكثير وهم بحاجة للكثير سواء في البنية التحتية، أو الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والإدارية.

وأخيرا لنكون موحدين، يدا بيد، لرسم مستقبلنا وتحقيق آمالنا وتطلعاتنا ولتصبح رؤيتنا حقيقة على أرض الواقع

يطا مدينة مركزية مزدهرة وجاذبة.

خالص محبتي وتقديري لكم





رئيس البلدية

صالح عواد

ب. قرار مجلس الهيئة المحلية باعتماد الخطة التنموية المحلية

قرار مجلس الهيئة المحلية باعتماد الخطة التنموية المحلية

في الجلسة رقم (2017/12) المنعقدة بتاريخ (2017/3/22) ناقش المجلس البلدي مخرجات الخطة التنموية المحلية لمدينة يطا، وقد قرر المجلس الموافقة على اعتماد الخطة التنموية المحلية لمدينة يطا للأعوام 2023-2026 بكافة مخرجاتها (قرار رقم 127)، كما يتعهد المجلس البلدي بتوفير كافة المستلزمات التي من شأنها تنفيذ مخرجات الخطة على أرض الواقع ما أمكن وحسب الإمكانيات المتاحة.

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1.	صالح عواد	رئيس بلدية	
2.	جميل نواجعه	عضو مجلس بلدي	
3.	خوان شيد	عضو مجلس بلدي	
4.	أحلام القور	عضو بلدية	
5.	هشام ابراهيم	عضو بلدية	
6.	محمد الشواحي	عضو مجلس بلدي	
7.	عبد الكريم شريش	عضو بلدية	
8.	طالب محمود البنا	عضو بلدية	
9.	جميل عوصه	نائب رئيس بلدية	
10.	اسماء البنا	عضو بلدية	
11.	سعود ابوعزام	عضو بلدية	
12.			
13.			

الوثيقة المجتمعية

الاسم	المؤسسة	التوقيع	الختم الرسمي
عجيل عوهم	بلدية يافا		
د. زياد البومصر	مستشفى		
د. اياد دمرعالم	د. زينة		
م. هارون	م. ربيع		
ياسر عمر	ترسيخ يافا		
ابراهيم عمر عوهم	ادفاف يافا		





الوثيقة المجتمعية

نحن الموقعون أدناه من هيئة محلية ومؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد في مدينة يطا نتبنى هذه الخطة التنموية المحلية لمدينتنا (2023-2026) بكافة مخرجاتها، والتي شاركنا في مراحل إعدادها، وأننا مستعدون للاستمرار في النشاط والتفاعل من أجل تنفيذها وتوفير كافة المقومات لدعم تنفيذ أي من مخرجاتها

الاسم	المؤسسة	التوقيع	الختم الرسمي
ط. محمد زخار	بديعة	ح. ح.	
م. عمار داح	زراعة ديرة يل	ع. ع.	
أ. عبد الله محمد	مركز نرسا	أ. ع.	
ع. ع. ع. ع.	جامعة القدس المعظم	ع. ع.	
ع. ع. ع. ع.	مدرسة بنات شهداء	ع. ع.	
ع. ع. ع. ع.	مدرسة بنات الشهداء	ع. ع.	

الاسم	المؤسسة	التوقيع	دولة فلسطين وزارة التمثيل الرسمي
ليخاف	التنمية الاقتصادية		بلدية يطا YATTA MUNICIPALITY رئيس قسم الموارد البشرية والديوان
عمار السهرين	بلدية يطا		
سوار كامل ح	المركز لتخصص للعلم والتكنولوجيا فرع دحا		
المدبر احمد طه	بنو		
محمد مناس	الدبي		
سيد سليمان ن مان حريزات	الاتحاد العام الانقلاب عمان ملف		
هازي احمد الحمد	رئيسة يطا		وزارة التربية والتعليم مدينة التربية والتعليم - يطا
عبدالله عيسى	مدير التربية		
نضال الدين	مستور الحادي		وزارة التربية والتعليم مدينة التربية والتعليم - يطا

الاسم	المؤسسة	التوقيع	دولة فلسطين الختم الرسمي وزارة التعمير والإسكان
مهدام ادريس	الجمعية العامة		
محمد رباح	التقانة العامة لعمال النقل / بيطا		
هالة عبد الله	دائرة اسباب في امانة القدس للثقافة عالمية		
عمر ابراهيم طهر	مجمع بيطا و بيطا بلدية بيطا		
محمد رضا	مدير بلدية بيطا		
فداء شحيع	مجمع الاسماء		
جمال اصلاوي	اتحاد بيطا		
محمد هادي	مجلس ارايها		

ضمن برنامج تطوير البلديات- المرحلة الثالثة، وبدعم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ومديرية محافظة الخليل، وذلك ضمن مراحل اعداد الخطة التنموية المحلية والاستراتيجية للمدينة، وبإشراف ودعم فني من شركة بلارز للاستشارات، عملت بلدية يطا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في المدينة، والمجموعات الشبابية، والمجموعات التمثيلية وعدد موسع من أصحاب المصالح على تطوير الخطة الاستراتيجية التنموية للمدينة للأعوام 2023-2026. وقد عملت البلدية على تنفيذ هذه الخطة من خلال تشكيل لجان اختصاصية بدأت مهمتها بتشخيص الواقع القائم في المدينة في محاور الخطة الأربعة المتمثلة في البنية التحتية، وتنمية الاقتصاد المحلي، والتنمية الاجتماعية، والإدارة والحكم الرشيد. هذا ويذكر أن هذه العملية اكتنفت على رصد دقيق لاحتياجات الفئات الضعيفة خاصة في المناطق صعبة الوصول، وقد اكتنفت هذه العملية على رصد احتياجات النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، والمجموعات المجتمعية في مناطق المصنفة "ج"، اخذة في كل محور من محاورها ضرورة الاستجابة لاحتياجات الفئات الضعيفة ليس نيابة عنهم وانما عبر تصميمها بالشراكة معهم .

اعلت هذه الخطة الاستراتيجية قيم "LNOB" كقيمة تركز على شمول التدخلات، وعدم ترك أي شخص خارج الخدمة العامة، كما ركزت على التصميم المبني على فرد، ومن الجدير ذكره بأن هذه الخطة قد اخذت في الحسبان التغيرات المناخية، والأثر المحتمل لتدخلاتها على البيئة والمناخ، وتحليل القضايا التنموية من وجهة النظر المناخية..

وقد تم اطلاق عملية التخطيط التنموي المحلي في المدينة بتاريخ 2022/12/24، من خلال اجتماع البيت المفتوح الذي خلص الى تشكيل لجان التخطيط المختلفة، وتضمنت هذه اللجان في عضويتها القطاعات المختلفة، العامة والخاصة والأهلية والمجتمع المدني، ومن ثم عملت اللجان الفنية المختلفة على تشخيص وتحليل المجالات الفرعية بإشراف الفريق الاستشاري من شركة بيلارز للاستشارات اضافة الى ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات التنموية الأساسية من طاقم البلدية وأبناء المجتمع المحلي.

على الرغم من اتسام عمليات التخطيط السابقة بالتشاركية الا أن هذه الخطة عملت على تطوير واقع التشاركية بإشراكها الفعلي لمجموعات ومكونات مجتمعية واسعة، وهذا لا يخدم فقط جودة مخرج التخطيط، ولكنه يساهم في تطوير المجتمعية للخطة، ويضع الضمانات التي من شأنها انخراط كافة فئات المجتمع في الاسهام في تنفيذها، والدفاع عنها، بل والرقابة على الأداء العام بشأنها.

وقد صير الى اشراك الجمهور ابتداء بدعوة مباشرة من رئيس البلدية، عبر رسالة مصورة تم بثها على صفحات التواصل الاجتماعي، إضافة الى عدد موسع من الدعوات المباشرة لكافة الهيئات، والمؤسسات، والمجموعات التمثيلية في المدينة، فيما لم تنحصر عملية المشاركة فقط فيمن تطوعوا لعضوية اللجان، بل ركزت البلدية على اشراك الجمهور المحلي في الجلسات الفنية أولاً لاعتماد التقارير التشخيصية التي انتجتها اللجان، واختيار القضايا التنموية ذات الأولوية، و ثانياً لتحديد الأهداف التنموية، إضافة الى عدد من مجموعات العمل البورية مع أصحاب المصالح المختلفين خاصة ذوي الإعاقة، والنساء، ومن ثم عرض واطلاق الخطط بشكل جماعي.

اخذت هذه المرحلة التخطيط في حساباتها جمع كافة الملاحظات من اللجان، والجمهور، وأصحاب المصالح المختلفين، وعكسها في كل مرحلة من مراحل التخطيط على التقارير والمخرجات المختلفة. وعلى صعيد متصل فقد عمل فريق التخطيط في كل مرحلة من مراحل اعداد هذه الخطة على التيقن من المواءمة بين التوجهات التنموية في مدينة يطا مع الخطط والتوجهات التنموية في محافظة الخليل، والتوجهات التنموية الوطنية إضافة الى التيقن من المواءمة مع خطة التنمية الاستراتيجية.

شكل التغير المناخي، والتكيف البيئي، وانعكاساته الإيجابية والسلبية على صحة الانسان في المدينة، وظروف حياته، وأمنه وقدرته على العيش الكريم، أحد أبرز محاور التركيز. وعليه فقد تم الاخذ بالحسبان الامن الغذائي، والإنتاج الزراعي، والحفاظ على البيئة الخضراء،

ومناهضة التلوث، والتنوع الحيوي، حيزاً وافياً في مدخلات الخطة المختلفة. وانه من المتوقع أن تأتي هذه الحساسية بثمارها الإيجابية على تعزيز قدرة المواطن في المدينة على الوصول للأمن الغذائي، والعيش في بيئة آمنة، وتحسن الصحة العامة.

عملت الخطة أيضاً على مناهضة الافتراض القائم بأن الجغرافية الفلسطينية هي خارج إطار الكوارث، والأوبئة وعليه فقد طورت الخطة عدد من التدخلات التنموية التي من شأنها تحسين جاهزية المؤسسات في المدينة الحد من آثار الكوارث والأوبئة، وتفعيل الاستجابة المبكرة، وبرامج التدخل الوقائي في هذا الإطار.

عرفت الخطة التنموية أيضاً مصفوفة المتابعة والتقييم، ليس بوصفها ضابطاً لعمل المؤسسات والمجموعات المختلفة فقط، وإنما بوصفها محركاً لضمان استمرار شراكة الجمهور في عمليات المتابعة والتقييم المختلفة، وقد أخذت هذه المصفوفة بعين الاعتبار، رصد رضا الجمهور عن الأداء التنفيذي للخطة، ولضبط التوقعات التي من شأن اختلافها وتفاوتها خلق حالة من عدم الثقة بين الهيئات التنفيذية والجمهور في المدينة.

فيما يلي عرضاً ملخصاً للقضايا التنموية التي توصلت إليها اللجان الفنية في كافة المجالات الفرعية:

1. مجال البيئة والبنية التحتية

- ضعف البنية التحتية للطرق والمواصلات، وتهالك في عدد واسع من الشوارع، والاكتظاظ المروري، في ظل اطراد الزيادة في عدد السكان، وضعف المواءمة لاحتياجات ذوي الإعاقة، وكبار، وكبيرات السن.
- شح مصادر المياه، وضعف البنية التحتية الخاصة بالمياه.
- ضعف واردات الطاقة للمدينة، والاعتماد الكلي على في مصدر الطاقة من الشركات الاسرائيلية
- وجود سيل مكشوف للمياه العادمة والصرف الصحي، وضعف معالجة النفايات، والنفايات الصلبة، إضافة ضعف المعدات المتاحة للنفايات الصلبة.

2. مجال تنمية الاقتصاد المحلي

- تراجع اسهام القطاع الزراعي في الإنتاج المحلي، والعزوف عن الاهتمام بقطاع الزراعة نتيجة لضعف الموارد المائية.
- ضعف تنظيم القطاع الصناعي وتشكيله عبئاً على السكان، وضعف تشجيع الأعمال المتوسطة والصغيرة، ومحدودية المناطق الصناعية.
- ضعف البنية التحتية والخدمات المساندة لقطاع التجارة، ما يشكل عبئاً على المواطنين.
- ضعف القطاع السياحي والترفيهي في المدينة، ومحدودية الاهتمام فيه، وبالتالي محدودية اسهامه في الناتج المحلي.

3. مجال التنمية الاجتماعية

- ضعف البنية التحتية لقطاع التعليم، والمواءمة ومحدودة التعليم المهني.
- ضعف البنية التحتية للقطاع الصحي بما في ذلك المستشفيات الحكومي والعيادات التي تخدم المناطق المهمشة، والمكونات الضعيفة، ومحدودية المواءمة.
- محدودية برامج التمكين الاجتماعي، والدعم النفسي والاجتماعي، وضعف استجابة المرافق العامة لاحتياجات ذوي الإعاقة والنساء.
- ضعف الرواية التاريخية حول الأماكن التراثية في المدينة، وضعف الاهتمام بترميم الأماكن التراثية، ومحدودية الوعي بأهميتها.
- ضعف القطاع الرياضي، وبنيتة التحتية، والمرافق الخاصة بالرياضة، خاصة للفئات العمرية الصغيرة، والنساء.

4. الإدارة والحكم الرشيد

- ضعف مراقبة التعديلات التنظيمية، واستجابة المواطنين لتعليمات البلدية في التنظيم، ومحدودية اثبات الملكيات، والتجاوزات المستمرة على الحق العام.
- محدودية أعداد الشرطة، وضعف مركز الدفاع المدني، وضعف خطط الطوارئ، والمعدات الخاصة بها.
- ضعف الشفافية، وأعمال المساءلة، ونظم الإجراءات، وضعف القدرات التخطيطية.
- ضعف البنية التحتية اللازمة للتعامل مع حالات الكوارث والطوارئ وعدم توفر المعدات والأدوات والتدريب اللازم لإدارة الأمن والكوارث
- ضعف البنية التطويرية المؤسسية للبلدية.

ملخص القضايا التنموية التي تم التصويت عليها من قبل الجمهور في المدينة:

- ضعف البنية التحتية لقطاع الطرق والمواصلات.
- ضعف جودة خدمات المياه ومقومات الصرف الصحي.
- ضعف جودة التيار الكهربائي.
- ضعف البنية التحتية والخدمات المساندة لقطاع الصناعة.
- مقومات ومكونات القطاع الزراعي الحالية أقل من حاجة المدينة.
- ضعف البنية التحتية ومقومات مجال الترفيه والسياحة.
- ضعف مقومات القطاع التجاري.
- ضعف البنية التحتية والخدمات المساندة لقطاع الصحة.
- ضعف البنية التحتية لقطاع التربية والتعليم العالي.
- عدم كفاية مقومات تقديم الخدمات الاجتماعية وبنيتها التحتية.
- ضعف الاهتمام بقطاع التراث والثقافة ومكوناتها المختلفة.
- ضعف مقومات قطاع الأمن والسلامة العامة وإدارة الكوارث.
- قصور نظام التخطيط والتنظيم وتطبيقه في المدينة.

Executive Summary

As part of the Municipal Development Program - Phase III, supported by the Local Development and Lending Fund in cooperation with the Ministry of Local Government, and in the context of preparing the local development strategic plan for the city, with technical support from Pillars Consulting Company, the Municipality of Yatta in cooperation with the civil society institutions, youth groups, representative groups, and a wide range of stakeholders in the city, has developed the strategic development plan for the city for the years 2023-2026.

The Municipality formed specialised committees to diagnose the existing conditions in the city in the four plan areas of infrastructure, local economic development, social development, and good governance. This process included a careful assessment of the needs of vulnerable groups, especially in hard-to-reach areas, the needs of women, people with disabilities, youth, and "Area C." Each planning area recognised the importance of responding to the needs of vulnerable groups not on their behalf but in partnership with them.

This strategic plan is guided by the value of "leaving no one behind," and human-centered design. It also considers climate change and the potential impact of the plan's interventions on the environment and climate, analysing development issues from a climate perspective.

The local development planning process in YATTA was launched on December 24, 2022, through a public meeting. The meeting resulted in the formation of four planning committees. These committees included sectors such as the public, private, CSOs, and community-based organisations. The technical committees engaged in developing a diagnostic report that focused on providing thorough analyses of the main gaps and issues in the four development pillars” Infra-structure, economic development, social development and good governance”. The process was technically coached by Pillars consulting company but fully developed by the committees.

While previous planning processes were characterised by participation, participation in this planning phase was fostered deeply amongst all social components in the city. The process involved a wide range of community groups and components. This serves the quality of the planning output and contributes to the development of community ownership of the plan. It puts, in place, guarantees to engage social components in the plan implementation and monitor its performance.

The public was engaged in the planning process, starting with a direct invitation from the mayor, through a video message broadcasted on social media platforms, in addition to a broad range of direct invitations to all entities, institutions, and groups in the city. The participation process was not limited to those who volunteered to join committees. Still, the municipality focused on involving the social groups in the technical workshop to approve the diagnostic reports produced by the committees, select priority development issues, and determine the developmental goals. Women, youth and PWD’s needs were given particular focus.

In each planning stage, the planning teams ensured the alignment between their work and the developmental measures in Hebron governorate, national developmental plan, and SDG.

Climate change and its impact on the living conditions of YATTA citizens, mainly regarding food security, agricultural production, preservation of the green ethe environment, pollution prevention, and biological diversity were analysed and considered during the entire planning process.

The planning teams opposed the assumption that Palestinian geography is excluded from disasters and epidemics. Therefore, the planning teams developed several measures to improve the city institutions' preparedness to minimize the impact of disasters and epidemics and ensure early response.

The planning teams developed a monitoring and evaluation matrix as a regulator for the work of institutions and various groups and as a driver to ensure the continuity of community partnerships in different monitoring and evaluation processes. This matrix took into account monitoring public satisfaction from the implementation effort.

Development priority issues:

Weak infrastructure in the roads and transport sector.

- Poor quality of water services and sanitation facilities.
- poor electrical power quality.
- Weak infrastructure and support services for the industry sector.
- Poor agricultural sector infrastructure.
- Weak infrastructure of the entertainment and tourism sector.

- poor infrastructure for the commercial sector.
- Insufficient infrastructure and support services for the health sector.
- Weak infrastructure for education.
- fragile social protection and empowerment services.
- fragile infrastructure for the cultural sector and weak awareness of its contribution to the development process.
- limited capacities and readiness for the disaster management sector.
- limited institutional capacities in the municipality

1.0 مقدمة

1.1 أهداف الخطة

يمكن تلخيص أهم الأهداف من إنجاز خطة تنموية استراتيجية لمدينة يطا بما يلي:


- تحديد الفرص المتاحة والمعوقات التي تواجه عملية التنمية في مدينة يطا.
- تشخيص الوضع الراهن، وتقديم صورة واضحة عن المجالات التنموية في مدينة يطا.
- وضع رؤية تنموية شاملة لتطوير مدينة يطا من وجهة نظر سكانها، وذلك ضمن إطار زمني مدته 4 سنوات.
- وضع أهداف تنموية متكاملة.
- تحديد المشروعات والبرامج التنموية ذات الأولوية، ومناطق تنفيذها في مدينة يطا.
- وضع خطة تنفيذ متكاملة ضمن إطار زمني، وتقديرات مالية.

1.2 منهجية إعداد الخطة

ارتكزت منهجية إعداد الخطة التنموية المحلية لمدينة يطا على مجموعة من المراحل والأنشطة بالاستناد إلى دليل التخطيط التنموي المحلي الذي أعدته مسبقاً وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع مجموعة العمل الوطنية، وبتمويل من الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) وقد اشتمل الدليل على خمس مراحل أساسية (انظر شكل-1) تم تطبيق المراحل الثلاثة الأولى منها، تحتوي كل مرحلة منها على عدة خطوات، وكل خطوة تحتوي على أنشطة مختلفة، كما هو مبين في الشكل ادناه.

منذ بداية المشروع تم تشكيل فريق التخطيط الأساسي المكون من 22 عضو من موظفي البلدية ومن أبناء المدينة من ذوي الخبرات والمؤهلات وذلك حسب دليل التخطيط التنموي المحلي، حيث قام فريق التخطيط بتصميم عملية التخطيط والإطار الزمني المقترح لكل مرحلة، وكذلك تحليل وحصر أصحاب العلاقة، وتشكيل لجان المجالات التنموية، وتحديد

أدوارها، والاتفاق على خطة عملية التخطيط لمدينة يطا، وذلك من خلال عدة اجتماعات عقدت لهذا الغرض، وتخلل ذلك اشراك المواطنين، واللجان المختلفة من خلال لقاءات تدريبية وتعريفية.

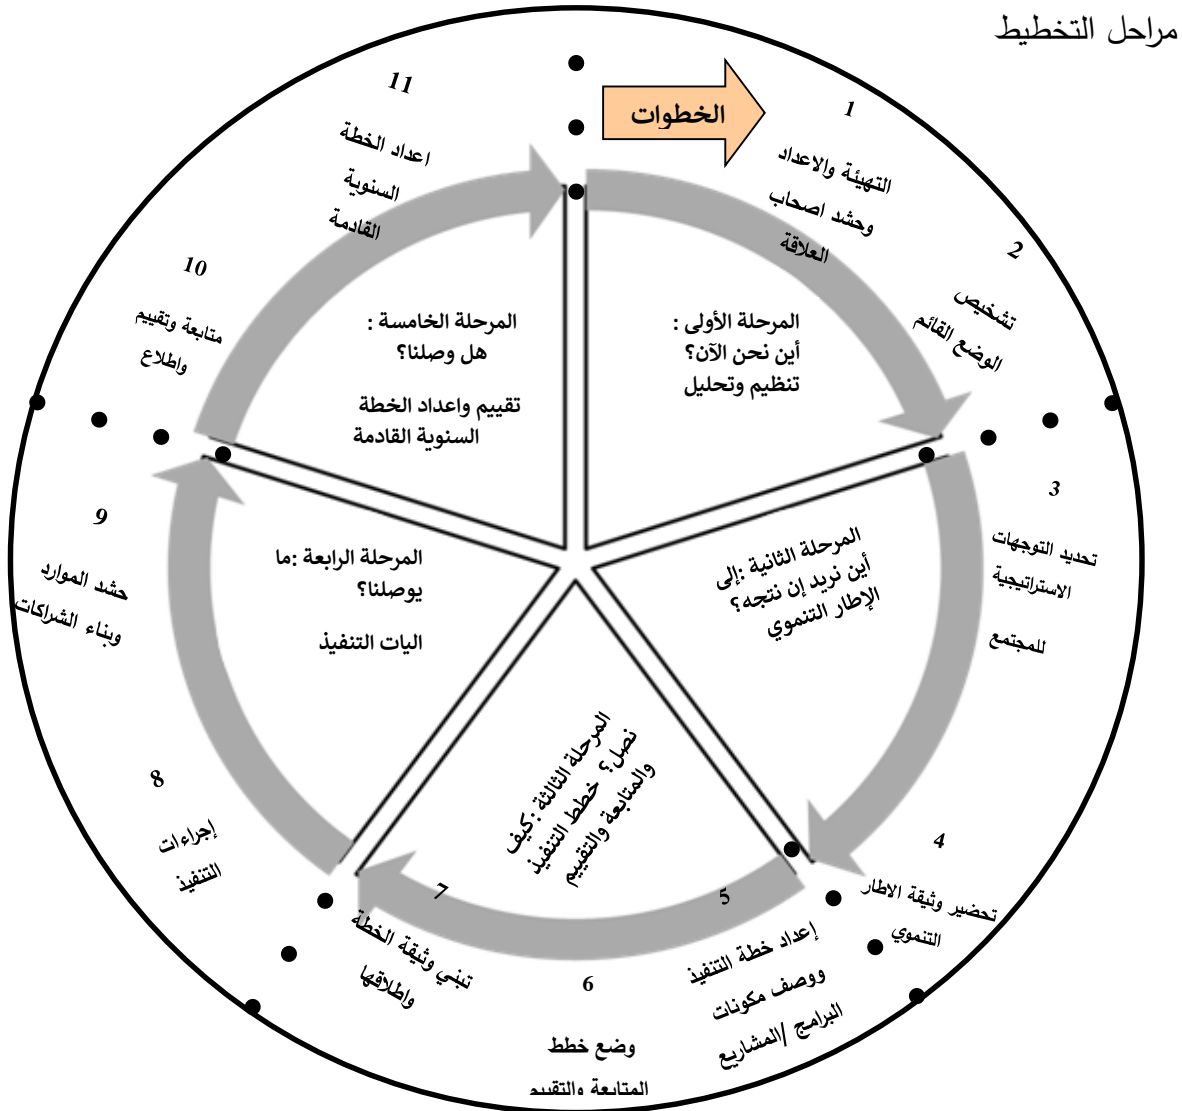

شكل (1): مراحل عملية التخطيط التنموي حسب دليل التخطيط

أما لجان المجالات التنموية، فقد كانت كل لجنة منها مختصة في مجال رئيسي محدد (4 لجان). دورها المشاركة في إعداد الخطة، وخاصة في مراحلها الأولى (تشخيص الوضع القائم) وتقديم المعلومات، والمساهمة في التحليل، حيث قامت اللجان بتقديم تقارير تشخيصية أولية لكل مجال من مجالات العمل التنموية المشار لها بدليل التخطيط، واستنادا على التقارير الأولية التي أعدتها ، وكذلك البيانات الإحصائية والتقارير الرسمية، ومن خلال اجتماعات

مع اللجان لتحديد نقاط القوة والضعف، والفرص، والتهديدات أو المخاطر في كل مجال تنموي. تم إعداد تقرير التشخيص والاحتياجات لمدينة يطا.

1.3 المجالات التي تم التطرق إليها في الخطة:

حسب الخطة الوطنية المعتمدة يوجد أربعة مجالات رئيسية بتفرعاتها المختلفة، حيث يسهل هذا التقسيم ربط الخطط المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يضمن الأخذ بالاعتبار كافة مهام الهيئة المحلية (حسب المادة 15 من قانون الهيئات المحلية). والمجالات الرئيسية الأربعة وتفرعاتها هي:

المجالات الرئيسية "حسب الخطط الوطنية"	المجال الفرعي
مجال البيئة والبنى التحتية	الطرق والمواصلات، المياه والصرف الصحي، الطاقة، النفايات، الصحة العامة والبيئة
مجال تنمية الاقتصاد المحلي	الزراعة، الترفيه والسياحة، التجارة والصناعة والخدمات المساندة
مجال التنمية الاجتماعية	الخدمات الاجتماعية، التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية والتمكين، الثقافة والتراث، الرياضة،
مجال الادارة والحكم الرشيد	التخطيط والتنظيم، الأمن وإدارة الكوارث، إدارة وحوكمة المؤسسات وخاصة الهيئة المحلية

تم اطلاق عملية التخطيط التنموي المحلي بتاريخ 2022/12/24، حيث عقد لقاء البيت المفتوح، وشرح آلية العمل وتم خلالها استكمال تشكيل اللجان الفنية المختلفة، حيث بدأت اللجان فورا العمل على تشخيص الوضع القائم لكل مجال رئيسي وقطاع فرعي، وتحديد القضايا السلبية والإيجابية بناء على تحليل عوامل القوة والضعف.

تم خلال هذه المرحلة التواصل مع الفئات المهمشة من خلال لقاءات واجتماعات جماعية وفردية، لتحديد احتياجاتهم من الأنشطة والمشاريع خلال عمر الخطة القادمة.

وفي نهاية شهر كانون الثاني، تم الانتهاء من الملف التشخيصي الكامل من خلال تحديد القضايا السلبية، والاحتياجات لكل قطاع فرعي ومجال رئيسي.

ومن خلال ورشة العمل الفنية الاولى التي عقدت بتاريخ 15/2/2023، وشارك فيها ممثلون عن القطاعات المختلفة في المدينة، بالإضافة إلى فريق التخطيط الأساسي وممثلي أصحاب العلاقة، تم تحديد الرؤية المستقبلية لمدينة يطا، حيث أخذت هذه الرؤية بعين الاعتبار المؤثرات الإيجابية (نقاط القوة والفرص)، وكذلك المؤثرات السلبية (نقاط الضعف والتهديدات) التي يجب التغلب عليها.

وقام المشاركون أيضا بتحديد القضايا الأساسية ذات الأولوية وذلك من خلال استخدام مصفوفة المقارنة الثنائية، وبعدها تحديد الأهداف التنموية وما تحتاجه من برامج لتحقيقها.

تم عمل اجتماع فني آخر لأصحاب العلاقة، تم خلاله مناقشة الخطة الرباعية و الخطة السنوية لعام 2023، وتدقيق البرامج و المشاريع والأنشطة والتكلفة الخاصة بكل نشاط و التكلفة الإجمالية، حيث تم أخذ وتجميع الملاحظات من الأعضاء ليتم تعديلها والخروج بالخطة النهائية وعرضها خلال اللقاء الجماهيري الثاني.

تم عرض مخرجات الخطة 2023-2026 و الخطة السنوية لعام 2023، للمجتمع المحلي، من خلال عقد اللقاء المجتمعي الثاني لاعتماد وتبني الخطة، وذلك يوم الخميس الموافق 2023/3/16.

ومع ظهور تأثيرات تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، أصبح التكيف بمختلف مكوناته أمرا ملحا. وكغيرها من الدول، يتوقع أن تكون له اثار في فلسطين وخاصة على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وكذلك على قطاع المياه والصرف الصحي، وكذلك محور ادارة الامن والكوارث والخطر المتوقع لحدوث فيضانات او حرائق ناتجة عن التغير المناخي، ولهذا كان لا بد من الاهتمام من قبل القائمين على عملية التخطيط التنموي في البلدة بقضايا التغير المناخي والتكيف، وخاصة في ظل ضعف الامكانيات والقدرة المحدودة على التكيف، ويعتبر التكيف ركيزة مهمة للاستجابة لتغير المناخ، وضروري لمعالجة التأثيرات الناتجة عنه او التقليل من الاثار السلبية للتغير المناخي أو لاستثمار الفرص الممكنة الناتجة عن التغير المناخي.

بعد عرض آلية العمل والقضايا والأهداف والبرامج والأنشطة وكل ما نتج عن عملية التخطيط خلال الشهور الثلاثة الماضية، قام الحضور بالتوقيع على الوثيقة المجتمعية التي تنص على تبني المجتمع المحلي والمؤسسات الحومية والمدينة، للخطة التنموية المحلية لمدينة يطا للأعوام 2023-2026، والتعهد بعمل المستطاع لتحقيق وتنفيذ ما ورد فيها.

تحديات عملية التخطيط

- على الرغم من تطور حجم ماركة الجمهور المحلي في هذه الخطة الا ان الشراكة المجتمعية لا زالت محدودة، خاصة في أوساط الشابات، والبنات.

- تخللت عملية التخطيط هذه عدد كبير من الاجتياحات الإسرائيلية مسفرة عن عدد من الشهداء والجرحى، ما أثر على المزاج العام.
- تزامن عملية التخطيط مع تصنيف البلديات في صندوق البلديات،
- تراجع الايمان بأهمية التخطيط، وواقع الثقة في المكون العام.

2.0 نبذة عن مدينة يطا

2.1 الموقع والتسمية.

تقع مدينة يطا على بعد حوالي 12 كم إلى الجنوب من الخليل، وترتفع 800م عن سطح البحر، ويقع مركز المدينة على خط إحداثي محلي شمالي 95,000 وخط إحداثي محلي شرقي 159,000، وتبلغ مساحة أراضيها 174,172 دونما. يعود بناءها إلى زمن العرب الكنعانيين وعرفت باسم يوطة بمعنى الأرض المنبسطة والمنحنية.

قيل أن النبي زكريا عليه السلام عاش فيها وفيها ولد له النبي يحيى عليه السلام. وحدودها هي:

- من الشمال: مدينة الخليل.
- من الجنوب: بلدة السموع وبئر السبع.
- من الشرق: البحر الميت
- من الغرب: الرحيبة , الفوار ودورا.


2.3 طبوغرافية المدينة.

تقع يطا على سطح اتصال بين إقليمين طبيعيين متباينين، هما جبال الخليل من الشمال وهضبة النقب والبحر الميت من الجنوب، وتمتاز المنطقة بشكل عام بالارتفاع إذ يتراوح ارتفاعها بين 675 مترا إلى 875 مترا ويبلغ متوسط ارتفاع المنطقة حوالي 800 متر عن سطح البحر، ويلاحظ أن الارتفاع يزداد تدريجيا من الغرب إلى الشرق حيث يبلغ أقصاه في منطقة زيف والبالغ 875 مترا. ويقل من الشمال إلى الجنوب في المنطقة السهلية الواقعة بين الكتلة المبنية لمدينة يطا والتجمعات المحيطة بها باتجاه خلة المية والكرمل.


وبالرغم من ارتفاع المنطقة إلا أن هناك مساحة كبيرة في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية من التجمع هي أراضٍ سهلية قليلة الانحدار إذ لا يتجاوز معدل انحدارها 7.5% باستثناء مناطق محدودة، ولكن وكما يتضح من خريطة الانحدارات نلاحظ تركيز الانحدارات الشديدة والتي تبلغ أفي أقصاها 23% وتتركز في وسط التجمع شمالا وجنوبا وفي مناطق محدودة معظمها مناطق مبنية.

كما إن الجهة الجنوبية الغربية من التجمع هي منطقة قليلة الانحدار وتقع في مهب الرياح الشمالية الغربية التي تكون محملة بالأتربة والغبار الناجم عن المحاجر ومناشير الحجر المنتشرة شرق قرية بيت عمرة.

عند مقارنة خريطة الارتفاعات مع خريطة الانحدارات يلاحظ إن المناطق المرتفعة تتركز في وسط يطا بشكل عام حول محور طريق يطا الخليل، في حين تتركز المناطق المنحدرة في الجهة الشمالية والشمالية الغربية.

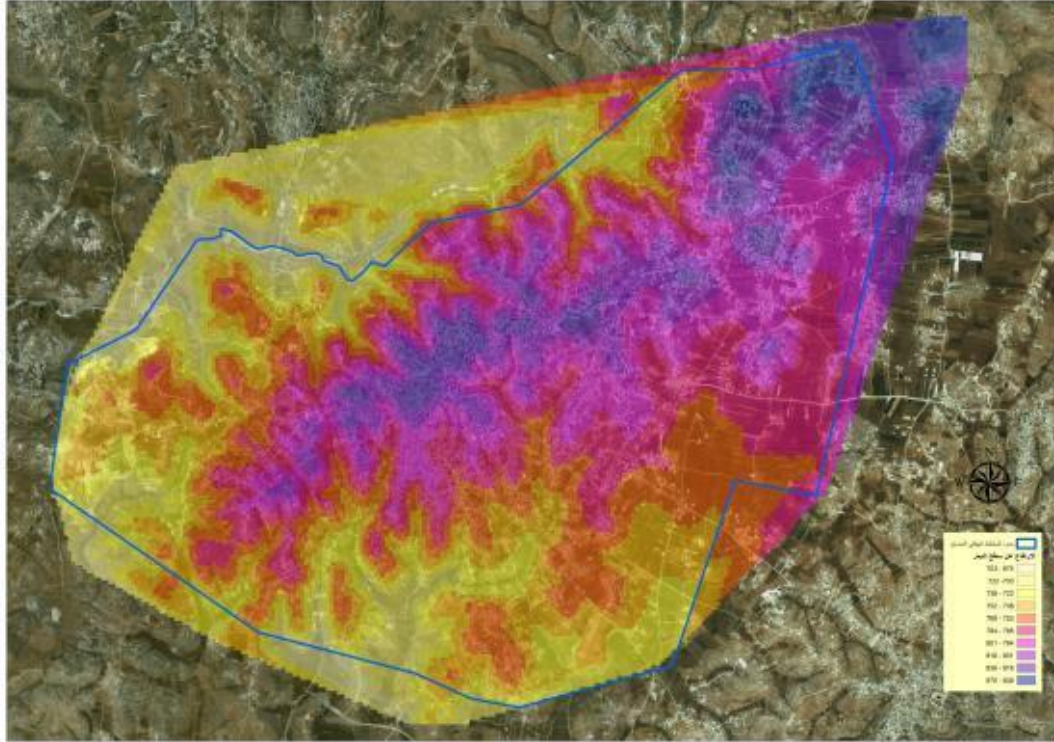

صورة للارتفاعات عن سطح البحر

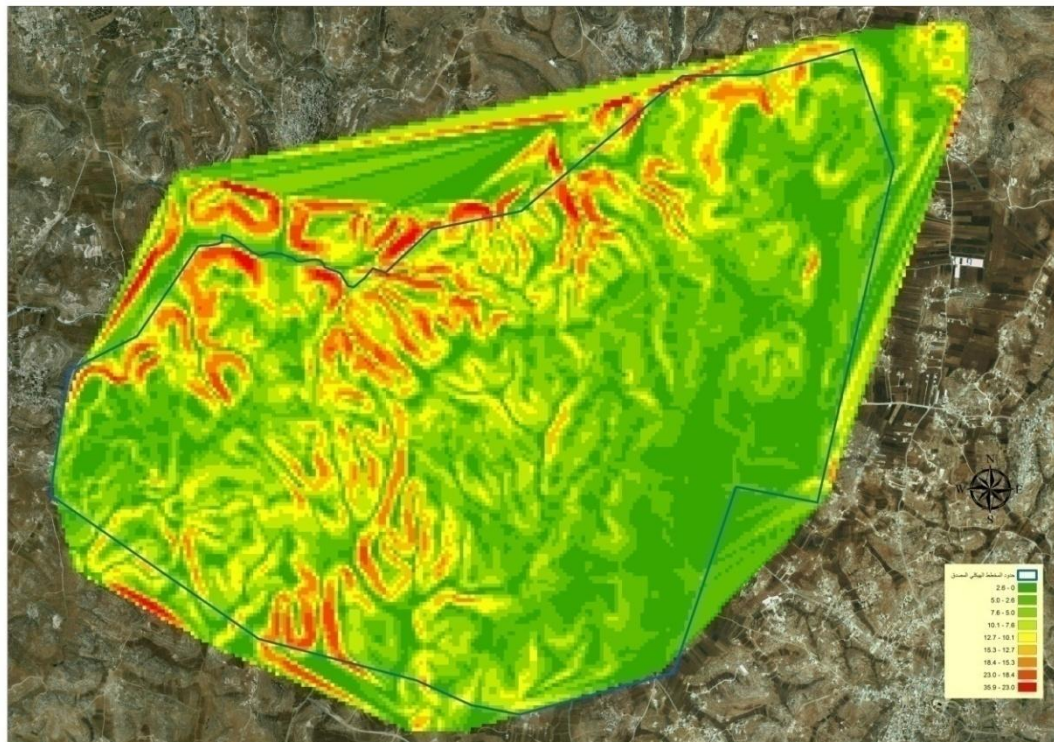

صورة للميول والانحدارات

2.4 المناخ

يسود منطقة يطا مناخ متوسطي معتدل، ذو صيف حار وجاف، وشتاء بارد ممطر. يحل فصل الربيع في أواخر شهر آذار وأوائل نيسان، ويعتبر شهرا تموز وآب أكثر شهور السنة حرارة حيث يصل معدل درجات الحرارة العظمى فيهما إلى 27.2 ° مئوية، أما أكثر الأشهر برودة فهو كانون الثاني، ويصل فيه معدل درجة الحرارة الصغرى إلى 4.6 ° مئوية. يتساقط المطر بين شهري تشرين الأول ونيسان، ويبلغ معدل تساقط الأمطار السنوي 500 ملميمتراً حسب سجلات الأرصاد الجوية الفلسطينية و 400 ملميمتراً حسب سجلات دائرة المياه في بلدية يطا وموقع طقس فلسطين، وتكون في أعلى معدلاتها في شهري كانون ثاني وشباط حيث يمكن أن يصل مستواها إلى أكثر من 141 ملميمتر.

وتتصنف المنطقة ضمن المناخ الدافئ. حيث يبلغ المعدل السنوي لدرجات الحرارة الدنيا يبلغ 12.4 درجة مئوية بينما المعدل السنوي لدرجات الحرارة القصوى 19.9 درجة مئوية، ويبلغ معدل الرطوبة السنوي 63%.

2.5 حدود الصلاحيات الفلسطينية.

بحسب اتفاقات أوسلو التي وقعت في عام 1995 والتي حدد بها ترسيم الحدود بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي على السيطرة الإدارية والعسكرية والأمنية على أراضي الضفة الغربية، فإن بلدية يطا تقع ضمن حدود صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل كامل و بتصنيف منطقة أ، ويقع جزء كبير من الأراضي التابعة ليطا خلف الطريق الالتفافي (طريق رقم 356 و طريق رقم 317) ضمن حدود الأراضي المصنفة ج وتقدر نسبتها 65% من مساحة الحدود الإدارية.

والجدول التالي يبين مساحات التوسعة في حدود المخططات الهيكلية للمدينة

يطا	مساحة / دونم
مساحة البلدة القديمة	100

5,500	التوسعة عام 1977
24,500	مساحة المخطط الهيكلي 2004
30,720	المخطط الهيكلي الحالي

3. بلدية يطا

3.1. النشأة.

تأسست بلدية يطا عام 1971 ويتولى مقاليدها اليوم مجلس بلدي منتخب من (13) عضواً ، تسلم مهامه في مايو عام 2022، علماً بأن أول انتخابات للبلدية كانت قد أجريت عام 1976، وتصنف البلدية إدارياً حسب وزارة الحكم المحلي (بلدية ب) .

تتاط بمجلس بلدية يطا الوظائف والصلاحيات والسلطات حسب قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية، بحيث تقدم البلدية لمواطنيها كافة الخدمات المنصوص عليها باستثناء خدمة الصرف الصحي، واستحدثت البلدية ثلاث خدمات جديدة هي : رعاية ذوي الاعاقة ، فحص صلاحية المركبات للسير على الطرق، خدمات التنمية الاقتصادية المحلية، وأن خدمات الكهرباء أنيطت بشركة كهرباء الجنوب (سلكو) التي تأسست عام 2004 بعضوية كل من بلديات يطا ودورا والظاهرية.

3.2. الرسالة والرؤية والقيم

الرسالة.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مدينة يطا، من خلال رفع قدرات العاملين فيها وتشجيع إبداعاتهم وتوفير كافة السبل اللازمة، معتمدة على استدامة مواردها المالية، وتعزيز العلاقة والشراكة والتواصل مع المجتمع المحلي والمؤسسات المحلية والدولية.

الرؤية

بلدية الكترونية متميزة بإدارة فاعلة وكوادر بشرية كفوءة وخدمات عصرية وموارد مالية كافية للتنمية المستدامة.

القيم

الإيمان ، والالتزام الصادق ، والنزاهة ، والشفافية ، والمساءلة ، والإبداع ، والعمل بروح الفريق .

3.3 الهيكلية

تضم بلدية يطا 250 موظف موزعين على الدوائر والوحدات التالية:

دائرة الشؤون الإدارية، دائرة الشؤون المالية، دائرة التخطيط والمشاريع، دائرة الهندسة، دائرة الخدمات العامة، دائرة المرافق المساندة ،وحدة العلاقات العامة والتنمية الاقتصادية، وحدة الرقابة الداخلية، وحدة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء والوحدة القانونية.

3.4 الخدمات المقدمة

فيما يلي أبرز ما تقدمه البلدية من خدمات سواء مجانية أو شبه مجانية أو مقابل رسوم:

1. تخطيط وتنظيم المدينة وشوارعها، ومنع التعديات عليها، والمحافظة على نظافتها.
2. شق وتعبيد وتأهيل وصيانة الطرق.
3. تزويد المدينة بخدمة المياه.
4. جمع وترحيل النفايات الصلبة والمحافظة على نظافة المدينة.
5. تنظيم ومراقبة قطاع البناء ومنح التراخيص اللازمة (السكن والمنشآت الأخرى).
6. منح رخص الحرف والصناعات.
7. إنشاء وتنظيم الساحات العامة والحدائق والمنتزهات وزراعة الشوارع وتخضير المدينة.
8. رعاية ودعم المؤسسات الثقافية والرياضية.
9. تقديم الدعم اللوجستي والفني لمختلف مؤسسات ومديريات المدينة، ومن أهمها الصحة والتعليم.
10. مراقبة اللوحات الإعلانية وتنظيمها.
11. ترميم البلدة القديمة والمحافظة على التراث.
12. الرقابة الصحية، مراقبة الاغذية ومعاينة الذبائح وإنشاء المسالخ.
13. الإشراف الإداري على خدمة الكهرباء كون البلدية عضو في مجلس إدارة شركة كهرباء الجنوب وأحد أكبر المساهمين فيها.
14. الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة، حيث يتوفر لدى البلدية مركز مجتمعي لرعايتهم.
15. عمل التدابير والاحتياطات للسيول والانجرافات، والتخلص من مياه الأمطار من حرم الطرق.
16. أخذ زمام أمور التخطيط التنموي للمدينة.
17. فحص آبار جمع المياه المنزلية (لدى البلدية مختبر صغير لمعرفة مدى التلوث في المياه).
18. العمل على تسجيل الأراضي بأسماء المالكين الحاليين من خلال تنفيذ مشروع تسجيل الأراضي، وستقوم البلدية بمشروع تسوية أراضي خلال العام 2018 ليكون ملزم قانونيا وللتخلص من كافة مشاكل معاملات الأراضي.
19. فحص المركبات من خلال دينوميتير بلدية يطا.
20. دعم الجانب الثقافي في المدينة من خلال وجود مكتبة بلدية يطا العامة.
21. دعم الشباب والرياضة من خلال وجود ستاد بلدية يطا الدولي بالرغم من عدم اكتماله حتى تاريخه.
22. دعم قطاع الترفيه والسياحة من خلال وجود منتزه بلدية الأثري في الكرمل، بالرغم من عدم اكتماله وتشغيله بشكل رسمي حتى اللحظة.
23. متابعة ومراقبة الحفر الامتصاصية وسيل المجاري لافتقار المدينة لشبكة صرف صحي.

4 السكان والديموغرافيا

4.1 النمو السكاني

من ابرز الخصائص الديموغرافية للمجتمع الفلسطيني المقيم في الأراضي الفلسطينية ارتفاع معدلات الخصوبة، وان كانت هنالك دلائل تشير إلى الاتجاه نحو انخفاض تلك المعدلات، فقد انخفضت خلال العقد الماضي بمقدار الربع تقريبا، كما تشير الإحصاءات إلى اتجاهها نحو الانخفاض خلال العقد القادم، حيث بلغ معدل الخصوبة الكلي في عام 1994 نحو 6.1 مولودا وبلغ 4.9 مولودا لعام 1999، وصل معدل الخصوبة إلى نحو 4.2 مولودا في 2007، وانعكس ارتفاع معدل الخصوبة بصورة واضحة على التركيب العمري للسكان، إذ يمتاز المجتمع الفلسطيني بأنه مجتمع قتي. ورغم الانخفاض المتوقع خلال السنوات القادمة لمعدلات الإنجاب، إلا أن المجتمع الفلسطيني سيبقى يافعا خلال العقد الحالي والعقد القادم على اقل تقدير.

بالاعتماد على بيانات مركز الإحصاء الفلسطيني بلغ معدل الخصوبة في العام 2007 لمحافظة الخليل 4.9، وبما أن هذا المعدل لم يتم احتسابه على مستوى التجمعات السكانية، لذا سيتم اعتماده فيما يخص مجتمع مدينة يطا.

بلغ عدد السكان لمدينة يطا عام 2017 حوالي 78,000 نسمة (داخل حدود البلدية)، حسب المركز الإحصاء الفلسطيني.

ومن الملاحظ أن معدل النمو السكاني قد بلغ 4.3% ما بين العام 2007 والعام 2017 وبالاعتماد على الإسقاطات السكانية فمن الملاحظ أن معدل النمو السكاني في تناقص كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول معدل النمو السكاني الطبيعي - مدينة يطا

العام	1997	2007	2017	2022	2030
عدد السكان	33110	50949	000,78	90,480	112,195
معدل النمو السكاني	---	4.3%	4%	3.2%	3.0%

4.2 التطور السكاني


تم احتساب معدل الخصوبة حسب معدل الخصوبة لمحافظة الخليل والذي بلغ 4.9 في العام 2007 ، وبالرغم من توقع انخفاض نسبة الخصوبة بقيمة 30% حتى العام 2025 حسب بيانات مركز الإحصاء الفلسطيني، إلا أن مدينة يطا تتمتع بخصوصية خاصة من حيث ارتفاع معدل الخصوبة، لذا ولضمان التنبؤ الأقرب للصحة فقد تم اعتماد انخفاض معدل الخصوبة بنسبة 15% بدل 30%، حيث يصل معدل الخصوبة إلى 4.2 في العام 2025.

ويجب الملاحظة أن هذا الانخفاض في معدلات الإنجاب لا يعني تناقصا في عدد الولادات السنوية، إذ ما زالت أعداد الولادات السنوية في تصاعد مستمر عاما بعد الآخر وذلك بسبب اتساع القاعدة السكانية وخاصة قاعدة الإناث اللواتي في سن الإنجاب، ويعزى اتساع هذه القاعدة إلى ارتفاع الخصوبة في السنوات السابقة والتي أدت إلى خلق قوة دافعة تولد نموا سكانيا مستمرا في الوقت الحاضر والمستقبل.

جدول : التطور السكاني لمجتمع يطا


العام	1997	2007	2014	2022	2030
عدد السكان	33,11	50,94	64,30	90,48	106,23
	0	9	0	0	0

الهرم السكاني التالي يوضح الفئات العمرية والجنس ممثلة بالألف في للعام 2007 والمتوقعة للعام 2014

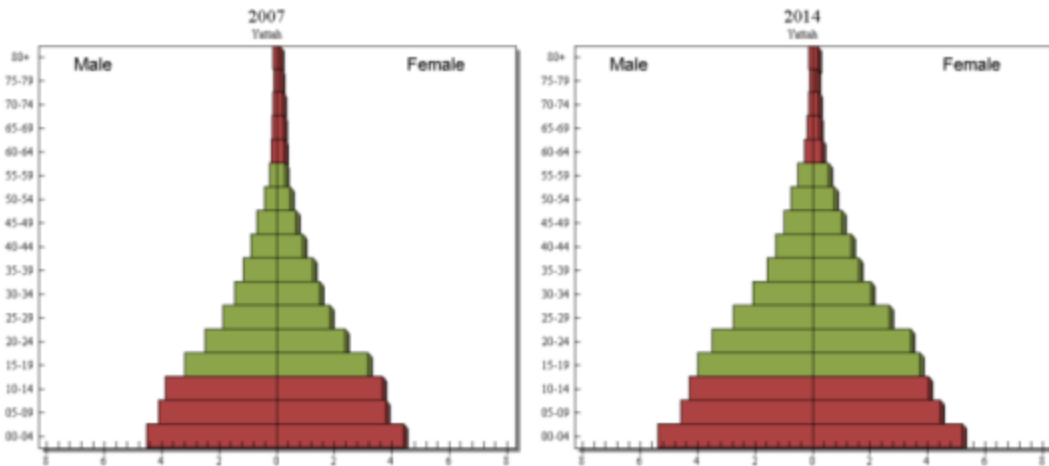

صوره: 1 جميع الفئات العمرية ممثلة بالألف لكل من العام 2007 و2014

من الملاحظ أن الهرم السكاني لمدينة يطا يقترب كثيرا من الشكل الهرمي الطبيعي خاصة في الأعوام 2022 و 2030، وبالرغم من أن القاعدة الهرمية أخذت بالاتساع إلا أنه من المتوقع أن تتناقص نسبة الفئات العمرية (أقل من 15 عاما) والتي بلغت 48% من إجمالي عدد السكان في العام 2007 إلى 40% تقريبا في العام 2030، ولا يعني تناقص النسبة أن عدد السكان سوف يتناقص بل على العكس من ذلك سيزداد، ولكن نظرا لافتراضات من أهمها: التحسينات التي ستطرأ على النظام الصحي ستؤدي إلى انخفاض نسبة وفيات الأطفال وازدياد العمر لكبار السن (توقع البقاء على قيد الحياة أعلى)، إضافة إلى انخفاض في معدل الخصوبة، وأعداد المهاجرين الآخذة بالتناقص، جميع هذه العناصر والمحددات سوف تلعب دورا رئيسيا في تغير شكل الهرم السكاني ونسب الفئات العمرية للسكان.

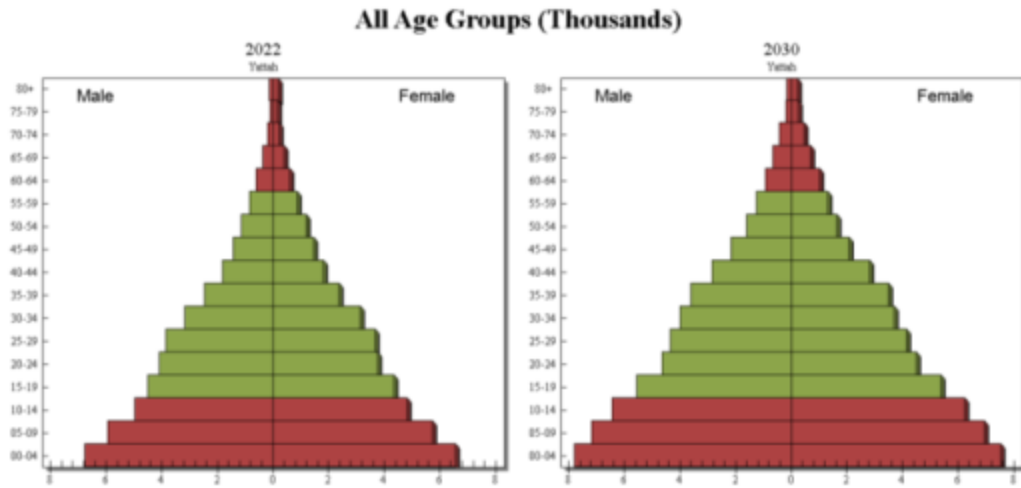

صوره2: جميع الفئات العمرية ممثلة بالآلاف لكل من العام 2022 والعام 2030

جدول: إسقاطات التركيب النوعي - مدينة يطا 2022

النسبة المئوية	المجموع	ذكور	إناث	2022
35%	31,66	16,15	15,51	14-4
	8	1	7	
10%	9,048	4,615	4,433	19-15
35%	31,66	16,15	15,51	44-20
	8	1	7	
15%	13,57	6,922	6,650	64-45
	2			
3%	2,714	1,384	1,330	74-65
2%	1,809	922	887	+75
	90,48	46,14	44,33	المجموع
	0	5	5	

5. التحليل التشخيصي - تشخيص المجالات التنموية

تم تشخيص المجالات الفرعية التالية في المجالات التنموية الرئيسية (مرفق التقرير التشخيصي لمزيد من المعلومات):

مجال البيئة والبنى التحتية

قطاع الطرق والمواصلات

قطاع المياه

قطاع الطاقة

قطاع البيئة والصحة العامة والنفايات

قطاع الصرف الصحي

مجال تنمية الاقتصاد المحلي

قطاع الزراعة

قطاع الصناعة

قطاع التجارة

قطاع الترفيه والسياحة

مجال التنمية الاجتماعية

قطاع التربية والتعليم العالي

قطاع الصحة

قطاع الخدمات والتمكين الاجتماعي

مجال التراث والثقافة

قطاع الشباب والرياضة

مجال الإدارة والحكم الرشيد

قطاع التخطيط والتنظيم

قطاع الإدارة والسلامة العامة وإدارة الكوارث

قطاع الحوكمة

ويمكن تلخيص أهم النتائج على النحو الموضح في الجدول التالي:

5.1 البيئة والبنية التحتية

المجال الفرعي	خلفية مختصرة	المؤثرات الإيجابية	المؤثرات السلبية	الاحتياجات	القضية
الطرق والمواصلات	يعتبر قطاع الطرق والمواصلات من القطاعات المساندة المركزية للاقتصاد المحلي، لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع، وما يلعبه من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى. بالنظر إلى واقع شبكة الطرق القائمة فإن 45% من الطرق المعبدة متهالكة و بحاجة إلى إعادة تأهيل، و 35% من الطرق المعبدة بحاجة إلى صيانة و عمل أكتاف خرسانية، علاوة على أن شبكة الطرق القائمة بحاجة إلى تطوير و ذلك من خلال شق و تأهيل مجموعة من الطرق المقترحة ضمن المخطط الهيكلي المحدث لمدينة يطا، هذا بالإضافة إلى انه و نظرا لتنامي أطراف المدينة و اتساع مناطق النفوذ الإدارية لبلدية يطا و لتحقيق التواصل الاجتماعي بين سكان المدينة والقرى المحيطة فإن الحاجة تقتضي تأهيل سلسلة من الطرق الرابطة بين المدينة و القرى المحيطة و ذلك بتحضير البنية التحتية اللازمة لإنجاز رؤية البلدية في الحصول على محافظة تخدم مناطق يطا و مسافرها. تعاني مدينة يطا من عدم تأهيل مفترقات الطرق المنتشرة في المدينة بكثرة، حيث غالبيتها تفتقر	التوجه الوطني لتعزيز البنية التحتية للمدن و بناء شبكة طرق حديثة. التوجه العالمي المعبر عنه في خطة التنمية المستدامة اتجاه المدن المستدامة. اهتمام المجالس البلدية المتعاقبة بتنفيذ مشاريع الطرق كونها تشكل واجهة ملموسة لإنجازاتهم. قدرة البلدية على التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة لتطوير قطاع النقل و المواصلات. وجود مديريات من شأنها تعزيز و تطوير قطاع الطرق و المواصلات كمديرية النقل و المواصلات، ودينومويزر بلدية يطا. الخطط السنوية للبلدية والخطط الاستراتيجية للمدينة وتحديثاتها دائما تشمل على مشاريع تطوير قطاع الطرق والمواصلات.	طول شبكة الطرق العالي الذي يحتاج إلى مشاريع شق وتعبيد وتأهيل وصيانة مستمرة. ضعف تعاون المجتمع المحلي في تقبل شق و توسعة الطرق القائمة و المقترحة. ضعف خطة صيانة للطرق القائمة و المحافظة على جودتها. محدودية وجود مواقف عامة تقلل من نسبة الاختناق المروري خاصة في وسط المدينة. محدودية وجود خطوط نقل داخلية (البيرمت الداخلي). محدودية التزام أصحاب العمارات بتوفير مواقف لسيارات مستخدمي المبنى. معيقات الاحتلال الإسرائيلي بخصوص تأهيل مداخل المدينة الرابطة مع شارع رقم 60.	تأهيل 4 من مداخل المدينة الرئيسية. تعبيد وتأهيل ما يقارب 65 كم من شبكة الطرق الداخلية والرابطة. شق 40 كم من الطرق المقترحة. العمل على توسعة مجمع المركبات العمومية. الحصول على عدد من خطوط البيرمت الداخلي و تأسيس نواة شبكة المواصلات الداخلية. تفعيل خطة الصيانة الدورية. تركيب إشارات مرورية عدد 2.	ضعف البنية التحتية للطرق والمواصلات، وتهالك في عدد واسع من الشوارع، والاكتظاظ المروري، وضعف المواءمة لاحتياجات ذوي الإعاقة، وكبار، وكبيرات السن

		للرؤية السليمة و عملية الدخول والخروج الآمن منها، خصوصا في ظل غياب الإشارات المروية عن طرق المدينة.		- عدم توفر الموازنة الكافية للمساعدة بالانتظام في تعبيد طرق المدينة. -	
قطاع المياه	مدينة يطا موصولة بشبكة المياه منذ العام 1974 م، تم تطوير الشبكة في العام 1995-1996 بتمويل من المملكة العربية السعودية و بواسطة المجلس الاقتصادي الفلسطيني (بكدار) وأصبحت تغطي ما نسبته 80% من مساحة مخطط الهيكل للبلدية و المصادق في العام 2002 م (24,552.76 دونم)، وهو التطوير هو الوحيد الذي تم على شبكة المياه باستثناء ما قامت به سلطة المياه من تنفيذ لبعض الخطوط الرئيسية المغذية للمدينة و التي تتبع لسلطة المياه مثل خط مياه بني نعيم-يطا والذي تم تنفيذه عن طريق الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) بقطر (20 Ductile")، وخط مياه أبو العشوش/ دورا-يطا (الخط الفرنسي) من خزان حلحول والذي تم تنفيذه عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بقطر (24" Ductile)، و ما قامت به البلدية من تنفيذ لخطوط محدودة بأقطار صغيرة و انشاء لخزاني مياه بسعة 6000 م3، و بتوسعة المخطط الهيكل الى 31.7 كم2 أصبحت الشبكة تغطي	- التوجهات المتعلقة بتركيب عدادات الدفع المسبق وبالتالي الحد من التعديات على شبكة المياه. - وجود عدد ن مذكرات التفاهم مع عدد من الممولين في قطاع المياه. - توجه سلطة المياه لهيكل قطاع المياه وفق قانون المياه رقم 4 لعام 2014م وتحويل مزودي خدمات المياه الى مصالح مياه مستقلة ودعم هذه المؤسسات لتصبح قادرة على تأدية خدماتها وإدارة ذاتها بكفاءة اعلى. - وجود طاقم مدرب وذو كفاءة عالية في البلدية. -	- ضعف القوانين و التشريعات و غياب السلطة التنفيذية بما يتعلق بحماية من يعتدي على شبكة المياه ومن يتخلف عن دفع المستحقات المترتبة عليه. - العقلية و الثقافة السائدة للمواطنين تجاه البلدية و دفع ما عليهم من مستحقات. - المساحة الجغرافية الكبيرة للمدينة و غياب التنظيم العمراني. - اشتراط سلطة المياه بجدولة ديون البلدية المستحقة للسلطة للحصول على مشاريع ومساعدات. - وقوع المدينة في منطقة فقيرة مائياً بفعل التكوين الجيولوجي غير المنفذ للمياه وكذلك في نهاية مصادر التوزيع الخاصة بسلطة المياه مما يجعل عملية تزويدها بالمياه صعبة.	- تطوير Master Plan الخاص بشبكة المياه في المدينة بما يغطي كامل المخطط الهيكل الجديد. - ربط كامل شبكة المياه وتوثيقها بكل مكوناتها على GIS. - تطوير وتوسعة شبكة المياه الداخلية لتغطي المخطط الهيكل للبلدية. - تطوير الوارد المائي للمدينة وزيادة حصة الفرد	- شح مصادر المياه، وضعف البنية التحتية الخاصة بالمياه.

		فقط ما نسبته 65% من المخطط الهيكلي حيث يتم خدمة باقي المناطق بواسطة صهاريج المياه و التي تمتلكها البلدية (3 صهاريج سعة 10م3، صهرج سعة 16م3)، وتتراوح حصة الفرد من المياه 25-32م3/فرد يوميا،		- نقص الآليات والمعدات والورش الفنية لدى قسم المياه في البلدية. -	
الطاقة	تحصل مدينة بطا على خدمة الكهرباء لشبكة الجهد المتوسط والجهد المنخفض من خلال ربطها بشبكة شركة كهرباء الجنوب صاحبة الامتياز لتوزيع الطاقة الكهربائية في المنطقة والتي بدورها تستمد الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية على خطوط التغذية 33 كيلو فولت، وتضم الشركة كل من مناطق دورا و الظاهرية ويطا، حيث تتواجد مقرات مملوكة للشركة في مركز كل مدينة بالإضافة للمركز الرئيسي للشركة ومستودعها الأساسي في منطقة الهجرة، وتعتبر المدينة اكبر المساهمين في شركة كهرباء الجنوب وتقع ضمن منطقته الوسط التي تمر بها الشبكات الرئيسية للشركة، ويوجد على مدخلها الجنوبي الغربي نقطة الربط الوحيدة مع الشبكة القطرية وشملتها العديد من مشاريع التطوير وإعادة التأهيل لشبكات الضغط العالي والمتوسط ومحطات التوزيع.	- وجود مقر لشركة كهرباء الجنوب في المدينة. - طاقم إداري وفني مؤهل للشركة وذو خبرة. - مكونات نظام الكهرباء من شبكات و محطات جيدة. - انتشار عدادات الدفع المسبق بنسبة عالية. - إشراف إداري على شركة الكهرباء من قبل البلدية وهناك تعاون وتنسيق عالي بينهم. - نسبة التغطية الجغرافية 97%. -	- ضعف القدرة الكهربائية من المصدر (الشركة القطرية الإسرائيلية). - التعديات غير القانونية على الشبكة وارتفاع نسبة الفاقد. - الاشتراكات الجماعية على العدادات للعائلات الممتدة - نسبة الأحمال خاصة في الشتاء مقارنة بوارد الطاقة غير مناسب	- تركيب نقطة ربط جديدة من المدخل الشمالي للمدينة. - تركيب شبكات ضغط متوسط بطول 30 كم. - تركيب محطات تقوية عدد 20 لتقوية وتعزيز التيار الكهربائي. - تركيب شبكات جهد منخفض ABC بطول 30 كم لتلبية التوسع العمراني. - إنشاء وحدات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية، الرياح أو الغاز - محاربة الفاقد بدعم حكومي لأن ضعف التيار الكهربائي ناتج من الفاقد الغير شرعي	- ضعف واردات الطاقة للمدينة، والاعتماد الكلي على في مصدر الطاقة من الشركات الاسرائيلية

تعاني مدينة بطا من عدة مشاكل بيئية، أهمها عدم وجود شبكة صرف صحي في المدينة والتي أدت إلى انتشار الحفر الامتصاصية غير الصماء، حيث بلغ عددها حوالي 10,000 حفرة، مما يؤدي إلى تسرب مياه الحفر إلى المياه الجوفية والتربة، وإلى المياه في آبار الجمع المنزلية وبالتالي هناك إمكانية كبيرة لوصول وحوادث التلوث في هذه المياه. وقضية سيل المياه العادمة، حيث يمر سيل طبيعي كمجرى لمياه المطر منذ القدم من أراضي منطقة بطا الشمالية والغربية بطول حوالي 14 كم منها 9 كم داخل حدود بلدية بطا، ويأتي هذا السيل من مدينة الخليل باتجاه بطا (الحيلة و واد السادة والريحية و أبو الفول و خلة عربي و بيت عمرا) مروراً بأراضي دورا والسموع والظاهرية باتجاه بئر السبع . وقد تم استخدام هذا المجرى الطبيعي لتدفق مياه المجاري والمياه العادمة من مخلفات سكان مدينة الخليل ومستوطنة كريات أربع و خارصينا منذ حوالي 40 عام، مما يشكل أزمة بيئية في المنطقة تتمثل: تلوث الأراضي الزراعية على ضفاف هذا السيل نتيجة مرور المواد الملوثة منها، ونتيجة فيضان مياه المجاري وخاصة عند اختلاطها بمياه المطر المتجمعة من الجبال والأودية المحيطة بالسيل، علماً بأن تلك الأراضي تعتبر من أخصب مناطق محافظة الخليل. فصل أحياء من المدينة الى شقين غرب وشرق سيل المياه العادمة كما في حالة منطقة الحيلة.	- وجود مكب مؤهل خارج حدود المدينة والمحافظة. - محدودية عدد الصناعات الثقيلة التي تعمل على تلويث البيئة. - اهتمام الجهات المانحة بالجانب البيئي وجعل دراسة الأثر البيئي مطلباً لتنفيذ المشاريع. - اهتمام المجلس البلدي الحالي بضرورة استكمال انشاء محطة معالجة المياه العادمة وسقف سيل المجاري بشكل كامل. - اهتمام المجلس البلدي الحالي بضرورة عمل مسالخ بلدية مؤهل خصوصاً بعد توفير قطعة الأرض المطلوبة. - يتم التخلص من النفايات الطبية من قبل مجلس الخدمات المشترك بطرق آمنة.	- وجود سيل المجاري المكشوف. - عدم وجود شبكة صرف صحي. - انتشار الحفر الامتصاصية غير الصماء . - عدم وجود مسالخ بلدية مؤهل و تحت المراقبة. - عدم كفاية طاقم ومعدات وآليات قسم الصحة في البلدية المسؤول عن جمع وترحيل النفايات. - عملية جمع النفايات تعتبر مشروع خاسر كون الرسوم المفروضة لا تسد قيمة التكلفة الفعلية. - انتشار المنشآت الصناعية والحرفية في الأحياء السكنية وبين المحال التجارية مما يعمل على إزعاج المواطنين من الضوضاء والغبار الناتج.	- اكمال سقف ومعالجة مجرى سيل المجاري المكشوف. - إنشاء مسالخ بلدية مؤهل. - تعزيز وتطوير قسم الصحة في البلدية بالطواقم والمعدات والآليات اللازمة. - تعزيز الغطاء النباتي الأخضر بزرع المزيد من الأشجار المثمرة والحرجية. وجود سيل مكشوف للمياه العادمة والصرف الصحي، وضعف معالجة النفايات، والنفايات الصلبة، إضافة ضعف المعدات المتاحة للنفايات الصلبة، ما يشكل خطورة بالغة على الصحة العامة.
--	---	--	--

	غمر الأراضي على ضفتي السيل في فصل الشتاء بعمق 50م وطول 14كم.			
--	--	--	--	--

5.2 مجال تنمية الاقتصاد المحلي

المجال الفرعي	خلفية مختصرة	المؤثرات الإيجابية	المؤثرات السلبية	الاحتياجات	القضية
الزراعة	اهتم الأهالي منذ القدم بتربية الثروة الحيوانية للحصول على منتجاتها من الحليب والألبان و توفير مصدر للحوم، تمتاز المدينة بكمية شجر الزيتون المنتشر فيها ونوعية الزيت المستخرج منها بدأ يتناقص اعتناء المواطنين بأراضيهم لتوفر فرص عمل ومصادر دخل جديدة. تمتاز مدينة يطا باستواء أراضيها، وتمتد تضاريسها ووعورتها باتجاه الغرب. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية 3,650 دونم من المساحة الكلية للمدينة (تصنيف سكن زراعي داخل المخطط الهيكلي للمدينة)، وهناك 5,000 مستغلة بالزراعة ضمن مناطق مصنفة سكن أ و سكن ب داخل المخطط الهيكلي. وتمتاز أراضي المدينة بالخصوبة العالية، الأمر الذي يعلل ممارسة معظم سكان يطا الزراعة (سواء جزئيا أو كليا)، وتنتشر في يطا زراعة البقول، الحبوب، العنب والزيتون إضافة إلى اللوزيات، وتعتمد الزراعة بنسبة 99% على مياه الأمطار. تعتمد مدينة يطا بشكل كبير على النشاط	- وجود مساحات وأراضي زراعية واسعة في المدينة وضمن المخطط الهيكلي للبلدية. - وجود الأراضي الخصبة بالرغم من تناقصها بفعل الاعتداء عليها - طابع المجتمع الفلاحي والقروي الموجود في المدينة. - وجود مديرية للزراعة والبيطرة في المدينة تعمل على مساعدة المزارعين والجمعيات الزراعية. - وجود مشاتل ومحلات زراعية خاصة تقوم بتوفير الشتال والبذور وغيرها من الخدمات الزراعية. - وجود أسواق للمواشي تعقد بالمناطق المحيطة بشكل دوري مثل سوق الظاهرية والفحص.	- العزوف عن العمل الزراعي لقلة مدخولاته والتوجه إلى الأعمال الحرة . - عدم توفر أصناف جيدة تساعد في زيادة كمية الإنتاج . - ضعف كبير في المساحات المروية لقلة مصادر المياه. - تدني نسبة الأيدي العاملة في القطاع الزراعي. - عدم توفر سوق مواشي نموذجي. - عدم وجود سوق مركزي للخضار والفواكه والمنتجات الزراعية. - الاعتماد على مياه الأمطار بشكل شبه كلي في الزراعة. -	- توفير آبار جمع المياه وإنشاء برك تجميع المياه كذلك توفير المعدات الزراعية وصهاريج نقل المياه . - شق طرق زراعية بطول لا يقل عن 60 كم لمساعدة المزارعين . - استصلاح ما مساحته 1500 دونم من الأراضي الصالحة للزراعة . - زيادة نسبة الأراضي المروية بمعدل 5% من إجمالي الأراضي الزراعية . - توفير مشتل زراعي يراعي طبيعة الشتال والأشجار التي تتناسب مع البيئة . - توفير سوق خضار مركزي . - توفير سوق مركزي للمواشي . - توفير مركز ومختبر لتطوير وتحسين السلالات .	تراجع اسهام القطاع الزراعي في الإنتاج المحلي، والعزوف عن الاهتمام بقطاع الزراعة نتيجة لضعف الموارد المائية، والتسارع في تكلفة الإنتاج الزراعي، ونتيجة لعدم وجود مرافق مساندة.

المجال الفرعي	خلفية مختصرة	المؤثرات الإيجابية	المؤثرات السلبية	الاحتياجات	القضية
	الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وتعتبر المدينة بمنتجاتها الحيوانية مصدرا لتوفير منتجات اللحوم والألبان ذات الجودة المشهورة على مستوى محافظة الخليل			- مشروع للسدود المائية في الأودية.	

المجال الفرعي	خلفية مختصرة	المؤثرات الإيجابية	المؤثرات السلبية	الاحتياجات	القضية
الصناعة	يوجد في المدينة (9) مصانع (مناشير) للحجر المستخرج من أراضي يطا. كسارة عدد6 لمنتجات الحصمة ومواد البناء والبيسكورس لأغراض أعمال تنفيذ وإنشاء الطرق. (26) معمل للطوب والبلاط. (7) مشاغل للموزاييك والرخام لخراطة الحجر. مصنع لصناعة الورق الصحي والحفاظات. أربعة معاصر للزيتون 5 منشآت لتعبئة مواد التنظيف. 38 من محال الحدادة والألمنيوم وغيرها من الورش والحرف المختلفة. وتعاني المدينة من انتشار المنشآت الصناعية والحرفية بين المنازل والمحال التجارية، بسبب غياب منطقة صناعية مؤهلة، تستطيع استيعاب هذه المنشآت، وبالتالي انتشار الضوضاء والتلوث البيئي الذي طالما اشتكى منهما الأهالي وأصحاب المحال التجارية.	- وجود مخطط مناطق للحرف والصناعات الخفيفة على المخطط الهيكلي موزعة جغرافيا بصورة سليمة. - وجود رجال أعمال وقطاع خاص قوي يمكن تشجيعهم للاستثمار في قطاع الصناعة. - وجود شبكات طرق جيدة، وخدمات داعمة كالكهرباء والاتصالات، تساعد على تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة. - عدد سكان كبير، يمثل قوة شرائية جيدة، مما يساعد على تسويق المنتجات. - توجه وزارة الحكم المحلي للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص من أجل خلق بيئة استثمارية فعالة، ولكنها بحاجة إلى إقرار قوانين تضبط العلاقة بينهم.	- عدم وجود أي حاضنة أعمال. - اجراءات تسجيل الشركات وتعقيدها. - ضعف الفعاليات التسويقية للمنتجات الأراضي المقترحة للمنطقة الصناعية عبارة عن محاجر لاستخراج الحجر ذات ملكية خاصة. - عدم توفر قطع أراضي مملوكة للبلدية أو الحكومة من أجل إقامة مناطق الخدمات العامة. - على تشجيع الاستثمار في مجال الصناعة.	- تأهيل منطقة حرف وصناعات خفيفة. - إنشاء حاضنة أعمال تساعد الاستثمار./ مسرعات أعمال للشباب والشابات - عمل قاعدة بيانات اقتصادية شاملة وتفرغها على برنامج GIS. - تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مجال التنمية الاقتصادية. - توفير برامج لدعم وإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة والتي تزيد من الإنتاج وزيادة نسبة النمو . - إنشاء مصنع لإعادة تدوير النفايات .	ضعف تنظيم القطاع الصناعي وتشكيله عي على السكان، وضعف تشجيع الأعمال المتوسطة والصغيرة، ومحدودية المناطق الصناعية.

يخلق امتداد المحال التجارية بشكل غير منظم على طول الشارع الرئيسي، أعباء متراكمة على السكان، ويضاعف عدم التنظيم الأعباء الملقة على عاتق البلدية سواء في جمع النفايات، أو في ضبط التراخيص إضافة الى وجود استخدام متداخل بين التجاري والسكني في كافة المناطق في المدينة.	- تنظيم الأعمال التجارية في المدينة . تشجيع الأكشاك في أماكن مناسبة عمل مواقف سيارات . - تعزيز التسويق الزراعي - تطوير تسجيل الشركات التجارية	- تتركز الحركة التجارية على طول الشارع الرئيسي الشرياني في المدينة. - عدم تأهيل وتشغيل المناطق التجارية الفرعية الموزعة جغرافيا في المدينة. - الارتفاع المستمر في قيمة إيجار المحال التجارية. - العدد القليل من المحال التجارية المسجل في سجلات الضريبة بوزارة المالية (الحاصلة على مشغل مرخص). - مشاكل الازدحام المروري الناتجة عن وجود المحال التجارية على الشارع الرئيسي. -	- وجود مكتب لغرفة تجارة وصناعة الجنوب. - تنوع البضائع والمعرضات في المحال التجاري والتي تكفي لأغلب متطلبات المواطنين. - الزيادة المستمرة للمحال التجارية والذي يدل على توجه المواطنين للتجارة كمصدر للرزق والعيش. - زيادة ملحوظة في عدد استثمارات القطاع الخاص تحديدا في بناء المحال والأسواق التجارية. -	تتركز الحركة التجارية على طول الشارع الرئيسي من مدخل المدينة وحتى وسطها والتفرعات المجاورة مباشرة، وتعد المحال التجارية الموجودة هناك سهلة الوصول لمرتادي المدينة والمتسوقين، ولا توجد أية عوائق باستثناء حركة المرور. كما توجد غالبية أنواع المحال التجارية والسلع المطلوبة سواء البقالة والتموين، مواد البناء، الأدوات والمواد الزراعية والصناعية، والورش المهنية والفنية المختلفة، مما يعزز من كفاءة توفير كافة الاحتياجات لأهالي المدينة والقرى المجاورة، أسهم هذا في تعزيز ربط مواطني تلك القرى بالمدينة باعتماد سوق مدينة يطأ كوجهة رئيسية لتلبية احتياجاتهم، لسهولة وقرب المدينة والسوق والتنوع في السلعة. ومن المشاكل التي تواجه النشاط التجاري هي قيمة إيجار المحال التجارية والزيادة المستمرة فيها بشكل سنوي، خصوصا تلك المحال التي تقع على الشارع الرئيسي ووسط المدينة (السوق التجاري المركزي)، أيضا اعتماد التوزيع التجاري على مناطق التجاري الطولي حسب المخطط الهيكلي للبلدية، وغياب المراكز التجارية الفرعية على أرض الواقع،	التجارة
--	--	---	--	---	----------------

المجال الفرعي	خلفية مختصرة	المؤثرات الإيجابية	المؤثرات السلبية	الاحتياجات	القضية
السياحة	خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت بلدية يطّا في تنفيذ مشروع منتزه بلدية يطّا الأثري في الكرمل، وهو يقع خارج المخطط الهيكلي لبلدية يطّا، على مساحة 13 دونم، وهو غير مكتمل حتى هذه اللحظة، حيث نفذت البلدية عدة مراحل عبر حصولها على تمويل من جهات مانحة، ومن ميزانيتها الذاتية، ونفذت مشاريع الأسوار والمدرجات وألعاب الأطفال وحماية البركة الأثرية، ومؤخراً بناء كافيتيريا داخلية للمنتزه، وبئر ماء، وتنفيذ مشروع إغلاق للمنتزه بالأسوار والشيك، حيث تبقت بعض المراحل من أهمها المسابح الداخلية وتأهيل القسم الشمالي الشرقي والساحات ومباني الخدمات، وبالرغم من عدم اكتمال المنتزه، فالأهالي ترتاده للنتزه والاستجمام، وترفيه الأطفال من خلال الألعاب الموجودة، وأقامت البلدية فيه معرض ربيع يطّا للترويج الاقتصادي والتجاري وبعض الفعاليات والندوات والأمسيات الثقافية والشعرية. ولتعزيز وتطوير القطاع التراثي والسياحي في المدينة، نفذت البلدة عدت مشاريع ترميم للمباني العربية في البلدة القديمة، كما ذكر سابقاً في المجال الفرعي الثقافة والتراث ضمن المجال الرئيسي التنمية الاجتماعية. تعمل البلدية والمدينة على تعزيز القطاع السياحي خلال السنوات القادمة من خلال إنشاء	● وجود مساحات برية واسعة. ● وجود عدد واسع من المناطق التاريخية والتراثية في المدينة. ● توفر كبير للطاقات الشبابية التي من الممكن أن تساهم في نمو القطاع السياحي وتعزيز الانخراط في هذا القطاع. ● وجود صناعات الخزف، والحيافة. ● محدودية توفر الأماكن الترفيهية في المدينة.	- لا يوجد منتزه داخلي في المدينة. - عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في القطاع السياحي. - عدم اكتمال ترميم البلدة القديمة، فالعمل يكون على مراحل وفترات متباعدة. - التكلفة العالية في تأهيل الأماكن الترفيهية والسياحية. -	- إنشاء منتزه عام داخل المدينة. - إكمال مراحل منتزه البلدية الأثري في الكرمل وتشغيله. - إنشاء مسار سياحي من البلدة القديمة إلى منتزه البلدية إلى مسافر يطّا ومشارف البحر الميت. - عقد فعاليات ثقافية واقتصادية في منتزه البلدية في الكرمل وفي البلدة القديمة. - إنشاء مركز ثقافي لتغير المفاهيم المتعلقة بالتنمية الاقتصادية بشكل عام وتوجيه جزء من هذا الاستثمار ناحية هذا القطاع . - عمل بيت ضيافة يكون بداخل البلدية والأحياء التاريخية مع ضرورة إحياء البلدة القديمة وتأهيلها بشكل لائق .	ضعف القطاع السياحي والترفيهي في المدينة، ومحدودية الاهتمام فيه، وبالتالي محدودية اسهامه في الناتج المحلي.

المجال الفرعي	خلفية مختصرة	المؤثرات الإيجابية	المؤثرات السلبية	الاحتياجات	القضية
	مسار سياحي جاذب للسياحة الداخلية والخارجية، يبدأ من البلدة القديمة وسط المدينة،			- تمكين دور المرأة في العملية التنموية من خلال إنشاء مركز تجاري للحرف اليدوية كالمطرزات والغزل والنسيج - عمل مخطط للمناطق السياحية ومحاولة أهميتها التاريخية والجمالية والأثرية. -	

5.3 مجال التنمية الاجتماعية

المجال الفرعي	خلفية مختصرة	المؤثرات الإيجابية	المؤثرات السلبية	الاحتياجات	القضية
التربية والتعليم	بلغ عدد المدارس عام 2015 (72 مدرسة) وفي العام الدراسي 2016 ازداد عدد المدارس الحكومية إلى 79 مدرسة في العام الدراسي 2018 بلغ عددها 81 مدرسة وفي العام 2023م أصبح 98مدرسة مقسمة كما يلي: 18 مدرسة مختلطة، 18 مدرسة اناث، و18مدرسة ذكور، وافتتحت أول شعبة للتعليم التكنولوجي في ذكور يطا الثانوية واستحدثت العاشر المهني في مدرستي ذكور المأمون الأساسية، وذكور الكرملة الثانوية، وبلغ عدد المدارس المستأجرة 15 مدرسة، بلغ عدد طلاب المدارس هذا العام 28,919 منهم 14022 طالب و 14897 طالبة. ولنلاحظ من خلال هذه الإحصائية أن عدد طلبية المرحلة الأساسية 25,123 طالبا وطالبة، والمرحلة الثانوية 3,580 طالب وطالبة، وبلغ عدد شعب الصف الأول في العام الدراسي 2022، (135 شعبة)، وشعب الثانوية العامة (159شعبة) وبلغ عدد رياض الأطفال 51 روضة، وعدد الطلبة فيها 2000 طالب وطالبة. ونسبة المدارس المستأجرة في حدود البلدية بلغت في العام 2023 (27.27%) من المدارس الحكومية.	- توزيع المدارس الجغرافي الجيد يخدم - عدم الاكتظاظ - انعدام نظام التعليم المسائي - 95%من المدارس متصلة بالإنترنت - توفر 18 قطعة ارض متبرع بها لبناء مدارس - قابلية الناس للتبرع لبناء المدارس (6) - مدارس تبني من المجتمع المحلي - وجود فرع لجامعة القدس المفتوحة - زيادة عدد شعب المرحلة الدنيا - وجود مديرية تربية وتعليم في يطا - زيادة وعي الأهالي بضرورة تعليم الأبناء حتى النهاية	- نسبة 27.27% من المدارس هي مدارس مستأجرة - عدم توفر قاعة للاحتفالات والاجتماعات الكبيرة ومركز ثقافي - عدم توفر بناء للتربية وهو مستأجر - تدني عدد شعب المرحلة الثانوية وخاصة الفرع المهني والصناعي والعلمي - عدد المدارس التي بحاجة الى تعبيد للمساحات 5مدارس - عدد المدارس المختلطة هي 19 مدرسة ومدارس الذكور 18 مدرسة إناث 18 - عدم توفر أي مدرسة مهنية وصناعية - عدد المدارس التي بحاجة الى صيانة 14 مدارس - عدم وجود مركز تأهيل ذوي إعاقة (يعمل على تأهيل ذوي الإعاقة في المجال المهني	بناء 5 مدارس أساسية - تشطيب 5 مدارس مبنية - حاليا وبحاجة لتشطيب - صيانة 14 مدرسة وتعبيد - ساحات لمدارس أخرى - بناء مدرسة مهنية وصناعية - تطوير التأهيل والادماج لذوي الإعاقة. - تعزيز المواءمة للأشخاص ذوي الإعاقة. - إيجاد غرف مصادر في عدد من المدارس	محدودية التعليم الموجه لذوي الإعاقة، وضعف بنية المدارس وحاجتها لصيانة مستمرة، وضعف التعليم المهني، ومحدودية المواءمة.

يوجد في داخل مدينة يطا حوالي 16 عيادة صحية حكومية تقدم الرعاية الصحية والأمومة والطفولة، عيادة شهداء يطا مستوى 4، ومنها 3 عيادات بمستوى 3+، وهي عيادة العروس، الكراج، والغويطة، حيث تشمل على مختبرات و صيدليات وأطباء مناوبين، خلافا لمستشفى يطا الحكومي الذي سنقف عنده لاحقا. أما القطاع الصحي الخاص، فيوجد ما يقارب 20 عيادة طبية خاصة، 22 عيادة أسنان، مراكز طبية عدد 2 هي مركز فادي الطبي ومركز الاعتماد الطبي، ومستشفى ناصر للجراحة والولادة، 9 مختبرات، 2 مركز علاج طبيعي، 20 صيدلية، جمعيات خيرية طبية عدد 2 هي جمعية يطا الخيرية وجمعية أرض الأطفال، هذا بشكل سريع حصر للجهات الصحية في المدينة. تم البدء في بناء مستشفى يطا الحكومي (مستشفى أبو الحسن القاسم) عام 2002، لتلبية الاحتياجات الصحية الملحة لواقع اجتماعي يتسم بالفقر والمرض وضعف الإمكانيات، وبدأ العمل الفعلي في المستشفى بتاريخ 2004/4/17، حيث يخدم المستشفى حوالي 200 ألف نسمة، هم سكان مدينة يطا والسموع والريحية ومخيم الفوار وحذب الفوار.	وجود عيادات جاهزة لتأهيلها إلى مستوى 3+، وعددها عشر عيادات . تم التبرع بأرض البدء ببناء مبنى مديرية صحة بالتعاون مع المجتمع المحلي وجود الكوادر الطبية المؤهلة في المدينة. تم تشغيل كامل العيادات بكافة طاقاتها	عدم تشغيل المستشفى بكل طاقته. نقص في الأدوية بالمستشفى والعيادات الحكومية. عدم وجود أماكن مناسبة لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية. المركزية في التعامل المالي والإداري في الوزارة	استكمال بناء وتشطيب مديرية الصحية المبنية حاليا على نفقة المجتمع المحلي تأهيل المستشفى الحكومي افتتاح الأقسام المتبقية. رفع جودة الأداء في المستشفى من خلال استخدام البرامج المحوسبة المناسبة ووضع أدلة العمل والإجراءات. تشغيل عيادة العروس وتلة الصمود بمستوى 3+	ضعف البنية التحتية للقطاع الصحي بما في ذلك المستشفى الحكومي والعيادات التي تخدم المناطق المهمشة، والمكونات الضعيفة
--	---	--	---	---

محدودية برامج التمكين الاجتماعي، والدعم النفسي والاجتماعي، وضعف الاهتمام بتنمية شراكة النساء، وعدم استجابة المرافق العامة لاحتياجات ذوي الإعاقة والنساء، وكبيرات وكبار السن.	مركز إضافي لرعاية الأيتام. بناء وتشطيب مبنى متكامل وحسب المواصفات للمركز المجتمعي لتأهيل ذوي الاعاقة. دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال توفير فرص عمل مناسبة لقدراتهم وتفعيل النسبة القانونية لعدد الموظفين من ذوي الاعاقة في المؤسسات. تأهيل مقبرة عامة عدد 2 موزعة جغرافيا في المدينة. تشجيع التمكين الاقتصادي للسيدات وعائلات ذوي الاعاقة من خلال تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. تأهيل الأسواق العامة، ورفعها بمنافع عامة؟ مظلات انظار تأهيل ملاعب خاصة للأطفال ومستجيبة لاحتياجات ذوي الإعاقة؟ برامج الصحة النفسية للأطفال؟	عدد السكان الكبير وارتفاع معدل الخصوبة والانتشار الواسع لمساحة المدينة. عدم كفاية الدعم الحكومي. غالبية المباني والمؤسسات غير مؤهلة لاستقبال ذوي الاعاقة. ثقافة المواطن التي تركز على الاستفادة من الخدمات المادية و وعدم الاهتمام بالجانب الذي يركز على رفع الوعي والتمكين والتنمية. سوء الوضع الاقتصادي وانتشار البطالة يؤدي إلى ارتفاع عدد الأسر التي تحتاج إلى تدخل ومساعدة.	وجود جمعيات ومؤسسات تعمل بشكل تطوعي وتغطي معظم المجالات. وجود جهات حكومية تقوم بالإشراف والمتابعة وتقديم الخدمات كمديرية الأوقاف ومديرية التنمية الاجتماعية. وجود رغبة لدى الأهالي للتبرع بقطع أراضي لعمل مشاريع تخدم المواطنين. هناك جهات ممولة وداعمة تهتم بالقطاع النسوي و قطاع ذوي الاعاقة الخاصة يمكن التواصل معهم والاستفادة من تمويلهم.	يوجد في مدينة يطا عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في مجال الرعاية والتمكين الاجتماعي، سيما مديرية التنمية الاجتماعية، ومركز بلدية يطا المجتمعي الذي تأسس 2012، حيث يهتم بشكل أساسي بذوي الإعاقة خصوصا من الأطفال، حيث يقدم لهم الخدمات الأساسية بهدف تحسين نوعية حياتهم من خلال برامج التأهيل والرعاية المتكاملة (الصحية، النفسية، الاجتماعية، الحقوقية والتعليمية) وقام مؤخرا بإضافة مدرسة الوفاء للصم الى المركز وتقديم الرعاية لهم بدلا من جمعية الجنوب للتأهيل والتي اغلقت، كذلك لرفع مستوى الوعي بالإعاقة وذوي الاحتياجات في المجتمع، نسبة الإعاقة في محافظة الخليل حوالي 3.09%، وبلغ عددهم في مدينة يطا حسب آخر احصائية لعام 2012 حوالي 1,946 حالة، منهم 1,088 من الذكور و 858 من الإناث، ها و يوجد في مدينة يطا عدد من المراكز والمؤسسات الحكومية والأهلية التي تعمل في اطار التمكين والحماية الاجتماعية سيما مديرية التنمية الاجتماعية، ومركز بلدية يطا المجتمعي الذي يقدم خدماته بشكل شهري لحوالي 100 شخص من ذوي الإعاقة. ومن أهم الجمعيات الناشطة في المدينة من ناحية تقديم الخدمات المهمة هي الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام وتهدف الى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز العمل الخيري والتطوعي وتطوير الأداء، حيث تقدم خدماتها في مجال رعاية الأيتام، ورياض الأطفال والمدارس الخاصة والتثقيف الصحي ورفع الوعي للمرأة وغيرها من الأنشطة. كذلك يوجد العديد من الجمعيات والمراكز التي تعنى بالعمل المجتمعي مثل (جمعية سيدات يطا،	التمكين الاجتماعي
---	--	---	--	--	--------------------------

				مركز نرسان الثقافي الشبابي، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لجنة زكاة يطا، والجمعية الخيرية ،جمعية عين شمس ،وغيرها)، حيث بلغ عدد هذه الجمعيات 22 جمعية ومؤسسة كما هو مذكور في دليل التجمع السكاني.	
--	--	--	--	--	--

ضعف الرواية التاريخية حول الأماكن التراثية في المدينة، وضعف الاهتمام بترميم الأماكن التراثية، ومحدودية الوعي بأهمية هذه الأماكن.	إكمال تأهيل مباني البلدة القديمة والحفاظ على المباني التاريخية. وخلق بيئة مناسبة للتوعية وتعين مراقب للمباني التراثية في البلدة القديمة. عمل مسارات سياحية في البلدة القديمة. تأسيس متحف العمل على تأهيل المطحنة القديمة. ترميز وترقيم الأماكن التراثية وتعزيز الرواية بشأنها. إنشاء مركز ثقافي شامل بكافة المرافق المناسبة.	المساحة الكبيرة للبلدة القديمة التي تتجاوز 100 دونم و عدد المباني حوالي 1250 مبنى بحاجة لترميم وصيانة. عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في قطاع التراث والثقافة. محدودية الممولين المهتمين بهذا القطاع. غياب مركز ثقافي شامل ومؤهل بشكل مناسب.	رؤية المجلس البلدي والمؤسسات بالتوجه لتعزيز الإرث الثقافي والتراثي. وجود أماكن تاريخية وأثرية بشكل كبير.	من المعالم التراثية في مدينة يطا هي البلدة القديمة، وتعتبر احد مظاهر الموروث الثقافي ضمن محيط المدينة، يوجد ضمن المركز التاريخي موقع قديم يوجد به أساسات، مدافن، معاصر منقورة في الصخر، وبعض القطع المعمارية، وأظهرت نتائج المسح الميداني للأبنية القديمة الذي نفذ رواق في لعام 2000 أن عدد المباني القديمة في المدينة بلغ 1,283 مبنى، منها 1,105 مبانٍ تتألف من طابق واحد، أي ما يشكل 86% من إجمالي عدد المباني، إلى جانب وجود 6 مبانٍ تتألف من طابقين. وصفت الحالة الإنشائية لـ 871 مبنى بأنها متوسطة، أي ما نسبته 68%، علاوة على وجود 225 مبنى بحالة جيدة (18 %)، و 113 مبنى بحالة سيئة (9 %)، و 66 مبنى بحالة غير صالحة للاستعمال (5 %). أما الحالة الفيزيائية للمباني، فأظهرت أن هناك 912 مبنى بحالة متوسطة، أي ما يعادل 71 %، إلى جانب وجود 262 مبنى بحالة متوسطة (20 %)، و 88 مبنى بحالة جيدة (7 %). سعت البلدية خلال السنوات القليلة الماضية على عمل ترميم وتأهيل لبعض المباني في البلدة القديمة، من خلال مؤسسة رواق، حيث تم ترميم واستعمال 8 مباني بشكل كامل، كمجلس قروي للمسافر، وجمعية أصدقاء الشهيد ومركز نرسان الثقافي، ولجنة زكاة وصدقات يطا وغيرها، وتنفيذ ترميم وقائي لـ 25 مبنى آخر. ويوجد في المدينة ومحيطها العديد من المعالم الأثرية والخرب، منها خربة المنطار، وخربة اعزيز، وخربة فتوح، وخربة القفير، وخربة الديرات، وبيت عمرة، ورقعة. ومن المقامات..	التراث والثقافة
---	---	--	--	--	------------------------

يوجد عدة أندية في المدينة، منها (نادي شباب يطا، نادي الكرمل، نادي الاستقلال، نادي خلة المية، نادي سوسيا، نادي المسافرين) ، نادي شباب يطا والكرمل خصوصا، يتمتعان بشعبية كبيرة ولهم قاعدة جماهيرية تحترم على مستوى الأندية في الضفة الغربية، نادي شباب يطا يمارس عدة ألعاب منها كرة القدم و السلة وكرة اليد. إضافة لهذه الأندية، يوجد العديد من أكاديميات كرة القدم في المدينة، التي تعتني بالفئات العمرية الصغيرة، لتكوين وبناء لاعبين محليين يستقاد منهم في الأندية داخل وخارج المدينة. تعتمد الأندية على استمراريته على المخصصات التي تحصل عليها بصعوبة من وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، و المصدر الأساسي هو التبرعات التي يتم جمعها من المواطنين، حيث تفقر الأندية لمصادر دخل ثابتة كالعقارات والإعلانات وغيرها. تمارس الأندية تدريباتها ومبارياتها الودية على ستاد بلدية يطا غير المكتمل و ملعب دورا، ويمثل هذا الأخير الملعب البيتي لأندية المدينة خلال خوض منافستهم مع الفرق الأخرى، وهذا يمثل عبء مادي وجهد إضافي على الأندية واللاعبين على حد سواء . وتنتشر حاليا داخل المدينة ملاعب خماسية منجلة صناعا للقطاع الخاص عدد 2، يرتادها الشباب من فئات عمرية مختلفة يقضون فيها المرح واللعب ويمارسون هوايتهم فيها، علما بأن أحدها يضم مسجحا كمرفق إضافي.	● النسبة الأعلى بين السكان هي من فئة الشباب. ● وجود ملاعب صغيرة للقطاع الخاص يمكن الاستفادة منها. ● قاعدة جماهيرية كبيرة لنادي شباب يطا. ● اهتمام عالي من قبل البلدية بالجانب الرياضي في المدينة. ● اهتمام نادي شباب يطا برياضة كرة السلة و اليد بالإضافة لكرة القدم. ● رياضة مدرسية فاعلة ومتفوقة على مستوى مديريات التربية في الوطن وفي جميع أنواع الرياضة المنتشرة محليا ولكل الجنسين.	استاد بلدية يطا الدولي غير مكتمل لذلك غير معتمد كملعب بيتي لأندية المدينة خلال المنافسات الرسمية. عدم كفاية مخصصات الاتحاد والوزارة للأندية. تكلفة زائدة على الأندية باعتماد ملعب خارجي للتدريب والمباريات. محدودية المراكز الرياضية التي تعتني بالجسم لكلا الجنسين. ضعف لاهتمام بالفئات العمرية الصغيرة في الأندية والمراكز الرياضية.	تأهيل واستكمال مراحل بناء استاد بلدية يطا الدولي. انشاء صالة رياضية مؤهلة لممارسة الألعاب الأخرى. خلق فرص استثمارية للأندية لضمان استمرار نشاطها.	ضعف القطاع الرياضي، وبنيتها التحتية، والمرافق الخاصة بالرياضة، خاصة للفئات العمرية الصغيرة، والنساء.
--	---	---	--	---

5.4 الإدارة والحكم الرشيد

المجال الفرعي	خلفية مختصرة	المؤثرات الإيجابية	المؤثرات السلبية	الاحتياجات	القضية
التخطيط والتنظيم	هناك مشكلة كبيرة تعاني منها المدينة وهي الملكيات والتسجيل القديم للأراضي بأسماء الجد القديم، حيث آلت الأراضي للورثة وتوزعت بين بيع وشراء، ولغاية الآن لم نستطيع ضبط الملكيات والمساحات بشكل المناسب، ومن هنا ظهرت حاجتنا الماسة والفعلية لعمل مشروع تسوية أراضي بشكل سريع وفعال، وهناك نية لدى المجلس البلدي الحالي لتنفيذ هذا المشروع خلال الفترة القادمة. والجهة المخولة بمتابعة أمور التخطيط والتنظيم في المدينة هي بلدية يطا، من خلال مجموعة من المهندسين يشكلون دائرة الهندسة و دائرة التخطيط والمشاريع، حيث ينبثق منها أقسام للمباني و التخطيط والمشاريع والمساحة والأراضي حسب الهيكلية المعتمدة من البلدية، وتضم الدائرتان 18 مهندس ومفتش أبنية يتابعان الأمور التنظيمية والتخطيطية وتنفيذ المشاريع.	● تطبيق نظام البناء والتنظيم الفلسطيني رقم 2011/5. ● وجود مخطط هيكلي حديث (2017) لمدينة يطا مصادق عليه من مجلس التنظيم الأعلى. ● وجود قسم تخطيط وتنظيم وترخيص ضمن دائرة الهندسة في البلدية. ● وجود طاقم موظفين مؤهلين لمراقبة الأبنية والمحافظة على التنظيم. ● اشتراط ترخيص المباني في كافة المعاملات والخدمات. ● نشر ثقافة ترخيص المباني والمحافظة على خطوط التنظيم والشوارع بنسبة كبيرة في المدينة. ● التزام المواطنين بتطبيق أحكام المخطط الهيكلي للمدينة نسبة حوالي 80%. ● اهتمام المجلس البلدي الحالي بضرورة عمل مشروع تسوية أراضي.	● عدم تطبيق بعض المواد في التنظيم مثل اشتراط مادة البناء او خط السماء للمباني(الارتفاعات) حسب تصنيف المناطق السكنية والتجارية والنسبة المئوية للبناء وغيرها. ● ضعف التزام المواطنين في المخالفات بدون رادع بسبب غياب عنصر القوة في كثير من الأحيان (الشرطة والمحاكم) مما يجعل جزء من المخالفات تمر بدون عقاب. ● عدم توفير سيارة (آلية نقل) للمراقبين حيث أن المساحات واسعة ولا يمكن تغطيتها بالسير على الأقدام مما يؤدي إلى مرور مخالفات في المناطق البعيدة دون متابعة. ● محدودية عقد ورشات عمل بشكل دوري لتوضيح أهمية التنظيم للمواطنين. ● ضعف الالتزام بأدونات الأشغال والصب والإشراف الإلزامي.	● إكمال مشروع تسوية الأراضي وتسجيلها. ● تعزيز إمكانات دائرة الهندسة بالمعدات اللازمة ومواكبة التطور التكنولوجي. ● العمل على إيجاد محكمة بلديات. ● تحديث المخطط الهيكلي بعد الانتهاء من مشروع التسوية و توسعته. ● بناء قدرات مستمر لطاقم المراقبة والتفتيش وتفعيل نظام عقوبات داخلي خاص في البلدية لضبط التعديات على المخطط الهيكلي.	ضعف مراقبة التعديات التنظيمية، وضعف استجابة المواطنين لتعليمات البلدية في التنظيم، ومحدودية اثبات الملكيات، والتجاوزات المستمرة على الحق العام.

المجال الفرعي	خلفية مختصرة	المؤثرات الإيجابية	المؤثرات السلبية	الاحتياجات	القضية
			● ثقافة الجمهور السلبية (إصرار المواطنين على الكسب من الحق العام).		
الأمن والسلامة العامة وإدارة الكوارث	تضم مدينة يطا عدد من المراكز الأمنية، منها مراكز للأمن الوطني، المخابرات، الأمن الوقائي، والشرطة بفروعها، ولكن عدد أفراد الشرطة وعناصرها لا يتناسب مع عدد سكان المدينة ومساحتها، وهناك نقص واضح وحاجة ملحة لزيادة عددهم، وتحويل المركز إلى مديرية للشرطة، علما بأن عدد أفراد الشرطة على رأس عملهم (المناوبين) لا يتجاوز 15 عنصر، وعدد السكان يزيد عن 100 ألف نسمة كون هذه المراكز تخدم مدينة يطا وتجمعاتها كاملة، بالإضافة لوجود محكمة صلح في المدينة والتي تحتاج إلى عناصر أمنية إضافية. كذلك تضم مدينة يطا مركزا للدفاع المدني، يمتلك سيارتي إطفاء، يقدم خدماته ويتابع مدينة يطا بشكل كامل، بما تضمه من عدد سكان كبير، ووحدات سكنية مترامية ومنشآت صناعية وتجارية وزراعية مختلفة، لذا هناك حاجة ماسة لتطوير المركز إلى مديرية بكامل المعدات والطواقم المطلوبة. ويوجد في المدينة مركز للهلال الأحمر الفلسطيني، والذي يخدم كامل مدينة يطا	- وجود لجان الإصلاح ولجنة عشائر مدينة يطا - طبيعة المدينة بشكل خاص وجنوب فلسطين بشكل عام، لا تتعرض لكوارث طبيعية. - وجود تمثيل لأغلب الوزارات والأجهزة الأمنية في المدينة. - وجود محكمة صلح في المدينة. - جميع الأراضي التابعة لحدود بلدية يطا هي A.	- عدم كفاية أفراد مركز شرطة يطا بما يتناسب مع عدد السكان ومساحة المدينة. - عدم كفاية أفراد ومعدات مركز الدفاع المدني في مدينة يطا. - عدم كفاية معدات وخدمات مركز الهلال الأحمر في المدينة. - المساحة الكبيرة التي تقع ضمن نشاط الأجهزة الأمنية. - العوامل السياسية مع وجود الاحتلال الذي يعيق أي تطوير على حجم المراكز والمقرات الأمنية في المدينة. - الجزء الكبير من حدود مدينة يطا الإدارية (يطا والمسافر) تقع ضمن أراضي C ويصعب الوصول إليها وخدمتها. - غياب خطط الطوارئ و المراكز المؤهلة لإدارة الكوارث	- تحويل مركز الدفاع المدني إلى مديرية ومركز إسناد بكامل المعدات والطواقم. - تحويل مركز الشرطة إلى مديرية بكامل المعدات والطواقم. - تشطيب وتشغيل مركز الهلال الأحمر إلى مركز صحي مع زيادة عدد سيارات الإسعاف.	محدودية أعداد الشرطة، وضعف مركز الدفاع المدني، وضعف خطط الطوارئ، والمعدات الخاصة بالطوارئ

المجال الفرعي	خلفية مختصرة	المؤثرات الإيجابية	المؤثرات السلبية	الاحتياجات	القضية
	وتجمعاتها بالإضافة إلى منطقة الفوار والريحية، ويمتلك سيارتي إسعاف فقط، لا تكفي حاجة المدينة، مما يضطر في حالات كثيرة إلى استدعاء أقرب سيارة إسعاف من البلدات والمدن المجاورة، وطاقم المركز يتألف من 6 ضباط و 10 متطوعين، وتفتقر المدينة لمركز شامل ومؤهل للهلل الأحمر، ما فيه من عيادات وطواقم طبية وسيارات إسعاف، حاليا تم الانتهاء من بناء مركز خاص لجمعية الهلال الأحمر بانتظار التشطيب والتأثيث. أما العلاقات الاجتماعية وما ينتج عنها من خلافات وصراعات، فهنا يوجد لجان الإصلاح والعرف العشائري الفاعلة (لجنة عشائر يطا)، التي تقوم بمساندة الأجهزة الأمنية ومحكمة الصلح في حل المشاكل والخلافات، ويمكن القول أن لها فاعلية وقوة أكبر من الطرق القانونية والمحاكم، وهذا ما ينطبق على منطقة الجنوب والخليل بشكل عام.				
الحوكمة	سعت بلدية يطا منذ عام 2012 وبالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية، على رفع كفاءة العمل والأداء من خلال صياغة خطط لتطوير الأداء المؤسسي، بالاعتماد على مؤشرات علمية لقياس الأداء، يتم تقييمها بالمشاركة، وتتضمن الخطة	- تعاون مستمر و تبادل للخبرات بين كافة مؤسسات المدينة. - تقدم البلدية الدعم الإداري والإرشادي لجميع المؤسسات إذا طلب منها، لوجود دائرة مختصة	- ضعف آلية التخطيط الذاتي خصوصا في المؤسسات الأهلية. - تفتقر المؤسسات الأهلية وبعض الحكومية إلى دليل إجراءات وأدلة عمل.	- صياغة خطة تطوير الأداء المؤسسي لكل جهة حكومية و خاصة عاملة في المدينة. - تطوير أدلة الإجراءات	– ضعف الشفافية، وأعمال المساءلة، ونظم الإجراءات، والاطار التكنولوجي، وضعف القدرات التخطيطية.

المجال الفرعي	خلفية مختصرة	المؤثرات الإيجابية	المؤثرات السلبية	الاحتياجات	القضية
	مشاريع يتم تحديثها سنوياً، حيث تم التدخل وتنفيذ العديد منها كمشروع المخطط الهيكلي والتسمية والترقيم وقاعدة المعلومات الجغرافية وغيرها من أدلة عمل و برامج إلكترونية، وتغيب هذه الخطط عن المؤسسات الحكومية والأهلية في المدينة. (خطط تطوير الأداء المؤسسي تعمل على رفع الفعالية في تقديم الخدمة وليس نوع الخدمة فقط).	في الشؤون الإدارية و الشؤون المالية. - تسعى الحكومة إلى تعزيز عملية المأسسة والاعتماد على التكنولوجيا قدر المستطاع في وزاراتها ومديرياتها. - اتجاه المواطن للدفع الإلكتروني وزيادة رضاه عن الخدمات المقدمة إلكترونياً.	- عدم وجود خطة لتطوير الأداء للمؤسسات الموجود في المدينة سواء حكومية أو أهلية. - ضعف تطبيق الشفافية والمساءلة المجتمعية. - افتقاد المدينة لمركز ومبنى للدوائر الحكومية يضم غالبية المؤسسات الحكومية في مكان واحد وللاستغناء عن دفع بدل إيجار للمقرات. - شريحة كبيرة لا تملك الوعي الكافي لسياسة التزامها بالواجبات تجاه المؤسسات من تسديد ديون ومستحقات وغيرها	- تحسين الشفافية والنشر - نظام الكتروني موحد لكافة الدوائر . - بناء وتشطيب مجمع دوائر حكومية في المدينة.	

6.1 جدول القضايا والأهداف والبرامج

الرؤية " :مدينة مركزية مزدهرة وجاذبة"

التسلسلي	المجالات التنموية الرئيسية	القضايا التنموية ذات التنموية	الأهداف التنموية	البرامج التنموية	المكونات الرئيسية لكل برنامج
1	البيئة والبنية المحلية	ضعف البنية التحتية لقطاع الطرق والمواصلات	تطوير البنية التحتية لقطاع الطرق والمواصلات	رفع كفاءة قطاع الطرق والمواصلات	تعبيد 5 مداخل رئيسية بطول 15 كم. تعبيد 30 كم من طرق المدينة الداخلية والرابطة. شق 20 كم من الطرق المقترحة ضمن المخطط الهيكلي موائمة الطرق لذوي الإعاقة حسب المخططات والدراسات استكمال موقف السيارات العمومية تركيب إشارات مرور ضوئية عدد 2 تدريب مهندسي الإشراف ورفع قدراتهم تشغيل 52 خط بيرمت داخلي

التسلسلي	المجالات التنموية الرئيسية	القضايا التنموية ذات التنمية	الأهداف التنموية	البرامج التنموية	المكونات الرئيسية لكل برنامج
2		ضعف جودة خدمات المياه ومقومات الصرف الصحي	تعزيز البنية التحتية ومقومات خدمة المياه والصرف الصحي	تحسين الموارد المائية وتطوير الصرف الصحي وبنيتها التحتية	تنفيذ عدد من الدراسات
					اكتمال المرحلة الأولى من مشروع شبكة مياه يطا
					توفير ورشة فنية متخصصة بالصيانة لقسم المياه في البلدية
					ترتيبوصلات المنزلية وتركيب 5200 عداد مياه مسبق الدفع
					عمل شبكة Master Plan واقعية ومحدثة
					إبرام اتفاقية جديدة مع سلطة المياه لزيادة حصة المدينة
					أعمال توريد و تمديد مواسير للصرف الصحي حسب الأطوال والأقطار في المخططات والدراسات
					أعمال توصيل وربط المنازل على شبكة الصرف الصحي
					اكتمال مشروع سقف السيل الجاري حالياً
					تشغيل وتدريب طاقم محلي
					دراسات بيئية و الواقع المائي وعدد من دراسات الجدوى
					أتمتة المياه والصرف الصحي على برامج سكادا و GIS
3		ضعف جودة التيار الكهربائي	تحسين جودة التيار الكهربائي في المدينة	تعزيز وتنويع مصادر الطاقة وجودتها	توريد وتركيب 23 محطة تقوية
					تمديد 20 كم شبكة ضغط متوسط
					استبدال 3 كم من شبكة الضغط المنخفض الألومنيوم بكوابل معزولة

التسلسلي	المجالات التنمية الرئيسية	القضايا التنموية ذات التنمية	الأهداف التنموية	البرامج التنموية	المكونات الرئيسية لكل برنامج
4					تشغيل وتركيب نقطة ربط جديدة
					تركيب شبكات جهد منخفض ABC بطول 30 كم
					تركيب خلايا شمسية لإنتاج الطاقة البديلة عدد 10 بقدرة إنتاجية مختلفة
					تدريب طواقم الشركة (فنيين وإداريين)
					دراسة حول كمية الكهرباء المطلوبة فعليا وعمل قاعدة بيانات شاملة
					حملات توعية للحد من التعدي على الشبكة وتقليل نسبة الفاقد
	تنمية الاقتصاد المحلي	ضعف البنية التحتية والخدمات المساندة لقطاع الصناعة	خلق بيئة جاذبة للقطاع الصناعي وتحسينه	تنمية الصناعة المحلية ومكوناتها	تأهيل منطقة حرف وصناعات خفيفة
					بناء وتشغيل مصنع لدباغة الجلود
					بناء وتشغيل مصنع للأعلاف والاسمدة
					دعم وتمويل 40 مشروع صغير للفئات المهمشة
					تدريب وتشغيل طاقم محلي
					انشاء حاضنة اعمال
					بناء قدرات الفئات المهمشة ودمجهم في مجال الصناعة الخفيفة
					عمل دراسة وقاعدة بيانات شاملة حول قطاع الصناعة ودراسة جدوي

التسلسلي	المجالات التنمية الرئيسية	القضايا التنموية ذات التنمية	الأهداف التنموية	البرامج التنموية	المكونات الرئيسية لكل برنامج
5		مقومات ومكونات القطاع الزراعي الحالية أقل من حاجة المدينة	النهوض بالقطاع الزراعي في المدينة	تعزيز جودة القطاع الزراعي ومكوناته	تأهيل سوق مواشي نموذجي
					إنشاء سوق خضار مركزي بالشراكة مع القطاع الخاص
					إنشاء مسلخ بلدي مؤهل
					شق 60 كم من الطرق الزراعية
					استصلاح أراضي بمساحة 1000 دونم
					بناء وتشطيب وتشغيل مركز لتحسين السلالات
					إنشاء مشتل متخصص ومؤهل لإنتاج الأشجار بمساحة 3 دونم
					إنشاء 50 بئر جمع مياه و سدود عدد 2
					تدريب وتشغيل طاقم محلي
					تفعيل الجمعيات التعاونية غير النشطة
					عمل قاعدة بيانات حول قطاع الزراعة والثروة الحيوانية
6		ضعف البنية التحتية ومقومات مجال الترفيه والسياحة	تفعيل البنية التحتية لقطاع الترفيه والسياحة الداخلية والنهوض بها	تنمية الترفيه والسياحة المحلية ومكوناتها	اكمال بناء وتشطيب منتزه بلدية يطا في الكرمل
					إنشاء منتزه عام داخل المدينة
					اكمال بناء وتشطيب ستاد بلدية يطا
					ترميم 30% من مباني وساحات البدة القديمة
					تأهيل وترميم وتشطيب بيت ضيافة في البلدة القديمة
					إنشاء وتشغيل مسار سياحي للدراجات الهوائية
					تدريب وتشغيل طاقم محلي
					عمل مسار سياحي يربط تجمعات المدينة

التسلسلي	المجالات التنموية الرئيسية	القضايا التنموية ذات التنمية	الأهداف التنموية	البرامج التنموية	المكونات الرئيسية لكل برنامج
					بناء قدرات الفئات المهمشة ودمجهم في مجال الترفيه والسياحة
					عمل دراسات ارشادية وطباعة المنشورات الإعلانية
					دراسات جدوى
7		عدم كفاية مقومات القطاع التجاري	تطوير مقومات القطاع التجاري	رفع كفاءة القطاع التجاري	بناء وتشطيب مراكز تجارية عدد 2
					انشاء سوق شعبي مؤهل
					تنظيم واجهات المحال التجارية من حيث اللون والأرمام
					موائمة المنشآت التجارية لذوي الاعاقة
					تدريب وتشغيل طاقم محلي
					دراسات جدوى ومسوحات ميدانية
8	مجال التنمية الاجتماعية	عدم كفاية البنية التحتية والخدمات المساندة لقطاع الصحة.	تحسين مستوى وفعالية الخدمات الصحية الحكومية	تعزيز جودة الخدمات الصحية ومكوناتها	بناء وتشطيب وتشغيل أقسام جديدة في المستشفى الحكومي
					بناء وتشطيب وتأهيل مستودع لتخزين الأدوية
					إضافة مبنى للعيادة المركزية
					تأهيل عيادات العروس، تلة الصمود، اعزير

التسلسلي	المجالات التنموية الرئيسية	القضايا التنموية ذات التنمية	الأهداف التنموية	البرامج التنموية	المكونات الرئيسية لكل برنامج
9		ضعف البنية التحتية لقطاع التربية والتعليم العالي	تعزيز وتأهيل مكونات التربية والتعليم العالي وبنيتها التحتية.	رفع كفاءة قطاع التربية والتعليم وبنيتها التحتية	إضافة طابق لمبنى مديرية الصحة - عيادة السلام، وتأهيل المبنى
					تشغيل عيادة رقعة وثلة الصمود بمستوى 3+
					أنظمة محوسبة وأدلة إجراءات وعمل
					تشغيل وتدريب طاقم طبي محلي
					تشغيل عيادة رعاية نفسية للمسنين
					دراسة ومسوحات
					بناء وتشطيب 5 مدارس
					تشطيب و تشغيل 5 مدارس
					صيانة 14 مدرسة
10		عدم كفاية مقومات تقديم الخدمات الاجتماعية وبنيتها التحتية.	تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية والإدماج الاجتماعي للفئات المهمشة	تمكين الفئات المهمشة والخدمات الاجتماعية	بناء قاعة اجتماعات واحتفالات
					بناء وتشطيب وتشغيل مدرسة مهنية وصناعية
					استكمال جزء من المبنى الرئيسي لمشروع جامعة القدس المفتوحة
					موائمة 50% من المدارس القائمة لذوي الإعاقة
					تشغيل موظفي حراسة للمدارس
					استحداث قسم صيانة للمباني المدرسية في مديرية التربية
					بناء وتشطيب مركز لذوي الإعاقة
					تأهيل مقابر عامة عدد 2

التسلسلي	المجالات التنمية الرئيسية	القضايا التنموية ذات التنمية	الأهداف التنموية	البرامج التنموية	المكونات الرئيسية لكل برنامج
11		ضعف الاهتمام بقطاع التراث والثقافة ومكوناتها المختلفة	تطوير مكونات وأركان قطاع التراث والثقافة والحفاظ عليها	تعزيز وتطوير قطاع التراث والثقافة ومقوماته	زيادة عدد الأسر المشمولة بدعم التنمية الاجتماعية
					بناء مقر للمديريات والمؤسسات الحكومية في المدينة
					زيادة نسبة توظيف ذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع لتصل 5%
					برامج دمج ذوي الإعاقة في المجتمع
					برامج تمكين للأسر المعيلة للفئات المهمشة
					عمل نشرات و ندوات حول توعية المرأة والطفل وتمكينهم.
					ترميم 15 مبنى في البلدة القديمة
12	الإدارة والحكم الرشد	ضعف مقومات قطاع الأمن والسلامة العامة وإدارة الكوارث	النهوض بواقع الأمن والأمان والسلامة العامة في المدينة	تطوير وتأهيل المؤسسات ذات الصلة بقطاع الأمن والسلامة العامة وإدارة الكوارث	ترميم وقائي ل 80 مبنى قديم
					بناء وتشطيب مركز ثقافي عام
					عمل خريطة ويافطات بالأماكن السياحية التراثية
					برامج توعية للحفاظ على المباني القديمة والمناطق الأثرية
					تدريب كوادر محلية
					عمل نشرات و ندوات توعوية، ودراسات جدوى
					تشطيب مقر الهلال الأحمر وتشغيله
					إنشاء مركز إسناد للدفاع المدني مؤهل بشكل مناسب
					تحويل مركز شرطة بطا إلى مديرية مع

التسلسلي	المجالات التنموية الرئيسية	القضايا التنموية ذات التنموية	الأهداف التنموية	البرامج التنموية	المكونات الرئيسية لكل برنامج
13		قصور نظام التخطيط والتنظيم وتطبيقه في المدينة	تعزيز نظام التخطيط والتنظيم والإزامية تطبيقه	رفع كفاءة التخطيط والتنظيم العمراني	الطاقم والآليات المطلوبة
					دراسة تحديد الاحتياج دراسة جدوى
					اكمال مشروع تسوية وتسجيل الأراضي
					تحديث المخطط الهيكلي الحالي
					انشاء محكمة بلديات خاصة بمدينة يطا
					تدريب الكوادر التابعة لدائرة الهندسة والأراضي
					دراسة تحديد الاحتياج ومسوحات ميدانية

القضايا المذكورة بالجدول وعددها 13 قضية تم اختيارها من قبل اللجان والمجتمع المحلي والفائزة بالتصويت، أما القضايا المتعلقة بالحوكمة والنفائات والبيئة والشباب والرياضة فهي لم تحصل على النسبة المطلوبة من التصويت وسيتم العمل معها بصورة غير مركزة في عمر الخطة الحالية، على أن نحشد لها الدعم المطلوب لتفوز بالأولويات خلال الخطة التنموية القادمة 2027-2030.

6.2 ملخص ارتباط التشخيص بقطاعات التكيف مع المناخ وتحليل القضايا وأثرها من منظور التكيف مع التغير المناخي

ارتباط التشخيص بقطاعات التكيف مع المناخ

التكيف مع تغير المناخ أصبح عنصراً روتينياً وضرورياً للتخطيط على جميع المستويات. إن التخطيط الوطني للتكيف يمكنه تمكين جميع الأطراف على تقييم مواطن الضعف لديها، و تعميم مخاطر تغير المناخ ومعالجة التكيف. ويمكن الإشارة إلى أن أهم الأهداف المتفق عليها لعملية خطة التكيف الوطنية هي:

- الحد من قابلية التعرض لآثار تغير المناخ، من خلال بناء القدرة على التكيف والمرونة. والتي سترتبط بطريقة أو بأخرى بمشاريع تنفذ لهذا الغرض.
- تيسير إدماج التكيف مع تغير المناخ بطريقة متماسكة في سياسات و برامج و أنشطة جديدة وقائمة، لا سيما في عمليات واستراتيجيات التخطيط التنموي، بجميع القطاعات ذات الصلة وعلى مختلف المستويات، حسب الحاجة.

عمد القائمين على إعداد الخطة التنموية للبلدات على ادماج الخبراء و/أو المهتمون بمختلف قطاعات التكيف مع المناخ والبيئة ضمن أعضاء فريق التخطيط من مجالات ذات علاقة، حيث عمل فريق التخطيط على تشخيص نقاط الضعف والمخاطر والجوانب التي تعتبر ضعيفة في المجالات التنموية المختلفة والمرتبطة بشكل مباشر بالتغير المناخي واثاره، والتي انعكست على المشاريع و/أو الأنشطة المنبقة عن هذه الخطة حسب الأولويات وتوفر التمويل.

الجدول التالي يوضح تحليل القضايا وأثرها من منظور التكيف مع التغير المناخي فقط والقضايا الأخرى مدرجة في جداول أخرى في الخطة.

التسلسلي	المجالات التنموية الرئيسية	القضايا التنموية ذات التنمية	جذور أسباب القضية	أثر القضية السلي في حال عدم التعامل معها وخاصة على النوع الاجتماعي والبيئة والتغير المناخي	أثر القضية الايجابي في حال التعامل معها وخاصة على النوع الاجتماعي والبيئة والتغير المناخي
1	البيئة والبنية المحلية	ضعف البنية التحتية لقطاع الطرق والمواصلات	محدودية الموارد المادية المخصصة للبنية التحتية. التحديات على المساحات المخصصة للطرق	ضعف الاطار للتبادل التجاري وبالتالي ارتفاع نسب البطالة والفقر خاصة في أوساط النساء والشباب. ضعف السياحة، وعليه محدودية التبادل الثقافي والانفتاح على المجتمعات المحيطة وعليه زيادة نسبة العنف. محدودية في قدرة النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة على التنقل الآمن	تطور الوضع الاقتصادي وانخفاض نسبة البطالة والفقر . تطور الانفتاح على المجتمعات المحلية المختلفة، وبالتالي انخفاض نسب العنف، خاصة الموجه على أساس النوع الاجتماعي. تيسير قدرة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، على الحركة وتنقل.
		ضعف جودة خدمات المياه ومقومات الصرف الصحي	محدودية السيطرة على مصادر المياه. ارتفاع أسعار المياه وتضاؤل حصة الفرد. تهالك الشبكات الخاصة بالمياه	هجران الزراعة وأعمال البستنة، وبالتالي تأثر التنوع الحيوي، وتزايد الانكشاف لمخاطر الأمن الغذائي خاصة للأسر التي تعيلها نساء أو أشخاص من ذوي وذوات الإعاقة. زيادة التصحر، وتآكل البيئة الخضراء . تضاؤل البيئة النظيفة تفاقم التلوث البيئي وانتشار الأمراض تفاقم تلوث التربة	تحسن مستوى البيئة الخضراء . تعزيز الأمن الغذائي نتيجة لازدهار الزراعة، والبستنة تطور مستوى الصحة العامة، ومستوى النظافة. الحفاظ على البيئة النظيفة. الحد من انتشار الأمراض والأوبئة. الحد من أضرار القوارض والحشرات على المزروعات وصحة الإنسان
3		ضعف جودة التيار الكهربائي	محدودية واردات الطاقة محدودية السيطرة على موارد الطاقة	ارتفاع أسعار الكهرباء، والمصروفات الخاصة بالصيانة	تيسير قدرة الأسر الفقيرة على الحصول على التدفئة، وبالتالي ازدهار الصحة العامة

التسلسلي	المجالات التنموية الرئيسية	القضايا التنموية ذات التنمية	جذور أسباب القضية	أثر القضية السلي في حال عدم التعامل معها وخاصة على النوع الاجتماعي والبيئة والتغير المناخي	أثر القضية الايجابي في حال التعامل معها وخاصة على النوع الاجتماعي والبيئة والتغير المناخي
4				محدودية الانتفاع من التدفئة والضرر المتحقق على صحة الأطفال والنساء الحوامل، وذوي الإعاقة، وكبار وكبيرات السن الاستعاضة عنها بالأخشاب، وبالتالي الاسهام نزع التنوع الحيوي. ضعف قدرة الفئات الأكثر فقراً من الوصول الى الطاقة للتدفئة	تعزيز شراكة صغار المستثمرين/ات، والمبادرين/ات، للاستثمار في الصناعة والمشاريع الناشئة. الحفاظ على الغلاف الأخضر.
		مقومات ومكونات القطاع الزراعي الحالية أقل من حاجة المدينة	النقص الحاد في مصادر المياه. ازدياد التصحر. التلوث الحاصر على مساحات واسعة جداً من أرض يطا نتيجة وجود سيل المياه العادمة بمواصفات سيئة	غلاء أسعار السلع الزراعية. ازدياد حدة المخاطر على الامن الغذائي تراجع شراكة المرأة في عملية الإنتاج	انخفاض أسعار السلع. ارتفاع مساهمة المرأة في الإنتاج، وبالتالي الناتج المحلي. الحد من التلوث البيئي
		ضعف البنية التحتية ومقومات مجال الترفيه والسياحة	ضعف الرواية بشأن الأماكن التراثية والتاريخية في المدينة. بنية تحتية غير مناسبة للاستثمار السياحي.	نقص المساحات التفاعلية خاصة للشباب، والمرأة وذوي الإعاقة. تراجع الانفتاح على الثقافات وبالتالي زيادة العنف، والعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي. تراجع شراكة المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة في الاقتصاد المبني على السياحة.	تزايد المساحات التفاعلية المدنية . تراجع نسب العنف، خاصة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي. تزايد شراكة المرأة في الاقتصاد السياحي. تعزز فرص الأشخاص ذوي/ات الإعاقة في فرص العمل.

التسلسلي	المجالات التنموية الرئيسية	القضايا التنموية ذات التنمية	جذور أسباب القضية	أثر القضية السلي في حال عدم التعامل معها وخاصة على النوع الاجتماعي والبيئة والتغير المناخي	أثر القضية الايجابي في حال التعامل معها وخاصة على النوع الاجتماعي والبيئة والتغير المناخي
7		ضعف القطاع التجاري، والاطر المساندة له	ضعف الطرق، والمواصلات والبنية التحتية الخاصة بها. ضعف التسويق للأماكن التراثية والتاريخية. ضعف المنتج المحلي	ضعف شراكة النساء في عمليات الإنتاج المختلفة. ضعف الاهتمام بالجوانب الخدمية في أسواق المدينة ومناسبتها للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار وكبيرات السن والأطفال، والنساء سيما الحوامل منهن	ازدياد شراكة المرأة في الانتاجيات المحلية تطوير الاهتمام بالمظهر الجمالي للأسواق. تطور الاستجابة لاحتياجات الفئات الضعيفة في أسواق المدينة.
8	مجال التنمية الاجتماعية	عدم كفاية البنية التحتية والخدمات المساندة لقطاع الصحة.	الافتراض القائم بأن الصحة هي مسؤولية مركزية للدولة "وزارة الصحة"، أو القطاع الخاص. محدودية شراكة المجتمع المدني. ضعف خدمات الصحة النفسية. ضعف الخدمات الاختصاصية	تراكم الصعوبات المتعلقة بقدرة الفئات الضعيفة للوصول للخدمات الصحية للمواطنين، خاصة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة. تحول الأشخاص ذوي الإعاقة الى مسؤولية ثقيلة على عائلاتهم وبالتالي، انعزالهم عن المجتمع	تيسير قدرة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات الطبية. تحسن الصحة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء. سهولة ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
9		ضعف البنية التحتية لقطاع التربية والتعليم العالي	ضعف الموارد المالية الخاصة بتشغيل المدارس. محدودية غرف المصادر محدودية مسارات التربية الخاصة	مع ازدياد أعداد السكان وازدياد الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن المتاح من المدارس ببرامجها التقليدية تصعب من تحقق الحق في التعلم للجميع.	ازدياد فرص تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة. ازدياد فرص تعليم الفتيات. تخفيف الأعباء على الاسر التي تعيلها النساء.

التسلسلي	المجالات التنموية الرئيسية	القضايا التنموية ذات التنموية	جذور أسباب القضية	أثر القضية السلي في حال عدم التعامل معها وخاصة على النوع الاجتماعي والبيئة والتغير المناخي	أثر القضية الايجابي في حال التعامل معها وخاصة على النوع الاجتماعي والبيئة والتغير المناخي
10		عدم كفاية مقومات تقديم الخدمات الاجتماعية وبنيتها التحتية.	الاعتقاد المجتمعي بأن التمكين الاجتماعي هو من خلال الدعم المادي فقط. ضعف المساحات التفاعلية والمدنية في المدينة. محدودية المؤسسات النسوية وبرامج تمكين المرأة	تكبد الفئات الضعيفة خاصة من الاسر التي تكتنف على أشخاص ذوي إعاقة صعوبات كبيرة لتمكينهم من الحصول على فرص التعليم. تقع الصعوبات أكثر على النساء بوصفهن أكثر انخراطا في الفضاء الخاص من الرجال.	تخفيف أعباء الاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. تطور الحق في اللعب. تخصير ساحات المرافق التعليمية والحفاظ على بيئتها.
11		ضعف الاهتمام بقطاع التراث والثقافة ومكوناتها المختلفة	ضعف الموارد المالية الخاصة بالترميم، واحياء المواقع التراثية	تراجع قطاع السياحة. تراجع الانفتاح على الثقافات المحلية. تراجع شراكة النساء في سوق العمل السياحي	ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في صناعة القرار. تراجع العنف على أساس النوع الاجتماعي ارتفاع شراكة النساء في سوق العمل تعزز فرص ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

التسلسلي	المجالات التنموية الرئيسية	القضايا التنموية ذات التنمية	جذور أسباب القضية	أثر القضية السلي في حال عدم التعامل معها وخاصة على النوع الاجتماعي والبيئة والتغير المناخي	أثر القضية الايجابي في حال التعامل معها وخاصة على النوع الاجتماعي والبيئة والتغير المناخي
					تعزيز فرص الاقتصاد الاخضر
12	الإدارة والحكم الرشيد	ضعف مقومات قطاع الأمن والسلامة العامة وإدارة الكوارث	نقص أعداد الشرطة في المدينة. تفاقم العنف ضعف ثقافة الانضباط للقانون. محدودية الموارد المالية المخصصة للسلامة العامة، وإدارة الكوارث.	تدني مستوى الأمان العام في المدينة تزايد العنف المنزلي، والعنف على أساس النوع الاجتماعي. تردد فرص انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في الفضاء العام التعدي على الملكيات العامة، والمساحات الخضراء.	زيادة مستوى الأمان وبالتالي ارتفاع مستوى شراكة النساء. تطور مستوى الأمان وبالتالي زيادة انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في الفضاء العام. انخفاض مستوى العنف والتتمر ضد فتيات والأشخاص ذوي الإعاقة.
13		قصور نظام التخطيط والتنظيم وتطبيقه في المدينة	ضعف القدرات المؤسسية. ضعف قدرات الكادر الوظيفي. محدودية الأدلة التنظيمية و الإجرائية.	محدودية الاستجابة لاحتياجات الفئات الضعيفة. محدودية مواءمة الخدمات والبرامج لاحتياجات النساء، والأشخاص ذوي الاعاقة. صعوبة الوصول الى التغذية العكسية من الفئات الضعيفة	ارتفاع نسبة الاستجابة لاحتياجات الفئات الضعيفة. تطور اشراك المجتمع المحلي في نظم صناعة القرار، سيما الفئات الضعيفة. تعزيز الاستجابة والاستعدادية للتقلبات المناخية.

7.1 خطة التنفيذ (رباعية) اربع سنوات

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج*	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج/ المشروع حسب توفر التمويل	الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط			
						الصرف السنوي					الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/الشريك		
						2023	2024	2025	2026						مضمون	محتمل
البيئة والبنية التحتية	رفع كفاءة قطاع الطرق والمواصلات	EI/01	تعبيد 5 مداخل رئيسية بطول 15 كم.	EI/1/1	6,000	2,000	2,000	1,000	1,000	□	□	دائرة المشاريع	استشاري إداري	مشاريع	500	5,500
			تعبيد 30 كم من طرق المدينة الداخلية والرابطة.	EI/01/2	4,500	1,000	1,500	1,000	1,000	□	□	دائرة المشاريع	استشاري إداري	مشاريع	500	4,000
			شق 20 كم من الطرق المقترحة ضمن الهيكل	EI/1/3	500	50	150	150	150	□	□	دائرة المشاريع	-	مشاريع	50	450
			موائمة الطرق لذوي الإعاقة حسب المخططات والدراسات	EI/1/4	60	10	20	20	10	□	□	دائرة المشاريع	-	مشاريع	60	0
			استكمال موقف السيارات العمومية	EI/1/5	300	0	300	0	0	0	□	□	دائرة المشاريع	-	مشاريع	300

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج/ المشروع حسب توفر التمويل	الجهة المرشحة للتنفيذ			الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط					
						الصرف السنوي					الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/ الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		
						2023	2024	2025	2026										
						2023	2024	2025	2026	مضمون	محتمل	متمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة
			تركيب إشارات مرور ضوئية عدد 2	EI/1/6	300	300							دائرة المشاريع	استشاري ومديرية الترخيص	إداري	مشاريع	300	-	0
البيئة والبنية التحتية	رفع كفاءة قطاع الطرق والمواصلات	EI/01	تدريب مهندسي الإشراف ورفع قدراتهم	EI/1/7	20	5	5	5	5				-	استشاري	إداري	تشغيلية	10	جهات مانحة	10
			تشغيل 52 خط بيرمت داخلي	EI/1/8	300	0	300	0	0		-	وزارة المواصلات	إدارة و متابعة	-	0	وزارة المواصلات	300		
			دراسات وبيانات	EI/1/9	20	5	5	5	5		دائرة المشاريع	استشاري	إداري	تشغيلية	10	جهات مانحة	10		
			مجموع برنامج رفع كفاءة الطرق والمواصلات				3,070	4,280	2,180	2,170								1,730	
البيئة والبنية التحتية	تحسين الموارد المائية وتطوير الصرف الصحي وبنيتهما التحتية	EI/02	اكمال المرحلة الأولى من مشروع شبكة مياه بطا	EI/2/1	6,300	4,000	2,300	0	0				قسم المياه	استشاري	إداري	مشاريع	100	جهات مانحة	6,200
			توفير ورشة فنية متخصصة بالصيانة لقسم المياه في البلدية	EI/2/2	300	0	300	0	0					قسم المياه	-	-	تشغيلية	50	جهات مانحة

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج/ المشروع حسب توفر التمويل	الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط			
						الصراف السنوي					غير الهيئة المحلية/ الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/ الشريك	
2023	2024	2025	2026	مضمون	محتمل	متمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	غير الهيئة المحلية/الشريك	قيمة المساهمة			
200	600	100	100	□			قسم المياه	-	-	تشغيلية	300	جهات مانحة	700			
0	50	0	0	□			قسم المياه	-	-	-	0	جهات مانحة	50			
0	10	0	0	□			الإدارة			تشغيلية	10	-	0			
250	1,000	750	0	□	□		-	استشاري شركة مقاولات	تنفيذ و متابعة	مشاريع	100	جهات مانحة	1,900			

المجال التنموي	اسم البرنامج	نوع البرنامج *	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج/ المشروع حسب توفر التمويل	الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط			
						الصراف السنوي					الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/ الشريك	الهيئة المحلية			
						2023	2024	2025	2026				حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة
			أعمال توصيل وربط المنازل على شبكة الصرف الصحي	EI/2/7	500	0	200	150	150	□	قسم المياه	-	تشغيلية ومشاريع	400	جهات مانحة	100
			اكمال مشروع سقف السيل الجاري حاليا	EI/2/8	2,000	2,000	0	0	0	□		استشاري شركة مقاولات	تنفيذ و متابعة	-	جهات مانحة	2,000
			تشغيل وتدريب طاقم محلي	EI/2/9	300	100	150	50	0	□	الإدارة	استشاري	تدريب	تشغيلية	جهات مانحة	150
			دراسات بيئية و واقع مائي وجدوى	EI/2/10	120	45	35	20	20	□	قسم المياه	استشاري	تدريب	تشغيلية	جهات مانحة	75
			أتمتة المياه والصرف الصحي على برامج سكادا و GIS	EI/2/11	120	30	30	30	30	□	قسم المياه	استشاري	تنفيذ	تطويرية	جهات مانحة	90
			تحسين الموارد المائية وتطوير الصرف الصحي وبنيتها التحتية		12,700	6,625	4,675	1,100	300							11,515

المجال التمويلي	اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج/ المشروع حسب توفر التمويل	الجهة المرشحة للتنفيذ			الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمنة والمحتملة فقط				
						الصرف السنوي					الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/ الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/ الشريك	
2023	2024	2025	2026	مضمون	محتمل	متمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/ الشريك					
250	250	250	250	□	□		-	SELCO	تنفيذ و اشراف	-	0	Selco جهات مانحة	1,000					
100	200	200	200	□	□		-	SELCO	تنفيذ و اشراف	-	0	Selco جهات مانحة	700					
50	50	0	0	□			-	SELCO	تنفيذ و اشراف	-	0	Selco جهات مانحة	100					
0	50	0	0	□	□		-	SELCO	تنفيذ و اشراف	-	0	Selco	50					
100	300	300	300	□	□		-	SELCO	تنفيذ و اشراف	-	0	Selco جهات مانحة	1,000					

المجال التنموي	اسم البرنامج	نوع البرنامج *	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم مكون البرنامج / المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج / المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج /المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				
						الصرف السنوي													
						2023	2024	2025	2026	مضمون	محتمل	متمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة
			تركيب خلايا شمسية لإنتاج الطاقة البديلة عدد 10 بقدره إنتاجية مختلفة	EI/3/6	2,000	250	750	750	250	□	□		-	SELCO	تنفيذ و اشراف	-	0	Selco قطاع خاص	2,000
			تدريب طواقم الشركة (فنيين واداريين)	EI/3/7	50	10	10	15	15		-	SELCO	تنفيذ و اشراف	-	0	Selco جهات مانحة	50		
			دراسة حول كمية الكهرباء المطلوبة فعليا وعمل قاعدة بيانات شاملة	EI/3/8	25	5	5	10		-	SELCO	تنفيذ و اشراف	-	0	Selco جهات مانحة	25			
			حملات توعية للحد من التعدي على الشبكة وتقليل نسبة الفاقد	EI/3/9	50	10	15	10		-	SELCO	تنفيذ و اشراف	-	0	Selco	50			
تعزيز وتنويع مصادر الطاقة وجودتها					4,975	775	1,630	1,530	1,040								0		4,975
مجموع مجال البيئة والبنية التحتية					29,675	10,470	10,585	4,810	3,510								2,915		26,760

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج/ المشروع حسب توفر التمويل	الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمنة والمحتملة فقط			
						الصرف السنوي					الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/ الشريك	الهيئة المحلية			
						2023	2024	2025	2026				حدد القسم المعني	اسم الجهة دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة
تنمية الاقتصاد المحلي	تنمية الصناعة المحلية ومكوناتها	EC/01	تأهيل منطقة حرف وصناعات خفيفة	EC/1/1	1,000	1,000				□	الهندسة المشاريع	استشاري	مشاريع	200	جهات مانحة قطاع خاص	800
			بناء وتشغيل مصنع لدباغة الجلود	EC/1/2	500	500				□	الهندسة المشاريع	استشاري	مشاريع	100	جهات مانحة قطاع خاص	400
			بناء وتشغيل مصنع للأعلاف والاسمدة	EC/1/3	500	500				□	الهندسة المشاريع	استشاري	مشاريع	100	جهات مانحة قطاع خاص	400
			دعم وتمويل 40 مشروع صغير للفئات المهمشة	EC/1/4	200	25	50	50	75	□	التنمية الاقتصادية	استشاري	-	0	جهات مانحة	200
			تدريب وتشغيل طاقم محلي	EC/1/5	60	15	15	15	15	□	التنمية الاقتصادية	استشاري	-	0	جهات مانحة	60
	تنمية الصناعة المحلية	EC/01	انشاء حاضنة اعمال	EC/1/6	50	0	0	50	0	□	التنمية الاقتصادية	استشاري	-	0	جهات مانحة	50

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج/ المشروع حسب توفر التمويل	الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط					
						الصراف السنوي					الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/ الشريك		الهيئة المحلية			
						2023	2024	2025	2026		حدد القسم المعني	اسم الجهة دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة قيمة المساهمة	غير الهيئة المحلية/الشريك		
	ومكوناتها	EC/1/7	بناء قدرات الفئات المهمشة ودمجهم في مجال الصناعة الخفيفة	100	25	25	25	25	□	□		التنمية الاقتصادية	استشاري	اشراف تنفيذ	-	0	جهات مانحة	100
			عمل دراسة وقاعدة بيانات شاملة حول قطاع الصناعة ودراسة جدوي	40	10	10	10	10	10	□			التنمية الاقتصادية	استشاري	اشراف تنفيذ	تطويرية	20	جهات مانحة
تنمية الصناعة المحلية ومكوناتها						2,450	75	100	150	125						420		2,030
تنمية الاقتصاد المحلي	تعزيز جودة القطاع الزراعي ومكوناته	EC/02	تأهيل سوق مواشي نموذجي	650	200	450	0	0	0	□			المشاريع	استشاري	تخطيط اشراف	200	جهات مانحة وقطاع خاص	450
			إنشاء سوق خضار مركزي بالشراكة مع القطاع الخاص	860	500	360	0	0	0	□			التنمية الاقتصادية	قطاع خاص	تمويل وتنفيذ	مشاريع	100	قطاع خاص

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج/ المشروع حسب توفر التمويل	الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرنامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط						
						الصرف السنوي					الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/ الشريك	الهيئة المحلية						
						2023	2024	2025	2026				حدد القسم المعني	اسم الجهة دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	غير الهيئة المحلية/الشريك	حدد القيمة المساهمة	
تنمية الاقتصاد	تعزيز جودة القطاع الزراعي ومكوناته	EC/02	انشاء مشتل متخصص ومؤهل لإنتاج الأشتال بمساحة 3 دونم	EC/2/7	300	0	150	150	0			استشاري	-	0	جهات مانحة وزارة الزراعة	300			
			بناء وتشطيب وتشغيل مركز لتحسين السلالات	EC/2/6	1,000	1,000							-	استشاري	تخطيط وتنفيذ	-	0	جهات مانحة وزارة الزراعة	1,000
				EC/2/5	1,000	250	250	250	250				-	مقاول و جمعيات زراعية	تخطيط اشرف	-	0	جهات مانحة وزارة الزراعة	1,000
				EC/2/4	1,000	100	300	300	300				استشاري	تخطيط اشرف	مشاريع	50	جهات مانحة وزارة الزراعة	950	
			انشاء مسلخ بلدي مؤهل	EC/2/3	2,700	1,000	1,000	700	0			المشاريع	استشاري	تخطيط اشرف	مشاريع	500	جهات مانحة وقطاع خاص	2,200	

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج/ المشروع حسب توفر التمويل	الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط						
						الصراف السنوي					الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/ الشريك	الهيئة المحلية						
						2023	2024	2025	2026				حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	غير الهيئة المحلية/الشريك	
						700	100	200	200	200			-	تخطيط وتنفيذ	-	0	جهات مانحة وزارة الزراعة	700	
						150	20	50	50	30			-	تخطيط وتنفيذ	-	0	جهات مانحة وزارة الزراعة	150	
						50	20	10	10	10			-	وزارة الزراعة	اشراف	-	0	وزارة الزراعة	50
تنمية الاقتصاد المحلي	تعزيز جودة القطاع الزراعي ومكوناته	EC/02	عمل قاعدة بيانات حول قطاع الزراعة والثروة الحيوانية	EC/2/11	300	50	75	75	100				-	وزارة الزراعة	اشراف	-	0	وزارة الزراعة	300
					8,710	2,240	2,845	1,735	890								850		7,860

تعزيز القطاع الزراعي ومكوناته

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج/ المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط		
						الصرف السنوي											
						2023	2024	2025	2026	مضمون	محتمل	متمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	الهيئة المحلية
تنمية الترفيه و السياحة المحلية ومكوناتها	EC/03	EC/03	اكمال بناء وتشطيب متنزه بلدية يطا في الكرمل	1,000	0	600	200	□	□		دائرة المشاريع	استشاري	اشراف و تخطيط	المشاريع	250	750	
			انشاء متنزه عام داخل المدينة	1,500	1,500						□	دائرة المشاريع	استشاري	اشراف و تخطيط	المشاريع	250	1,250
			اكمال بناء وتشطيب ستاد بلدية يطا	2,000	200	500	800	500	□	□		دائرة المشاريع	استشاري	اشراف و تخطيط	المشاريع	500	1,500
			ترميم 30% من مباني وساحات البدة القديمة	600	50	200	200	150	□			دائرة الهندسة	استشاري رواق	اشراف و تخطيط	التطويرية	100	500
			تأهيل وترميم وتشطيب بيت ضيافة في البلدة القديمة	100	0	100	0	0	□			دائرة الهندسة	استشاري رواق	اشراف و تخطيط	التطويرية	30	70

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم مكون البرنامج / المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج / المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ			الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				
						الصرف السنوي							الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/ الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/ الشريك	
						2023	2024	2025	2026	مضمون	محتمل	متمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	
تنمية الاقتصاد المحلي	تنمية الترفيه و السياحة المحلية ومكوناتها	EC/03	انشاء وتشغيل مسار سياحي للدراجات الهوائية	EC/3/6	500	0	250	250	0				دائرة المشاريع	استشاري	اشراف و تخطيط	المشاريع	50	جهات مانحة	450	
			تدريب وتشغيل طاقم محلي	EC/3/7	50	10	10	20	10	10				الإدارة	استشاري	تنفيذ	التشغيلية	10	جهات مانحة وقطاع خاص	40
			عمل مسار سياحي يربط تجمعات المدينة	EC/3/8	150	0	50	50	50	50				التنمية الاقتصادية	استشاري	تنفيذ و اشراف	التطويرية	50	جهات مانحة وقطاع خاص	100
			بناء قدرات الفئات المهمشة ودمجهم في مجال الترفيه والسياحة	EC/3/9	50	10	15	15	10	10				التنمية الاقتصادية	استشاري	تنفيذ و اشراف	التطويرية	10	جهات مانحة	40
			عمل دراسات ارشادية وطباعة المنشورات الإعلانية	EC/3/10	80	20	20	20	20	20				التنمية الاقتصادية	استشاري	تنفيذ و اشراف	التطويرية	20	جهات مانحة	60

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج/ المشروع حسب توفر التمويل	الجهة المرشحة للتنفيذ			الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط					
						الصراف السنوي					الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/ الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/ الشريك		
						2023	2024	2025	2026		حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة		
			مواثمة المنشآت التجارية لذوي الاعاقة	EC/4/5	300	50	100	50	100	□	□		التنمية الاقتصادية	قطاع خاص	تنفيذ و اشراف	-	0	قطاع خاص	300
			تدريب وتشغيل طاقم محلي	EC/4/6	50	5	15	15	15		□		التنمية الاقتصادية	قطاع خاص	تنفيذ و اشراف	-	0	قطاع خاص	50
			دراسات جدوى ومسوحات ميدانية	EC/4/7	50	5	15	15	15		□		التنمية الاقتصادية	قطاع خاص	تنفيذ و اشراف	-	0	قطاع خاص	50
مجموع رفع كفاءة القطاع التجاري					5,200	1,060	1,430	1,280	1,430								250		4,950
مجموع مجال التنمية الاقتصادية المحلية					22,440	3,675	6,150	4,720	3,395								2,800		19,640
التنمية الاجتماعية	تعزيز جودة الخدمات الصحية ومكوناتها	SO/01	بناء وتشطيب وتشغيل أقسام جديدة في المستشفى الحكومي	SO/1/1	3,000	1,800	500	500	200	□			-	استشاري	تنفيذ و اشراف	-	0	الحكومة وجهات مانحة	3,000
			بناء وتشطيب وتأهيل مستودع لتخزين الأدوية	SO/1/2	500	500	500				□			-	استشاري	تنفيذ و اشراف	-	0	الحكومة وجهات مانحة

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم مكون البرنامج / المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج / المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ			الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط			
						الصرف السنوي							الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك
						2023	2024	2025	2026	مضمون	محتمل	متمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة
			إضافة مبنى للعيادة المركزية	SO/1/3	350	100	250	0				-	استشاري	تنفيذ و اشراف	-	0	الحكومة ومجتمع محلي	350	
			تأهيل عيادات العروس، تلة الصمود، اعزيز	SO/1/4	450	100	200	100	50			-	استشاري	تنفيذ و اشراف	-	0	الحكومة ومجتمع محلي	450	
			إضافة طابق لمبنى مديريةية الصحة – عيادة السلام، وتأهيل المبنى	SO/1/5	450	200	250	0	0			-	مجتمع محلي	تنفيذ و اشراف	-	0	الحكومة ومجتمع محلي	450	
			تشغيل عيادة رقعة وتلة الصمود بمستوى 3+	SO/1/6	100	50	50	0	0			-	وزارة الصحة	تنفيذ و اشراف	-	0	الحكومة	100	
التنمية الاجتماعية	تعزيز جودة الخدمات الصحية ومكوناتها	SO/01	أنظمة محوسبة وأدلة اجراءات وعمل	SO/1/7	50	5	15	15	15			-	وزارة الصحة	تنفيذ و اشراف	-	0	الحكومة	50	
			تشغيل وتدريب طاقم طبي محلي	SO/1/8	50	10	10	15	15			-	وزارة الصحة	تنفيذ و اشراف	-	0	الحكومة	50	

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج/ المشروع حسب توفر التمويل	الجهة المرشحة للتنفيذ			الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط					
						الصراف السنوي					الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/ الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/ الشريك		
						2023	2024	2025	2026		مضمون	محتمل	تمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة
			تشغيل عيادة رعاية نفسية للمسنين	SO/1/9	150	50	100	0	0				-	وزارة الصحة	تنفيذ و اشراف	-	0	الحكومة وجهات مانحة	150
			دراسة ومسوحات	SO/1/10	50	5	15	15	15				-	وزارة الصحة	تنفيذ و اشراف	-	0	الحكومة	50
مجموع تعزيز جودة الخدمات الصحية ومكوناتها																			
التنمية الاجتماعية	رفع كفاءة قطاع التربية والتعليم وبنيته التحتية	SO/02	بناء وتشطيب 5 مدارس	SO/2/1	7,500	1,000	2,000	2,500	2,000				-	استشاري و مقاول	تنفيذ و اشراف	-	0	الحكومة جهات مانحة والمجتمع المحلي	7,500
			تشطيب و تشغيل 5 مدارس	SO/2/2	2,000	500	500	500	500				-	استشاري و مقاول	تنفيذ و اشراف	-	0	الحكومة جهات مانحة	2,000
			صيانة 14 مدرسة	SO/2/3	750	150	150	200	250				-	استشاري و مقاول	تنفيذ و اشراف	-	0	الحكومة جهات مانحة	750

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج/ المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط					
						الصرف السنوي														
						2023	2024	2025	2026	مضمون	محتمل	متمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/ الشريك	
			بناء قاعة اجتماعات واحتفالات	SO/2/4	500	500							□	-	استشاري و مقاول	تنفيذ و اشراف	-	0	الحكومة جهات مانحة	500
			بناء وتشطيب وتشغيل مدرسة مهنية وصناعية	SO/2/5	5,000	1,000	3,000	1,000	0		□	-	استشاري و مقاول	تنفيذ و اشراف	-	0	الحكومة جهات مانحة	5,000		
			استكمال جزء من المبنى الرئيسي لمشروع جامعة القدس المفتوحة	SO/2/6	500	500							□	-	استشاري و مقاول	تنفيذ و اشراف	-	0	الحكومة جهات مانحة	500

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم مكون البرنامج / المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج / المشروع حسب توفر التمويل	الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط					
						الصرف السنوي					الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية / الشريك	الهيئة المحلية					
						2023	2024	2025	2026				حدد القسم المعني	اسم الجهة دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	غير الهيئة المحلية / الشريك	قيمة المساهمة
			مواثمة 50% من المدارس القائمة لذوي الإعاقة	SO/2/7	220	50	50	70	50	□	□	-	تنفيذ و اشراف	استشاري و مقاول	-	0	الحكومة جهات مانحة	220
التنمية الاجتماعية	رفع كفاءة قطاع التربية والتعليم وبنيته التحتية	SO/02	تشغيل موظفي حراسة للمدارس	SO/2/8	25	25				□	-	وزارة التربية	تنفيذ و اشراف	-	0	الحكومة	25	
			استحداث قسم صيانة للمباني المدرسية في مديرية التربية	SO/2/9	25	0	25	0	0	□	-	وزارة التربية	تنفيذ و اشراف	-	0	الحكومة	25	

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم مكون البرنامج / المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج / المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج / المشاريع المضمونة والمحتملة فقط					
						الصراف السنوي														
						2023	2024	2025	2026	مضمون	محتمل	تمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	غير الهيئة المحلية / الشريك	الهيئة المحلية
			استطلاعات ، استبيانات، دراسات	SO/2/10	30	5	10	10	5	□				-	وزارة التربية	تنفيذ و اشراف	-	الحكومة	30	
رفع كفاءة قطاع التربية والتعليم وبنيت التحتية																				
التنمية الاجتماعية	تمكين الفئات المهمشة والخدمات الاجتماعية	SO/03	بناء وتشطيب مركز لذوي الإعاقة	SO/3/1	1,500	0	750	750	0	□				دائرة المشاريع	استشاري	تخطيط و اشراف	المشاريع	300	الحكومة	1,200
			تأهيل مقابر عامة عدد 2	SO/3/2	500	500				□			-	وزارة الأوقاف	تنفيذ و اشراف	-	المحلي	500		
			زيادة عدد الأسر المشمولة بدعم التنمية الاجتماعية	SO/3/3	300	50	75	75	100	□				-	وزارة التنمية الاجتماعية	تنفيذ و اشراف	-	الحكومة	300	
			بناء مقر للمديريات والمؤسسات الحكومية في المدينة	SO/3/4	1,500	1,500				□				دائرة المشاريع	استشاري	تنفيذ و اشراف	المشاريع	200	الحكومة	1,300

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج *	اسم مكون البرنامج / المشروع	رقم مكون البرنامج / المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج / المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمنة والمحتملة فقط					
						الصراف السنوي														
						2023	2024	2025	2026	مضمون	محتمل	تمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	
التنمية الاجتماعية	تمكين الفئات المهمشة والخدمات الاجتماعية	SO/03	زيادة نسبة توظيف ذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع لتصل 5%	SO/3/5	20	5	5	5	5	□	□		الإدارة	الحكومة والقطاع الخاص	تنفيذ	التشغيلية	5	الحكومة المجتمع المحلي	15	
			برامج دمج ذوي الإعاقة في المجتمع	SO/3/6	180	30	50	50	50	50	□	□		الإدارة	الحكومة والقطاع الخاص	تنفيذ	التشغيلية	20	الحكومة جهات مانحة	160
			برامج تمكين للأسر المعيلة للفئات المهمشة	SO/3/7	500	50	150	150	150	150	□			-	الحكومة والقطاع الخاص	تنفيذ	-	0	الحكومة جهات مانحة	500
			عمل نشرات و ندوات حول توعية المرأة والطفل وتمكينهم.	SO/3/8	50	5	15	15	15	15	□			الإدارة	الحكومة والقطاع الخاص	تنفيذ	التشغيلية	20	الحكومة	30

المجال التنموي	اسم البرنامج	نوع البرنامج *	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج/ المشروع حسب توفر التمويل	الجهة المرشحة للتنفيذ			الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				
						الصراف السنوي					الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/ الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/ الشريك	
						2023	2024	2025	2026		حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة	قيمة المساهمة	
تمكين الفئات المهمشة والخدمات الاجتماعية																		
التنمية الاجتماعية	تعزيز وتطوير قطاع التراث والقافة ومقوماته	SO/04	ترميم 15 مبنى في البلدة القديمة	SO/4/1	750	0	150	300	300							545	4,005	
			ترميم وقائي ل 80 مبنى قديم	SO/4/2	250	25	75	75	75							50	200	
			بناء وتشطيب مركز ثقافي عام	SO/4/3	900	900										100	800	
			عمل خريطة ويافطات بالأماكن السياحية التراثية	SO/4/4	100	0	50	50	0							20	80	
			برامج توعية للحفاظ على المباني القديمة والمناطق الاثرية	SO/4/5	50	5	15	15	15							10	40	
			تدريب كوادر محلية	SO/4/6	50	5	15	15	15							10	40	

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج*	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/ المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج/ المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ		الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/ المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				
						الصراف السنوي													
						2023	2024	2025	2026	مضمون	محتمل	متمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	الهيئة المحلية	غير الهيئة المحلية/ الشريك
		SO/4/7	عمل نشرات و ندوات توعوية، ودراسات جدوى	50	5	15	15	15	□				الإدارة	استشاري	تنفيذ اشراف	المشاريع	10	جهات مانحة	40
تعزيز وتطوير قطاع التراث والثقافة ومقوماته				2,150	40	320	470	420									300		1,850
مجموع مجال التنمية الاجتماعية				28,400	5,205	8,490	6,440	3,840									845		27,555
الامن و الإدارة والحكم الرشيد	تعزيز وتطوير المؤسسات ذات الصلة بقطاع الأمن والسلامة العامة وإدارة الكوارث	GO/01	تشطيب مقر الهلال الأحمر وتشغيله	750	250	500	0	0	□				-	قطاع خاص مجتمعي محلي	تنفيذ اشراف	-	0	جهات مانحة ومجتمع محلي	750
			إنشاء مركز إسناد للدفاع المدني مؤهل بشكل مناسب	1,250	0	0	500	750		□			-	الحكومة الفلسطينية	تنفيذ اشراف	-	0	جهات مانحة والحكومة	1,250
			تحويل مركز شرطة يطا إلى مديرية مع الطاقم والآليات المطلوبة	150	0	150	0	0	0	□			-	الحكومة الفلسطينية	تنفيذ اشراف	-	0	جهات مانحة والحكومة	150

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج*	اسم مكون البرنامج/المشروع	رقم مكون البرنامج/المشروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة 2023-2026				تصنيف مكون البرنامج/المشروع حسب توفر التمويل			الجهة المرشحة للتنفيذ			الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط				
						الصرف السنوي														
						2023	2024	2025	2026	مضمون	محتمل	تمنى	حدد القسم المعني	اسم الجهة	غير الهيئة المحلية/الشريك	الهيئة المحلية	حددت بند الموازنة	قيمة المساهمة	حددت الجهة	قيمة المساهمة
			دراسة تحديد الاحتياج ومسوحات ميدانية	GO/1/5	20	5	5	5	5	□				الإدارة	استشاري	تنفيذ اشراف	التطويرية	5	جهات مانحة وحكومية	15
رفع كفاءة التخطيط والتنظيم العمراني						440	160	260	10	10								410		30
مجموع قطاع الأمن والإدارة والحكم الرشيد						2,640	425	925	525	765								410		2,230
مجموع المجالات الأربعة						83,155	19,775	26,150	16,495	11,510								6,970		76,185
مجموع تكلفة الخطة بالكامل						83,155														
						73,930														
مجموع المشاريع المضمونة والمحتملة						9,225				نسبة المتمنية من مجموع الخطة 11.1 %										
مجموع المشاريع المتمنية																				

7.2 خطة التنفيذ (السنة الأولى 2023)

اسم البرنامج ورقمه	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/الم شروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة العام 2023				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف		الجهة المرشحة للتمويل		تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*			
				الصرف الربع سنوي				الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية			غير الهيئة المحلية		
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	حدد القسم المعني	حدد الجهة دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة				
EN01 رفع كفاءة الطرق والمواصلات	تأهيل جزء من مدخل يطا الرئيسي	EN01/1	2,000	0	300	800	900	تنفيذ المشاريع	استشاري	إشراف	المشاريع	400	وزارة الأشغال	1,600	مخططات ووثائق عطاء
	تعبيد وتأهيل طرق داخلية 6 كم	EN01/2	1,000	200	200	200	400	تنفيذ المشاريع	استشاري	إشراف	المشاريع	100	الحكومة الهولندية	900	مخططات ووثائق عطاء
	شق طرق جديدة بطول 3كم	EN01/3	50	0	20	20	10	تنفيذ المشاريع	×	×	×	50	×	0	دعم الأهالي
	موائمة الطرق لذوي الاعاقة	EN01/4	10	0	0	5	5	تنفيذ المشاريع	×	×	×	10	×	0	مخططات
	تدريب وتأهيل طاقم المهندسين	EN01/7	5	0	1	1	3	تنفيذ المشاريع	صندوق البلديات	إشراف	-	0	صندوق البلديات	5	مادة التدريبية ومستشارين
	دراسات وجدوى	EN01/9	5	0	5	0	0	تنفيذ المشاريع	المواصلات	إشراف	-	0	وزارة	5	مسح ميداني
المجموع الجزئي															
EI/02 تحسين الموارد المائية وتطوير الصرف الصحي وبنيتها التحتية	اكمال جزء من المرحلة الأولى لشبكة مياه يطا	EN02/1	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	قسم المياه	×	×	×	0	الحكومة الهولندية	4,000	مخططات ووثائق عطاء
	تأهيل الوصلات المنزلية وتركيب 500 عداد مسبق الدفع	EN02/3	200	20	50	50	80	قسم المياه	×	×	×	20	الحكومة الهولندية	180	مخططات
	توريد مواسير صرف صحي بأقطار مختلفة لجزء من نواة شبكة (لحيلة)	EN02/6	250	0	100	150	150	قسم المياه	×	×	×	0	دائرة المياه	250	مخططات
	اكمال مشروع سقف السيل الحالي	EN02/8	2,000	500	500	500	500	قسم المياه	×	×	×	0	دائرة المياه	2,000	مخططات
	تشغيل وتدريب طاقم محلي	EN02/9	100	10	30	30	30	قسم المياه	×	×	×	50	جهة مانحة	50	قرار مجلس بلدي
	جدوى ودراسات واقع مائي وبيئي	EN02/10	45	0	15	15	15	قسم المياه والدائرة القانونية	استشاري	اشراف	التطويرية	15	جهة مانحة	30	قرار مجلس بلدي
	أتمتة المياه والصرف الصحي على برامج سكادا GIS	EN02/11	30	0	0	30	30	قسم المياه والدائرة القانونية	استشاري	اشراف	التطويرية	10	جهة مانحة	20	قرار مجلس بلدي
	المجموع الجزئي														

اسم البرنامج ورقمه	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/الم شروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة العام 2023				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف		الجهة المرشحة للتمويل			تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*		
				الصرف الربع سنوي				الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية			
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	حدد القسم المعني	حدد الجهة دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة		قيمة المساهمة	
تعزيز وتنويع مصادر الطاقة وجودتها EI/03	تركيب 5 محطات تقوية	EI\03/1	250	50	50	100	50	X	سيلكو	تنفيذ	-	0	سيلكو	250	دراسة احتياج
	تمديد 3 كم شبكة كهرباء ضغط متوسط	EI\03/2	100	0	30	30	40	X	سيلكو	تنفيذ	-	0	سيلكو	100	دراسة احتياج
	استبدال 2 كم شبكة المنيوم ضغط منخفض	EI\03/3	50	0	0	50	0	X	سيلكو	تنفيذ	-	0	سيلكو	50	دراسة احتياج
	تركيب شبكات ABC بطول 5 كم	EI\03/5	100	30	30	20	20	X	سيلكو	تنفيذ	-	0	سيلكو	100	مخططات
	تنفيذ مشاريع طاقة شمسية مع القطاع الخاص	EI\03/6	250	0	0	250	0	X	قطاع خاص	تنفيذ شريك	-	0	قطاع خاص	250	اتفاقيات ومخططات
	تدريب طواقم شركة سيلكو	EI\03/7	10	2	3	3	2	X	استشاري	تنفيذ	-	0	سيلكو	10	مواد تدريبية
	دراسات واتفاقيات	EI\03/8	5	0	5	0	0	X	سيلكو	تنفيذ	-	0	سيلكو	5	التعاقد مع استشاري
	حملات توعية للحد من التعدي على شبكات الكهرباء	EI\03/9	10	0	5	0	5	X	سيلكو	تنفيذ	-	0	سيلكو	10	حشد المجتمع المحلي
	المجموع الجزئي			775	82	123	453	117				0		775	
مجموع مجال البيئة والبنية التحتية			10,470	1,812	2,239	3,174	3,240					655		9,815	
تمتية الصناعة المحلية EC\01	دعم وتمويل 5 مشاريع صغيرة للفئات المهمشة	EC\01/4	25	0	5	15	5	X	استشاري وجهات حكومية	اشراف	-	0	جهات مانحة	25	دراسات جدوى
	تدريب وتشغيل طاقم محلي	EC\01/5	15	0	0	15	0		قطاع خاص	اشراف	-	0	جهات مانحة	15	مواد تدريبية
	بناء قدرات الفئات المهمشة ودمجهم في مجال الصناعة	EC\01/7	25	0	0	15	10		استشاري	اشراف	-	0	جهات مانحة	25	مواد تدريبية
	دراسات وقواعد بيانات	EC\01/8	10	0	10	0	0		استشاري	اشراف	-	0	وزارة العمل	10	طاقم ميداني

اسم البرنامج ورقمه	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/الم شروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة العام 2023				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف		الجهة المرشحة للتمويل			تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات/ بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*		
				الصرف الربع سنوي				الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية	
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	حدد القسم المعني	حدد الجهة دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة		قيمة المساهمة	
المجموع الجزئي															
دعم وتطوير قطاع الزراعة EC\02	تأهيل جزء من سوق مواشي نموذجي	EC\02/1	200	10	20	20	150	دائرة المشاريع	مديرية زراعة بطا	اشراف	المشاريع	50	جهات مانحة	150	وثائق عطاء
	انشاء مرحلة من سوق خضار مركزي	EC\02/2	500	100	100	200	100	وحدة التنمية	قطاع خاص	تنفيذ	-	0	قطاع خاص	500	تسويق
	البدء في انشاء مسلخ بلدي	EC\02/3	1,000	0	0	500	500	دائرة المشاريع	استشاري	اشراف	المشاريع	100	جهات مانحة	900	وثائق عطاء
	شق طرق زراعية بطول 7 كم	EC\02/4	100	0	30	40	30	x	مديرية زراعة بطا	اشراف وتنفيذ	-	0	جهات مانحة	100	وثائق عطاء
	استصلاح أراضي بمساحة 200 دونم	EC\02/5	250	0	50	100	100	x	مديرية زراعة بطا	اشراف وتنفيذ	-	0	وزارة الزراعة	250	وثائق عطاء
	انشاء 10 آبار جمع مياه	EC\02/8	100	0	20	50	30	x	مديرية زراعة بطا	اشراف وتنفيذ	-	0	جهات مانحة	100	وثائق عطاء
	تدريب وتشغيل طاقم محلي	EC\02/9	20	0	5	10	5	x	مديرية زراعة بطا	اشراف وتنفيذ	-	0	جهات مانحة	20	التعاقد مع مدربين
	تفعيل جمعيات تعاونية وزراعية عددها 2	EC\02/10	20	0	0	10	10	x	مديرية زراعة بطا	اشراف وتنفيذ	-	0	الحكومة	20	دعم وتشجيع
	عمل قاعدة بيانات عن الثروة الحيوانية والزراعية	EC\02/11	50	10	10	10	20	x	مديرية زراعة بطا	اشراف وتنفيذ	-	0	وزارة الزراعة	50	التعاقد مع استشاري
المجموع الجزئي															
تأهيل قطاع الترفيه والسياحة EC\03	اكمل مرحلة من ستاد بلدية يطا للتشغيل	EC\03/3	200	50	50	50	50	تنفيذ المشاريع	المجتمع المحلي	تنفيذ	التطويرية	50	جهة مانحة	150	مخططات
	ترميم 3 مباني في البلية القديمة	EC\03/4	50	0	0	50	0	الهندسة	x	x	التطويرية	15	جهة مانحة	35	مخططات
	تشغيل وتدريب الطواقم المحلية	EC\03/7	10	0	5	5	0	الإدارة	استشاري	تنفيذ	التطويرية	5	جهة مانحة	5	قرار مجلس
	توعية وبناء قدرات للفئات المهمشة	EC\03/9	10	0	5	5	0	الإدارة	استشاري	تنفيذ	التطويرية	5	جهة مانحة	5	قرار مجلس
	عمل دراسات ارشادية ومطبوعات اعلانية	EC\03/10	20	0	10	10	0	تنفيذ المشاريع	x	x	التطويرية	10	جهة مانحة	10	استشاري

اسم البرنامج ورقمه	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/الم شروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة العام 2023				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف		الجهة المرشحة للتمويل			تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات / بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*		
				الصرف الربع سنوي				الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية	
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	حدد القسم المعني	حدد الجهة دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة		قيمة المساهمة	
	دراسات جدوى	EC\03/11	10	0	0	5	5	تنفيذ المشاريع	x	x	-	0	جهة مانحة	10	استشاري
المجموع الجزئي				50	70	125	55					85		215	
رفع كفاءة القطاع التجاري EC\04	بناء وتشطيب مركز تجاري	EC\04/1	1,000	250	250	250	250	-	قطاع خاص	تنفيذ	-	0	قطاع خاص	1,000	مخططات وموافقات
	موائمة جزء من المنشآت التجارية القائمة لذوي الاعاقة	EC\04/5	50	0	15	15	20	-	قطاع خاص	تنفيذ	-	0	قطاع خاص	50	مخططات وموافقات
	تدريب وتشغيل طاقم محلي	EC\04/6	5	0	0	5	0	-	قطاع خاص	تنفيذ	-	0	قطاع خاص	5	تعاقد مع استشاري
	دراسات جدوى ومسوحات ميدانية	EC\04/7	5	0	0	5	0	-	قطاع خاص	تنفيذ	-	0	قطاع خاص	5	تعاقد مع استشاري
المجموع الجزئي				250	265	275	270					0		1,060	
مجموع مجال تنمية الاقتصاد المحلي				420	585	1,385	1,285					235		3,440	
تعزيز الخدمات الصحية ومكوناتها SO\01	تشطيب قسم الباطني والعيادات الخارجية في مستشفى يطا الحكومي	SO\01/1	1,800	0	500	500	800	-	وزارة الصحة	إشراف	-	0	وزارة الصحة	1,800	وثائق عطاء
	البدء في إضافة مبنى جديد للعيادة المركزية	SO\01/3	100	0	0	100		-	وزارة الصحة	إشراف	-	0	وزارة الصحة	100	وثائق عطاء
	تأهيل عيادة صحية (العروس، تلة الصمود، اعزيز)	SO\01/4	100	25	25	25	25	x	وزارة الصحة	إشراف	-	0	وزارة الصحة	100	تجنيد تمويل
	أضافة طابق لمبنى مديرية الصحة (عيادة السلام)	SO\01/5	200	0	0	100	100	x	وزارة الصحة	إشراف	-	0	المجتمع المحلي	200	تجنيد تمويل
	تشغيل عيادة بمستوى 3+	SO\01/6	50	0	0	50	0	x	وزارة الصحة	إشراف	-	0	وزارة الصحة	50	تجنيد تمويل
	عمل دليل محوسب	SO\01/7	5	0	5	0	0	-	وزارة الصحة	إشراف	-	0	وزارة الصحة	5	تعاقد مع استشاري
	تشغيل وتدريب طواقم محلية	SO\01/8	10	0	5	5	0	-	وزارة الصحة	إشراف	-	0	وزارة الصحة	10	تعاقد مع استشاري

اسم البرنامج ورقمه	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/الم شروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة العام 2023				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف		الجهة المرشحة للتمويل			تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات/ بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*		
				الصرف الربع سنوي				الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية			
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	حدد القسم المعني	حدد الجهة دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة		قيمة المساهمة	
	تشغيل عيادة نفسية ورعاية المسنين	SO\01/9	50	0	15	15	20	-	وزارة الصحة	إشراف	-	0	وزارة الصحة	50	موافقات
	دراسة ومسوحات	SO\01/10	5	0	5	0	0	-	الصحة	إشراف	-	0	الصحة	5	موافقات
المجموع الجزئي															
			2,320	25	555	695	1,045					0		2,320	
SO\02	رفع كفاءة قطاع التربية والتعليم وبنيتة التحتية	SO\02/1	1,000	0	200	350	450	-	وزارة التربية	إشراف	-	0	جهة مانحة	1,000	وثائق عطاء
	تشطيب وتشغيل مدرسة الفقير	SO\02/2	500	0	200	250	50	x	وزارة التربية	إشراف	-	0	وزارة التربية	500	وثائق عطاء
	صيانة مدارس ابن تيمية وذكور يطا الثانوية	SO\02/3	150	0	50	50	50	x	وزارة التربية	إشراف	-	0	وزارة التربية	150	وثائق عطاء
	البدء في بناء مدرسة مهنية	SO\02/5	1,000	100	300	300	300	x	وزارة التربية	إشراف	-	0	جهة مانحة	1,000	وثائق عطاء
	موائمة 5 مدارس لذوي الإعاقة	SO\02/7	50	10	15	15	10	-	وزارة التربية	إشراف	-	0	وزارة التربية	50	وثائق عطاء
	استطلاعات و دراسات	SO\02/10	5	0	0	5	0	-	وزارة التربية	إشراف	-	0	وزارة التربية	5	استشاري
	المجموع الجزئي														
			2,705	110	765	970	860					0		2,705	
SO\03	تمكين الفئات المهمشة والخدمات الاجتماعية	SO\03/3	50	25	25	0	0	-	التممية الاجتماعية	تنفيذ	-	-	التممية الاجتماعية	50	كشف ميداني
	توظيف ذوي الإعاقة في المؤسسات وصولا إلى 5%	SO\03/5	5	0	5	0	0	x	مؤسسات محلية	تنفيذ	-	0	مؤسسات محلية	5	عقود عمل
	برنامج دمج ذوي الإعاقة في المجتمع	SO\03/6	30	0	10	10	10	-	التممية الاجتماعية	تنفيذ	-	0	جهات مانحة	30	دراسة جدوى
	مشاريع تمكين الأسر المعيلة للفئات المهمشة	SO\03/7	50	0	15	20	15	x	التممية الاجتماعية	تنفيذ	-	0	جهات مانحة	50	دراسة جدوى
	نشرات وندوات توعية	SO\03/8	5	0	2	0	3	x	التممية الاجتماعية	تنفيذ	-	0	الحكومة	5	تحضير للطباعة مادة

اسم البرنامج ورقمه	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/الم شروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة العام 2023				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف		الجهة المرشحة للتمويل			تحضيرات لازمة للتنفيذ (دراسات جدوى/ مقترحات/ بنود مرجعية/ وثائق عطاء)*		
				الصرف الربع سنوي				الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية	
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	حدد القسم المعني	حدد الجهة دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة	حدد الجهة		قيمة المساهمة	
المجموع الجزئي															
SO\04	ترميم وقائي لـ 5 مباني قديمة	SO\04/2	25	0	10	15	0	دائرة الهندسة	استشاري	اشراف	-	0	جهة مانحة	25	دراسة ومخطط
	برامج توعية للحفاظ على المباني القديمة والمناطق الأثرية	SO\04/5	5	0	0	5	0	دائرة الهندسة	استشاري	اشراف	-	0	رواق	5	اعلام وحشد
	تدريب كوادر محلية	SO\04/6	5	0	0	5	0	الإدارة	استشاري	اشراف	-	0	حكومة	5	مادة تدريبية
	عمل نشرات ودراسة جدوى	SO\04/7	5	0	0	5	0	الإدارة	استشاري	اشراف	التطويرية	2	رواق	3	اعلام وحشد
المجموع الجزئي															
مجموع قطاع التنمية الاجتماعية															
GO\01	البدا في تشطيب مقر الهلال الأحمر	GO\01/1	250	50	75	75	50	-	مجتمع محلي	تنفيذ	-	0	مجتمع محلي	250	جمع تمويل
	دراسة جدوى وتحديد احتياج	GO\01/4	15	0	0	15	0	-	الحكومة	تنفيذ	-	0	الحكومة	15	كشف ميداني
المجموع الجزئي															
GO\02	رفع كفاءة التنظيم والتخطيط العمراني	GO\02/1	150	25	25	50	50	الهندسة	دائرة الأراضي	اشراف	المشاريع	150	-	0	حشد دعم الاهالي
	تدريب كوادر محلية	GO\01/4	5	0	0	5	0	الهندسة	استشاري	تنفيذ	التطويرية	0	جهة مانحه	5	التعاقد مع استشاري

اسم البرنامج ورقمه	اسم مكون البرنامج/ المشروع	رقم مكون البرنامج/الم شروع	التكلفة التقديرية X \$1000	خطة العام 2023				الجهة المرشحة للتنفيذ/الإشراف			الجهة المرشحة للتمويل		تحضيرات لازمة		
				الصرف الربع سنوي				الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية/الشريك		الهيئة المحلية		غير الهيئة المحلية	
				الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع	حدد القسم المعني	حدد الجهة	دورها	حدد بند الموازنة	قيمة المساهمة		حدد الجهة	قيمة المساهمة
	دراسة تحديد احتياج	GO\01/5	5	0	0	0	5	الهندسة	استشاري	تنفيذ	التطويرية	2	جهة مانحه	3	مع التعاقد استشاري
المجموع الجزئي			160	25	25	55	55					152		8	
المجموع لمجال الإدارة والحكم الرشيد			425	75	100	145	105					152		273	
مجموع الإنفاق الكلي للعام 2023			19,775	2,467	4,316	6,429	6,563					1,044		18,731	

7.3 خطة المتابعة والتقييم

اسم البرنامج	مكونات البرنامج	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	القيمة المنشودة على امتداد عمر الخطة				مصدر المعلومات	أداة القياس	الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤثر
				2023	2024	2025	2026			
مجال البيئة والبنية التحتية										
رفع كفاءة الطرق والمواصلات	- تعبيد 5 مداخل رئيسية بطول 15 كم. - تعبيد 30 كم من طرق المدينة الداخلية والرابطة. - شق 20 كم من الطرق المقترحة ضمن المخطط الهيكلي - موائمة الطرق لذوي الإعاقة حسب المخططات والدراسات. - استكمال موقف السيارات العمومية - تركيب إشارات مرور عدد 2 - تدريب مهندسي الإشراف ورفع قدراتهم دراسات	طول الطرق المعبدة / كم	120	135	150	165	180	دائرة التخطيط والمشاريع	سجل الأصول الثابتة	بلدية يطا
		عدد المداخل الرئيسية المؤهلة بشكل مناسب	1	2	3	5	6	دائرة التخطيط والمشاريع	سجل الأصول الثابتة	بلدية يطا
		عدد المركبات العمومية الداخلية	0	0	30	40	52	مديرية النقل والمواصلات	سجلات المديرية	نقابة سائقي العموم
		عدد مواقف السيارات العمومية	0	0	1	1	1	دائرة التخطيط والمشاريع	مخططات وتقارير وأصول ثابتة	بلدية يطا ومديرية المواصلات
		عدد إشارات المرور الموجودة	0	0	1	2	2	دائرة التخطيط والمشاريع	تقارير وسجلات	مديرية المواصلات
		نسبة شق طرق مقترحة من المخطط الهيكلي - %	5	10	15	20	25	دائرة الهندسة	تقارير وسجلات	بلدية يطا
		نسبة تغطية شبكة المياه. %	75	85	90	95	100	دائرة المياه	سجلات وتقارير	بلدية يطا
		عدد خزانات المياه في المدينة	4	5	6	6	6	دائرة المياه	أصول ثابتة	بلدية يطا
تحسين الموارد المائية وتطوير	- اكمال المرحلة الأولى من مشروع شبكة مياه يطا									

اسم البرنامج	مكونات البرنامج	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	القيمة المنشودة على امتداد عمر الخطة				مصدر المعلومات	أداة القياس	الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤثر
				2023	2024	2025	2026			
الصرف الصحي وبنيتهم التحتية	- توفير ورشة فنية متخصصة بالصيانة لقسم المياه - ترتيب الوصلات المنزلية وتركيب 5200 عداد مياه مسبق الدفع - عمل شبكة Master Plan واقعية ومحدثة لشبكة المياه - إبرام اتفاقية جديدة مع سلطة المياه لزيادة حصة المدينة - أعمال توريد و تمديد مواسير للصرف الصحي حسب الأطوال والأقطار في المخططات والدراسات - أعمال توصيل وربط المنازل على شبكة الصرف الصحي - اكمال مشروع سقف السيل الجاري حاليا - تشغيل وتدريب طاقم محلي - دراسات جدوى وبيئية واحتياج - أتمتة وبرامج كمبيوتر	نسبة الفاقد من شبكة المياه	30%	25%	22%	20%	17%	دائرة المياه	سجلات وتقارير	بلدية يطا
		نسبة تحصيل ثمن المياه من المواطن.	30%	50%	65%	80%	100%	الدائرة المالية	فواتير وكشوفات	بلدية يطا
		عدد الورش الفنية المؤهلة بشكل كامل في البلدية	0	0	1	1	1	دائرة المياه	أصول ثابتة	بلدية يطا
		حصة الفرد من المياه يوميا باللتر	25	35	50	60	70	دائرة المياه والمالية	تقارير	بلدية يطا
		عدد اشتراكات المياه	5200	6000	7000	8500	10000	الدائرة المالية	فواتير وكشوفات	بلدية يطا
		عدد اشتراكات المياه مسبقة الدفع	0	200	1000	3000	5000	دائرة المياه والمالية	تقارير	بلدية يطا
		المساحة المشمولة بشبكة صرف صحي بالدونم	0	0	5000	6000	10000	دائرة المياه والمالية	تقارير	بلدية يطا
		عدد الحفر الامتصاصية في المنطقة الشمالية الغربية من المدينة	2500	2000	1500	1000	500	دائرتي المياه والهندسة	تقارير وأصول ثابتة	بلدية يطا
تعزيز وتنوع مصادر الطاقة	- توريد وتركيب 23 محطة تقوية - تمديد 20 كم شبكة ضغط متوسط - استبدال 3 كم من شبكة الضغط المنخفض الألمنيوم بكوابل معزولة - تشغيل وتركيب نقطة ربط جديدة	عدد نقاط الربط	2	2	3	2	2	Selco	سجلات وأصول ثابتة	Selco
		طول شبكة الضغط المتوسط/ كم	102	110	115	120	125	Selco	سجلات وأصول ثابتة	Selco
		عدد محطات التقوية	157	162	167	173	180	Selco	سجلات وأصول ثابتة	Selco

اسم البرنامج	مكونات البرنامج	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	القيمة المنشودة على امتداد عمر الخطة				مصدر المعلومات	أداة القياس	الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤثر
				2023	2024	2025	2026			
وجودتها	- تركيب شبكات جهد منخفض ABC بطول 30 كم - تركيب خلايا شمسية لإنتاج الطاقة البديلة عدد 10 بقدرة إنتاجية مختلفة - تدريب ودراسات	نسبة تغطية الإنارة لشوارع المدينة	50%	60%	70%	80%	90%	Selco	سجلات وأصول ثابتة	Selco
		عدد الاشتراكات المختلفة *1000	14.5	16	17.5	18.5	20	Selco	سجلات وأصول ثابتة	Selco
		نسبة كوابل ABC	98%	99%	99%	100%	100%	Selco	سجلات وأصول ثابتة	Selco

مجال تنمية الاقتصاد المحلي

تنمية الصناعة المحلية ومكوناتها	- تأهيل نواة منطقة حرف وصناعات خفيفة - بناء وتشغيل مصنع لدباغة الجلود - بناء وتشغيل مصنع للأعلاف والاسمدة - دعم وتمويل 40 مشروع صغير للفئات المهمشة - انشاء حاضنة اعمال - تدريب ودراسات	نسبة عدد العاملين في قطاع الصناعة	3%	5%	7%	8%	10%	مديرية العمل والغرفة التجارية	سجلات	غرفة تجارة وصناعة الجنوب
		عدد المنشآت الصناعية المسجلة	50	75	130	160	200	قسم الرقابة والتفتيش	سجلات	بلدية يطا
		عدد حاضنات الأعمال	0	0	0	1	1	مديرية العمل والغرفة التجارية	سجلات	غرفة تجارة وصناعة الجنوب
		عدد مناطق الحرف الخفيفة المؤهلة	0	0	0	0	1	دائرة الهندسة	مخططات وتقارير	بلدية يطا
تعزيز جودة القطاع الزراعي ومكوناته	-تأهيل سوق مواشي نموذجي -إنشاء سوق خضار مركزي بالشراكة مع القطاع الخاص -انشاء مسلخ بلدي مؤهل -شق 60 كم من الطرق الزراعية -استصلاح أراضي بمساحة 1000 دونم -بناء وتشطيب وتشغيل مركز لتحسين السلالات	عدد أسواق المواشي المؤهلة	0	0	1	1	1	مديرية زراعة يطا	مخططات وسجلات	بلدية يطا
		عدد الأسواق المركزية للخضار والفواكة	0	0	1	1	1	مديرية زراعة يطا	مخططات وسجلات	بلدية يطا
		عدد المسالخ المرخصة والمؤهلة	0	0	1	1	1	مديرية زراعة يطا	مخططات وسجلات	بلدية يطا
		مشتل حكومي مؤهل	0	0	1	1	1	مديرية زراعة يطا	أصول ثابتة	وزارة الزراعة
		طول الطرق الزراعية التي يتم شقها سنويا/ كم	7	10	12	14	15	مديرية زراعة يطا	مخططات وسجلات	بلدية يطا

اسم البرنامج	مكونات البرنامج	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	القيمة المنشودة على امتداد عمر الخطة				مصدر المعلومات	أداة القياس	الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤثر	
				2023	2024	2025	2026				
	- انشاء مشتل متخصص ومؤهل - انشاء 50 بئر جمع مياه - تدريب ودراسات	مساحة الأراضي المستصلحة سنويا بالدونم	150	200	250	300	350	مديرية زراعة يطا	مخططات وسجلات	وزارة الزراعة	
		عدد مراكز تحسين السلالات	0	0	0	0	1	مديرية زراعة يطا	أصول ثابتة	وزارة الزراعة	
تنمية الترفيه والسياحة المحلية ومكوناتها	- اكمال بناء وتشطيب متنزه بلدية يطا في الكرمل وانشاء متنزه داخل المدينة - اكمال بناء وتشطيب ستاد بلدية يطا - ترميم 30% من البلدة القديمة - تأهيل وترميم وتشطيب بيت ضيافة في البلدة القديمة - انشاء وتشغيل مسار سياحي للدراجات الهوائية - تدريب ودراسات وطباعة بروشورات	عدد المرافق السياحية المؤهلة في المدينة	0	1	2	3	3	وحدة الاستثمار والتنمية	أصول ثابتة	بلدية يطا	
		عدد المتنزهات الداخلية	0	0	1	1	1	1	وحدة الاستثمار والتنمية	أصول ثابتة	بلدية يطا
		عدد العاملين في المنشآت السياحية	3	3	15	30	50	50	دائرة المالية	سجلات	بلدية يطا
		عدد بيوت الضيافة في البلدة القديمة	0	0	1	1	1	1	دائرة الهندسة	أصول ثابتة	بلدية يطا
		نسبة ترميم البلدة القديمة	2%	5%	10%	25%	35%	35%	دائرة الهندسة	تقارير ومخططات	بلدية يطا
		عدد المحال التجارية المسجلة في البلدية	3500	3700	4500	5000	5500	5500	قسم المهن والحرف	سجلات وتقارير	بلدية يطا
رفع كفاءة القطاع التجاري	- بناء وتشطيب مراكز تجارية عدد 2 - انشاء سوق شعبي مؤهل - عمل مواقف سيارات مؤهلة عدد 2 - ترتيب واجهة المحال التجارية من حيث اللون والأرما - موائمة المنشآت التجارية لذوي الإعاقة - تدريب ودراسات	عدد فروع البنوك العاملة في المدينة	4	4	5	5	6	الدائرة المالية	سجلات	بلدية يطا	
		عدد المناطق التجارية الفرعية المؤهلة	0	0	0	1	1	1	دائرة الهندسة	مخططات وسجلات	بلدية يطا
		عدد الأسواق الشعبية	0	0	0	1	1	1	وحدة التنمية والاستثمار	سجلات	بلدية يطا
		عدد مواقف السيارات المؤهلة على الشارع الرئيسي	0	0	1	1	2	2	دائرة الهندسة	أصول ثابتة	بلدية يطا
مجال التنمية الاجتماعية											
تعزيز جودة		عدد العيادات العاملة بمستوى +4	1	1	2	3	3	مديرية الصحة	سجلات	وزارة الصحة	

اسم البرنامج	مكونات البرنامج	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	القيمة المنشودة على امتداد عمر الخطة				مصدر المعلومات	أداة القياس	الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤثر
				2023	2024	2025	2026			
الخدمات الصحية ومكوناتها	- بناء وتشطيب وتشغيل أقسام جديدة في المستشفى الحكومي. - بناء وتشطيب وتأهيل مستودع لتخزين الأدوية. - إضافة مبنى للعيادة المركزية. - تأهيل عيادات العروس، تلة الصمود، اعزيز. - إضافة طابق لمبنى مديرية الصحة/ عيادة السلام، وتأهيل المبنى. - تشغيل عيادة رعاية نفسية للمسنين. - أدلة و برامج محوسبة وتدريب ودراسات.	عدد العيادات بمستوى +3	4	4	5	6	6	مديرية الصحة	سجلات	وزارة الصحة
		عدد العيادات بمستوى ثاني	11	11	12	14	15	مديرية الصحة	سجلات	وزارة الصحة
		عدد العيادات بمستوى أول	10	10	9	8	7	مديرية الصحة	سجلات	وزارة الصحة
		عدد الأسرة في قسم الولادة في المستشفى الحكومي	14	14	20	25	30	المستشفى الحكومي	سجلات	وزارة الصحة
		عدد الأقسام التي تحتاج لتطوير وتأهيل في المستشفى الحكومي	4	3	2	1	0	المستشفى الحكومي	سجلات	وزارة الصحة
رفع كفاءة قطاع التربية والتعليم وبيئته التحتية	- بناء وتشطيب 5 مدارس وتشغيل 5 أخرى - صيانة 14 مدرسة - بناء قاعة اجتماعات واحتفالات - بناء وتشطيب وتشغيل مدرسة مهنية وصناعية - موازنة 50% من المدارس القائمة لذوي الإعاقة - دراسات وتدريبات	نسبة المدارس المستأجرة	32%	30%	20%	10%	5 %	مديرية التربية	سجلات وأصول ثابتة	وزارة التربية
		عدد شعب التعليم المهني والصناعي	2	2	6	8	10	مديرية التربية	سجلات وأصول ثابتة	وزارة التربية
		عدد المدارس التي تحتاج صيانة سنوياً	14	12	10	7	4	مديرية التربية	سجلات وأصول ثابتة	وزارة التربية
		عدد المدارس المهنية والصناعية	0	0	1	1	1	مديرية التربية	سجلات وأصول ثابتة	وزارة التربية
تمكين الفئات المهمشة والخدمات الاجتماعية	- بناء وتشطيب مركز لذوي الإعاقة - تأهيل مقابر عامة عدد 2	عدد المقابر العامة المؤهلة	0				1	مديرية الأوقاف	سجلات وأصول ثابتة	مديرية الأوقاف
		عدد مراكز ذوي الإعاقة المؤهلة	1				2	مديرية التنمية الاجتماعية	سجلات وتقارير	مديرية التنمية الاجتماعية

اسم البرنامج	مكونات البرنامج	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	القيمة المنشودة على امتداد عمر الخطة				مصدر المعلومات	أداة القياس	الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤثر
				2023	2024	2025	2026			
	- زيادة عدد الأسر المشمولة بدعم وزارة التنمية الاجتماعية إلى 9000 أسرة - بناء مجمع للمديريات والمؤسسات الحكومية في المدينة - زيادة نسبة توظيف ذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع لتصل 5% وبرامج دمجهم - نشرات وندوات	نسبة ذوي الإعاقة في الوظائف	1%				5%	كافة المؤسسات	تقارير وهيكلية	مديرية التنمية
		عدد الأسر المشمولة بخدمات التنمية الاجتماعية * 1000	6				9	مديرية التنمية الاجتماعية	سجلات وتقارير	مديرية التنمية الاجتماعية
		عدد المستفيدين من مركز بلدية يطا المجتمعي	100				250	مركز مجتمعي البلدية	سجلات وتقارير	بلدية يطا
		عدد النوادي والجمعيات النسوية الفاعلة	3				5	مديرية التنمية الاجتماعية ومديرية الداخلية	سجلات وتقارير	مديرية التنمية الاجتماعية
	- ترميم 15 مبنى في البلدة القديمة - ترميم وقائي ل 80 مبنى قديم - بناء وتشطيب مركز ثقافي عام - عمل خريطة وياطات بالأماكن السياحية التراثية - برامج توعية ودراسات وتدريب	عدد الأبنية المرممة بشكل كامل في البلدة القديمة	8	8	20	35	50	دائرة الهندسة	تقارير ومخططات	بلدية يطا ودائرة الآثار
		عدد الأبنية القديمة المرممة وقائيا	200	220	280	320	400	دائرة الهندسة	تقارير ومخططات	بلدية يطا ودائرة الآثار
		عدد المراكز الثقافية الفاعلة	3	3	4	5	6	وحدة التنمية	سجلات	بلدية يطا
		قاعة و مركز ثقافي عام مؤهل	0	0	0	0	1	دائرة الهندسة	تقارير ومخططات	بلدية يطا ودائرة الآثار
مجال الأمن والسلامة العامة والحكم الرشيد										
تطوير وتأهيل المؤسسات ذات الصلة بالأمن والسلامة العامة وإدارة الكوارث	- تشطيب مقر الهلال الأحمر وتشغيله - إنشاء مركز إسناد للدفاع المدني مؤهل بشكل مناسب - تحويل مركز شرطة يطا إلى مديرية للشرطة مع الطاقم والآليات المطلوبة - دراسات وتدريبات	عدد مراكز الإسناد التابعة للدفاع المدني	0	0	0	1	1	مديرية الدفاع المدني	أصول ثابتة و تقارير	جهاز الدفاع المدني
		عدد المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهلال الأحمر	0	0	1	1	1	الهلال الأحمر	الأصول الثابتة و تقارير	بلدية يطا والهلال الأحمر

اسم البرنامج	مكونات البرنامج	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	القيمة المنشودة على امتداد عمر الخطة				مصدر المعلومات	أداة القياس	الجهة المسؤولة عن متابعة قياس المؤثر
				2023	2024	2025	2026			
رفع كفاءة التخطيط والتتظيم العمراني	- اكمال مشروع تسوية وتسجيل الأراضي - تحديث المخطط الهيكلي الحالي - انشاء محكمة بلديات خاصة بمدينة يطا - تدريبات و دراسات	عدد رخص الأبنية الصادرة سنويا	310	350	400	430	490	دائرة الهندسة	سجلات وأرشفيف	بلدية يطا
		مساحة المخطط الهيكلي الحالي /كم2	30.7	30.7	35	35	35	دائرة الهندسة	سجلات وأرشفيف	بلدية يطا
		عدد المخالفات التنظيمية سنويا	200	185	160	135	100	دائرة الهندسة	سجلات وأرشفيف	بلدية يطا

8 . شمولية الخطة التنموية للمشاريع المستجيبة لاحتياجات الفئات المهمشة وتحسين البيئة والمناخ:

نظراً لضرورة شمولية عملية التخطيط التنموي المحلي لقضايا البيئة والتغير المناخي وكذلك القضايا الخاصة باحتياجات الفئات المهمشة وخاصة المرأة، الشباب، الاشخاص ذوي/ات الاعاقة وكبار، وكبيرات السن، فقد حرص فريق التخطيط بلجانه المختلفة على تشخيص هذه المحاور وبشكل تقاطعي مع المجالات التنموية الرئيسية ومحاورها الفرعية، وبالتالي تم تحديد احتياجات هذه الفئات واحتياجات التكيف المناخي والحد من الأضرار البيئية الحالية والمحتملة، حيث تمت ترجمة هذه الاحتياجات الى برامج ومشاريع وأنشطة ممكنة ومطلوب العمل على تحقيقها من خلال الهيئة المحلية والجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص والأهلي وكذلك المجتمع المحلي، وبناءً على ذلك فقد تم ادراجها في الخطة التنموية للمدينة بشكل تقاطعي في مصفوفة المشاريع الرباعية وخطة التنفيذ السنوية وكذلك مصفوفة المتابعة والتقييم ليتم العمل عليها خلال الاعوام: (2023-2026)، وتم تلخيص أهم تلك المشاريع والانشطة في الجداول اللاحقة أدناه.

أولاً: قائمة ونسبة المشاريع الخاصة بتلبية احتياجات الفئات المهمشة إلى إجمالي الخطة التنموية المحلية:


الرقم	اسم المشروع	رقم المشروع	الموازنة التقديرية \$1000 X	المجال التنموي
1	موائمة الطرق لذوي الإعاقة حسب المخططات والدراسات	EI/1/4	60	البيئة والبنية التحتية
2	استكمال موقف السيارات العمومية ومواءمته	EI/1/5	30	البيئة والبنية التحتية
3	دعم وتمويل 40 مشروع صغير للفئات المهمشة	EC/1/4	200	تنمية الاقتصاد المحلي
4	انشاء حاضنة اعمال للمبادرين الشباب والشابات	EC/1/6	50	تنمية الاقتصاد المحلي
5	بناء قدرات الفئات المهمشة ودمجهم في مجال الصناعة الخفيفة	EC/1/7	100	تنمية الاقتصاد المحلي
6	شق 60 كم من الطرق الزراعية	EC/2/4	1000	تنمية الاقتصاد المحلي
7	استصلاح أراضي بمساحة 1000 دونم	EC/2/5	1000	تنمية الاقتصاد المحلي
8	انشاء 50 بئر جمع مياه و سدود عدد 2	EC/2/8	700	تنمية الاقتصاد المحلي
9	بناء قدرات الفئات المهمشة ودمجهم في مجال الترفيه والسياحة	EC/3/9	50	تنمية الاقتصاد المحلي
10	عمل مواقف سيارات موائمة عدد 2	EC/4/3	40	تنمية الاقتصاد المحلي
11	موائمة المنشآت التجارية لذوي الإعاقة	EC/4/5	300	تنمية الاقتصاد المحلي
12	تأهيل عيادات العروس، تلة الصمود، اعزير	SO/1/4	450	التنمية الاجتماعية
13	تشغيل عيادة رقعة وتلة الصمود بمستوى +3	SO/1/6	100	التنمية الاجتماعية
14	تشغيل عياد صحة نفسية للمسنين	SO/1/9	150	التنمية الاجتماعية
15	موائمة 50% من المدارس القائمة لذوي الإعاقة	SO/2/7	220	التنمية الاجتماعية
16	بناء وتشطيب مركز لذوي الإعاقة	SO/3/1	1500	التنمية الاجتماعية
17	زيادة عدد الأسر المشمولة بدعم التنمية الاجتماعية	SO/3/3	300	التنمية الاجتماعية
18	زيادة نسبة توظيف ذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع لتصل 5%	SO/3/7	20	التنمية الاجتماعية
19	برامج دمج ذوي الإعاقة في المجتمع	SO/3/8	180	التنمية الاجتماعية

الرقم	اسم المشروع	رقم المشروع	الموازنة التقديرية \$1000 X	المجال التنموي
20	برامج تمكين للأسر المعيلة للفئات المهمشة	SO/3/9	500	التنمية الاجتماعية
	عمل نشرات و ندوات حول توعية المرأة والطفل وتمكينهم.	So/3/10	50	التنمية الاجتماعية
	الموازنة التقديرية لهذه المشاريع \$1000 X			7000
	المجموع الكلي للخطة التنموية (محتمل + مضمون) × 1000 \$			73,930
	المجموع الكلي للخطة التنموية (محتمل+مضمون+متمنى) × 1000 \$			83,155
	نسبة قيمة المشاريع الى المشاريع المضمونة والمحتملة			.950%
	نسبة قيمة المشاريع الى المشاريع المضمونة والمحتملة والمتمناه			%0.85

ثانيا: قائمة ونسبة المشاريع الخاصة بالبيئة وتحسين المناخ إلى إجمالي الخطة التنموية المحلية:


الرقم	اسم المشروع	رقم المشروع	الموازنة التقديرية \$1000 X	المجال التنموي
1	اكمال مشروع سقف السيل الجاري حاليا	EI/2/8	2000	البيئة والبنية التحتية
2	دراسات بيئي و واقع التدفق المائي في المدينة وعدد من دراسات الجدوى	EI/2/10	120	البيئة والبنية التحتية
3	أتمتة المياه والصرف الصحي على برامج سكادا و GIS	EI/2/11	120	البيئة والبنية التحتية
4	تركيب خلايا شمسية لإنتاج الطاقة البديلة عدد 10 بقدرة إنتاجية مختلفة	EI/3/6	2000	البيئة والبنية التحتية
5	تأهيل منطقة حرف وصناعات خفيفة	EC/1/1	1,000	البيئة والبنية التحتية
6	تأهيل سوق مواشي نموذجي	EC/2/1	650	تنمية الاقتصاد المحلي
7	إنشاء سوق خضار مركزي بالشراكة مع القطاع الخاص	EC/2/2	860	تنمية الاقتصاد المحلي

8	انشاء مسلخ بلدي مؤهل	EC/2/3	2,700	البيئة والبنية التحتية
9	شق 60 كم من الطرق الزراعية	EC/2/4	1,000	تتمية الاقتصاد المحلي
10	استصلاح أراضي بمساحة 1000 دونم	EC/2/5	1000	تتمية الاقتصاد المحلي
11	انشاء مشتل متخصص ومؤهل لإنتاج الأشتال بمساحة 3 دونم	EC/2/7	300	تتمية الاقتصاد المحلي
12	انشاء 50 بئر جمع مياه و سدود عدد 2	EC/2/8	700	تتمية الاقتصاد المحلي
13	تفعيل الجمعيات التعاونية غير النشطة	EC/2/10	50	تتمية الاقتصاد المحلي
14	عمل قاعدة بيانات حول قطاع الزراعة والثروة الحيوانية	EC/2/11	300	تتمية الاقتصاد المحلي
الموازنة التقديرية لهذه المشاريع \$1000 X			12800	
المجموع الكلي للخطة التنموية (محتمل + مضمون) \$ 1000×			73,930	
المجموع الكلي للخطة التنموية (محتمل+مضمون+متمنى) \$ 1000×			83,155	
نسبة قيمة المشاريع الى المشاريع المضمونة والمحتملة			17.3%	
نسبة قيمة المشاريع الى المشاريع المضمونة والمحتملة والمتمناه			15.39%	

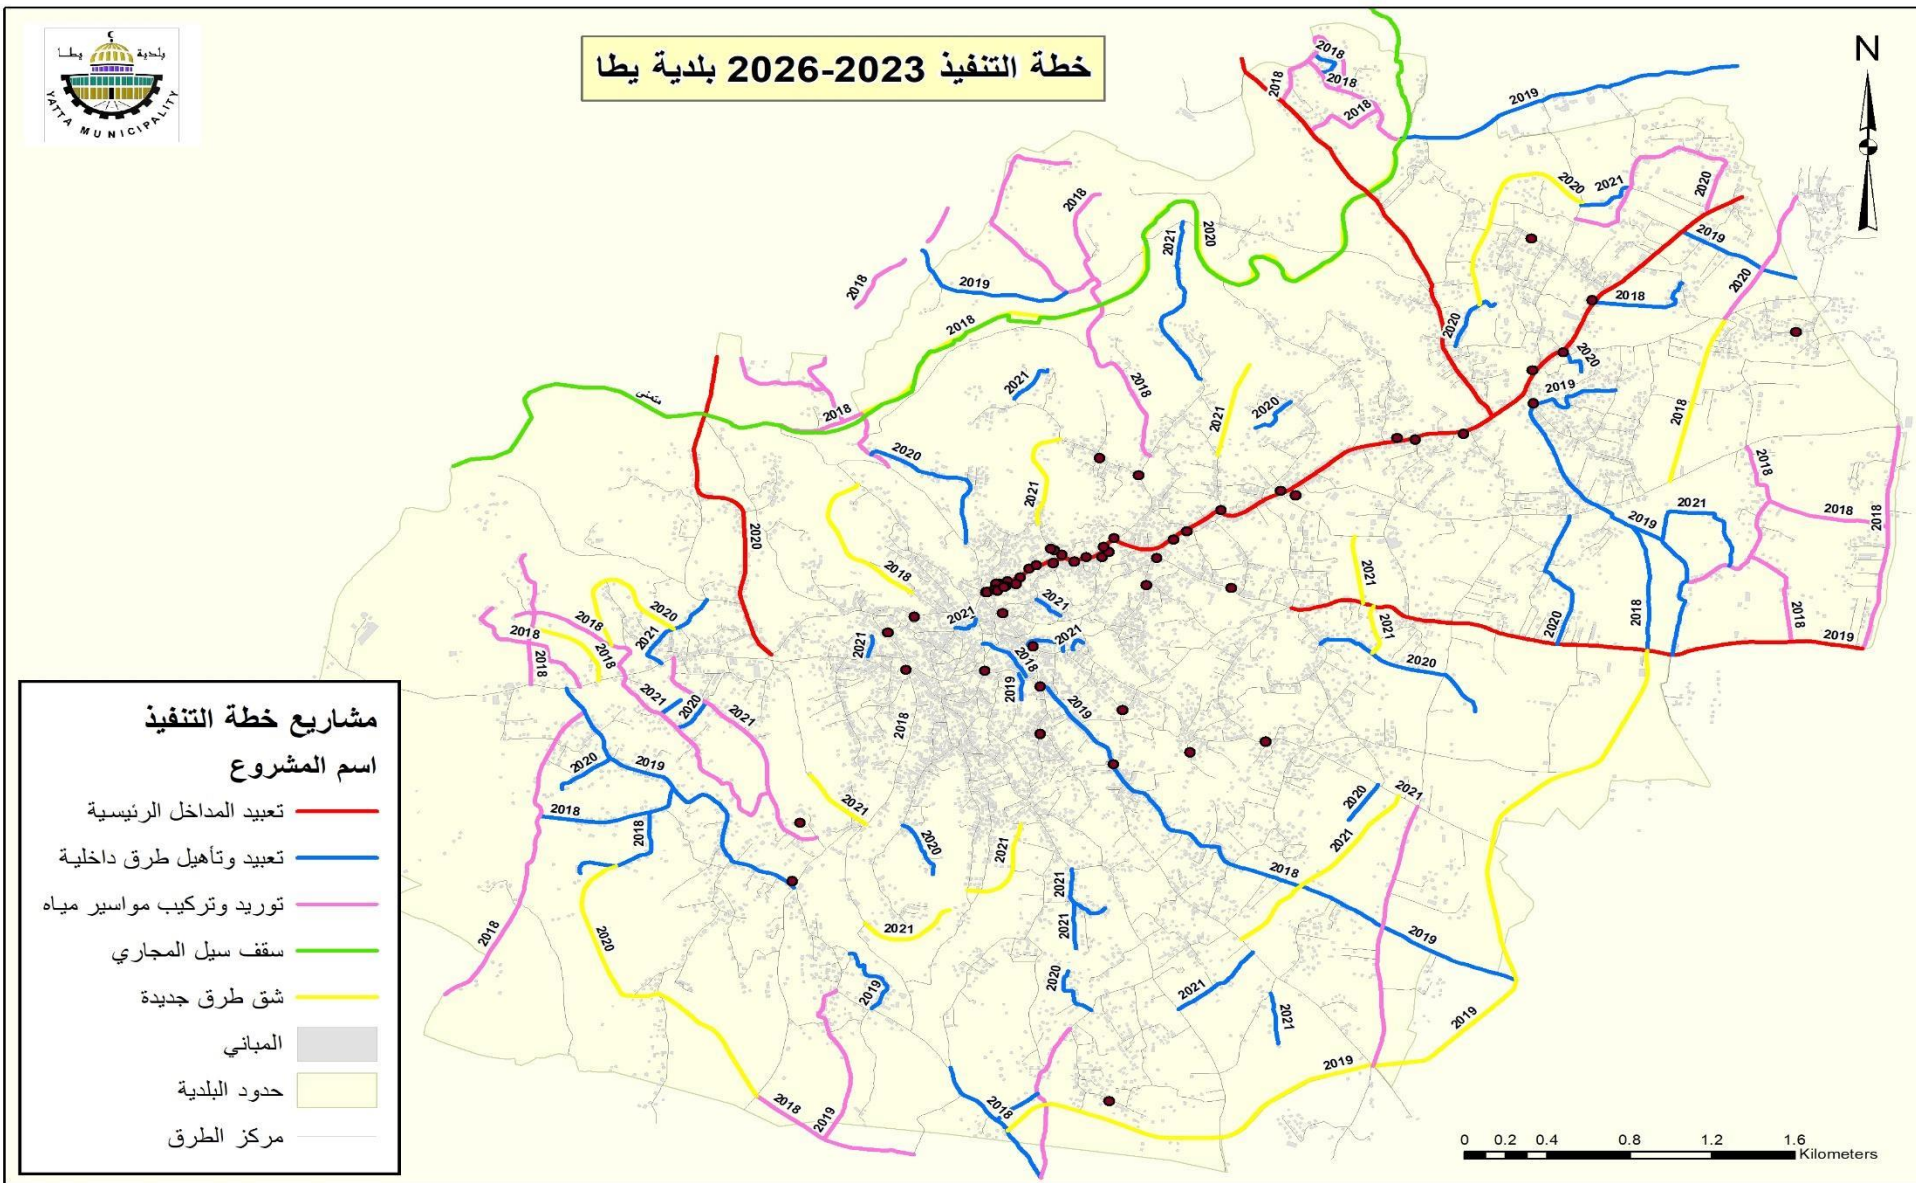



التنمية الاجتماعية 2023-2026

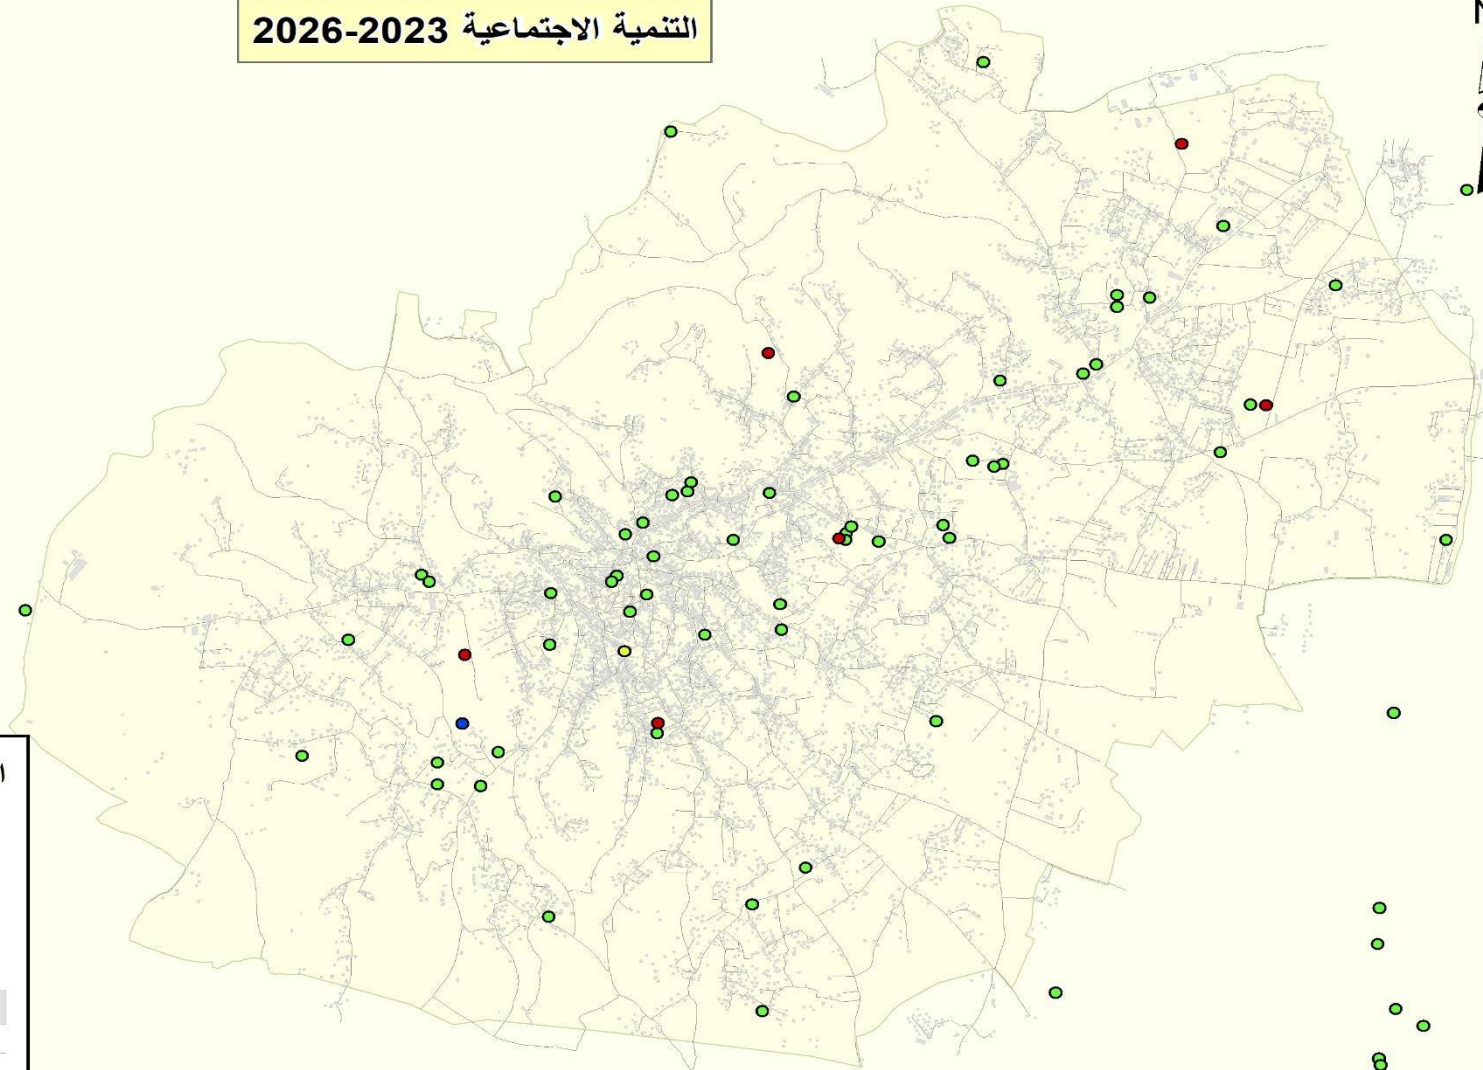

المشاريع الحيوية 2023-2026



المشاريع_الحوية

<Null>

الدفاع المدني

المركز التجاري

المركز المجتمعي

المسلخ

الملعب

الهلال الاحمر

ترميم البلدة القديمة

خلايا شمسية

سوق الخضار

سوق المواشي

التمية المجتمعية

مدارس قائمة

مدارس مقترحه


توسعة مستشفى ابو الحسن

مبنى مديرية الصحة

المباني

مركز الطرق

حدود البلدية

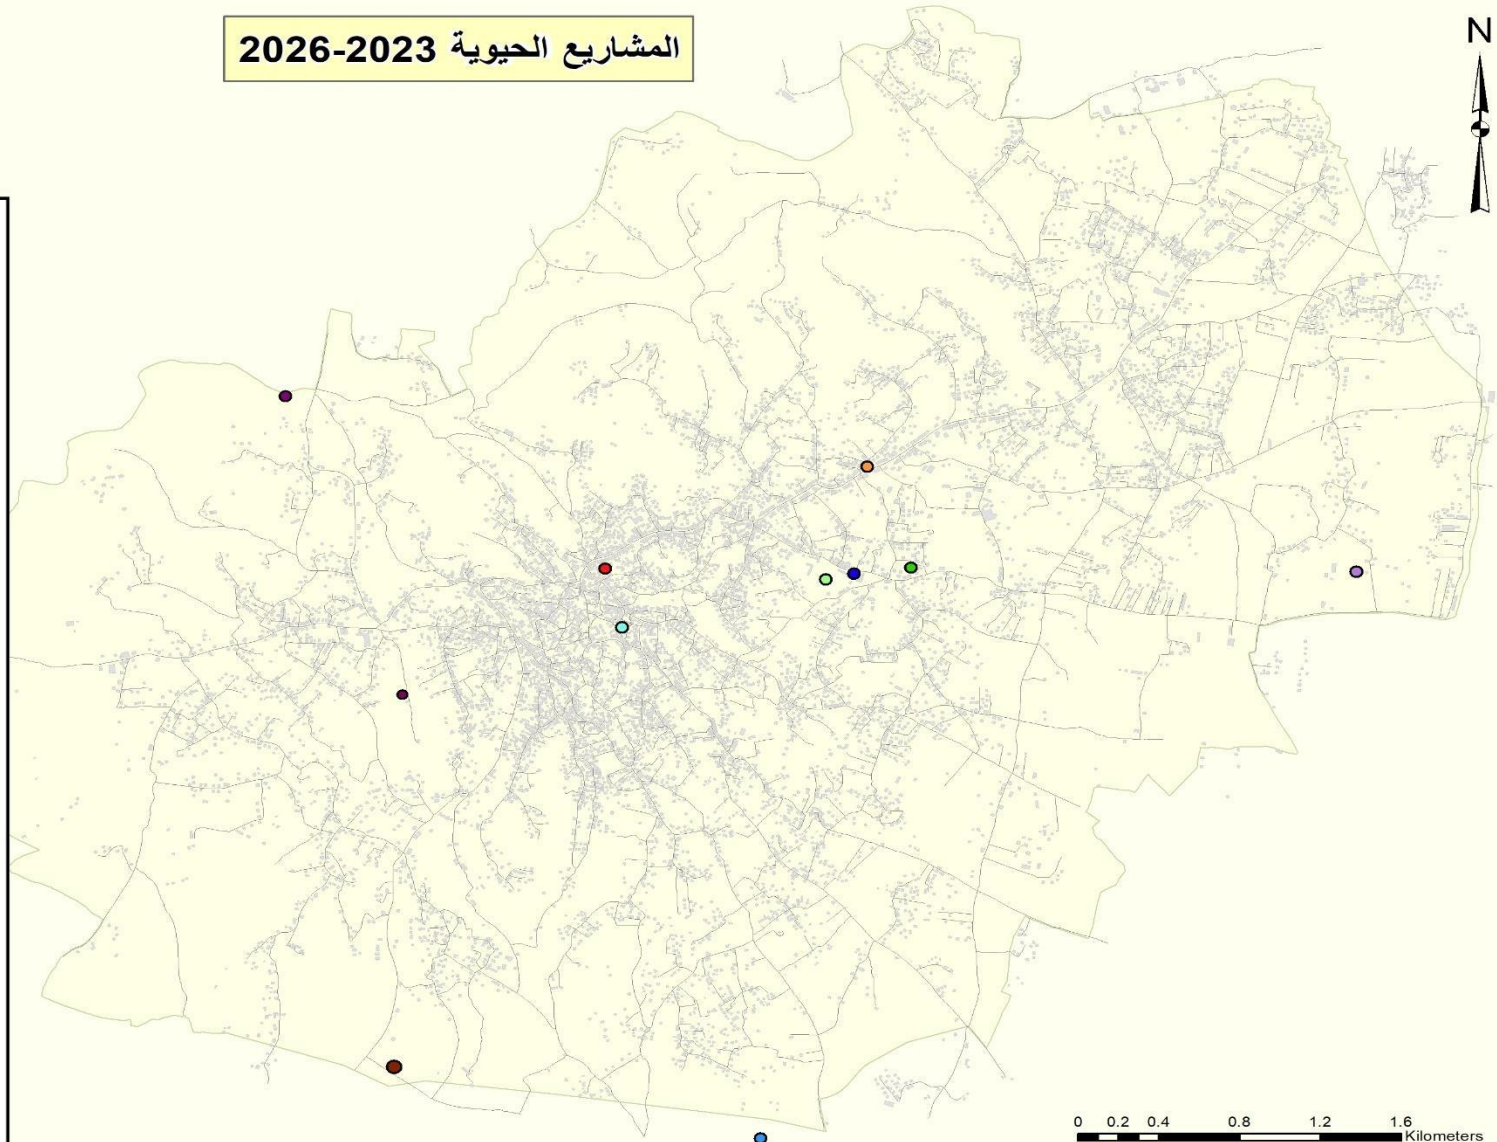

0 0.2 0.4 0.8 1.2 1.6 Kilometers

10.1 اللجان التي شاركت في اعداد الخطة

10.1.1 الفريق الأساسي

الرقم	اسم العضو/ة	دوره/ا في الفريق (منسق/عضو)	المؤسسة التي يعمل /تعمل بها	مجال الاهتمام	المسمى الوظيفي في المؤسسة	الجنس		العمر	
						ذكر	أنثى	16-29	فوق 29
1	م. إياد حماد	منسق الخطة التنموية	بلدية يطا	كافة القطاعات	التخطيط الاستراتيجي	✓			✓
2	طالب النجار	لجنة التخطيط المحلية	بلدية يطا	كافة القطاعات	عضو بلدية	✓			✓
3	أ. جميل النواجة	لجنة التخطيط المحلية	بلدية يطا	كافة القطاعات	عضو بلدية	✓			✓
4	عبد الكريم شريتح	لجنة التخطيط المحلية	بلدية يطا	كافة القطاعات	عضو بلدية	✓			✓
5	ميسون أبو عيد	لجنة التخطيط المحلية	بلدية يطا	كافة القطاعات	عضو بلدية		✓		✓
6	أ. هاني أحمد الحمادة	منسق	مديرية التربية والتعليم	التنمية الاجتماعية	رئيس قسم التخطيط	✓			✓
7	م. ايهاب أبو زهرة	منسق	بلدية يطا	البيئة والبنية التحتية	رئيس قسم التخطيط	✓			✓
8	صدام ادعيس	منسق	مديرية التنمية الاجتماعية	الإدارة والحكم الرشيد	IT	✓			✓
9	احمد إبراهيم الهدار	منسق	مالي متقاعد	الاقتصاد المحلي	مشرف	✓			✓
10	نهلة أبو قبيلة	عضوة	بلدية يطا	الإدارة والحكم الرشيد	رئيس خدمات الجمهور		✓		✓
11	م. فداء شريتح	عضوة	بلدية يطا	الإدارة والحكم الرشيد	رئيس الأبنية والتنظيم		✓		✓
12	بسمة غطاشة	عضوة	مديرية التنمية الاجتماعية	التنمية الاجتماعية	نائب المدير		✓		✓
13	م. تمارا الهريني	عضوة	بلدية يطا	الإدارة والحكم الرشيد	رئيس قسم شؤون الموظفين		✓		✓
14	عبير أبو علي	عضوة	جمعية سيدات يطا	التنمية الاجتماعية	رئيسة الجمعية		✓		✓
15	ياسين سميرات	عضو	جمعية بطا الخيرية وشخصية اعتبارية	الاقتصاد الإدارة والحكم الرشيد	مجلس الإدارة	✓			✓
16	رشاد أبو حميد	عضو	نرسان الثقافي	التنمية الاجتماعية	مجلس الإدارة	✓			✓
17	د. عمر محمد	عضو	مركز مجتمعي بلدية يطا	التنمية الاجتماعية	رئيس المركز	✓			✓
18	عبد العزيز أبو فنار	عضو	بلدية يطا	كافة القطاعات	إعلامي	✓			✓
19	محمد حسين نصار	عضو	الدفاع المدني	الإدارة والحكم الرشيد	ملازم أول - مهندس	✓			✓
20	عمار شريتح	عضو	بلدية يطا	التنمية الاقتصادية	مدير وحدة الاستثمار	✓			✓

الرقم	اسم العضو/ة	دوره/ا في الفريق (منسق/عضو)	المؤسسة التي يعمل/تعمل بها	مجال الاهتمام	المسمى الوظيفي في المؤسسة	الجنس		العمر	
						ذكر	أنثى	16-29	فوق 29
21	جواد غنام	عضو	نادي شباب يطا	التنمية الاجتماعية	إداري	✓			✓
22	محمد علي نصار	عضو	بلدية يطا	كافة القطاعات	مدير البلدية	✓			✓

10.1.2 لجنة البيئة والبنية التحتية

الرقم	الاسم	الجنس	مكان العمل	المسمى	رقم الاتصال	العمر	
						15-29	فوق 29
1	م. خليل أبوعرام	ذكر	بلدية يطا	مدير دائرة الخدمات العامة	0562400500		*
2	محمد خليل زين	ذكر	بلدية يطا	رئيس قسم الصحة	0562400503		*
3	فارس خالد داود	ذكر	بلدية يطا	رئيس قسم النفايات الصلبة	0562400454		*
4	رائد أبوصبحه	ذكر	بلدية يطا	رئيس قسم الصيانة	0562400502		*
5	م. محمد صابر أبوعرام	ذكر	بلدية يطا	رئيس قسم الدينمو ميتر	0562400		*
6	م. نبيل النواجعة	ذكر	شركة كهرباء الجنوب	قسم التخطيط			*
7	م. محمد أبو صبحه	ذكر	شركة كهرباء الجنوب	قسم المشاريع	0599608764		*
8	م. بيسان بحيص	انثى	بلدية يطا	مهندسة خدمات الجمهور			*
9	جهاد أبو عواد	ذكر	دائرة سير يطا				*
10	سمير حريزات	ذكر	الاتحاد العام لعمال فلسطين	رئيس الاتحاد	0569000041		*
11	م. ريم العسود	أنثى	شركة الفخر للمقاولات	مديرة مشاريع	0598157415		*
12	غازي مغنم	ذكر			0599206209		*
13	حمزة الحرباوي	ذكر	مديرية سير يطا	مدير الدائرة	0599187842		*
14	م. فداء شريطح	انثى	بلدية يطا	رئيس قسم الابنية	0562400441		*
15	م. نادر النجار	ذكر	مكتب هندسي	مدير المكتب	0599126888		*
16	م. مازن مهانية	ذكر	بلدية يطا	مراقب أبنية	05624000442		*
17	م. علي أبو صبحه	ذكر	بلدية يطا	مهندس مشاريع	0562400544		*

الرقم	الاسم	الجنس	مكان العمل	المسمى	رقم الاتصال	العمر	
						15-29	فوق 29
18	م. روان محمد حوشية	أنثى	متطوعة	*	05977639436	*	
19	م. دانية ياسر شعيب	أنثى	متطوعة	*	0595766608	*	
20	م. أنوار جبر عواد	أنثى	متطوعة	*	0569090501	*	

10.1.3 لجنة تنمية الاقتصاد المحلي

الرقم	الاسم الرباعي	الجنس	مكان العمل	رقم النقال	العمر
1	د. حجازي دعاجنة	ذكر	جامعة الخليل	0598127175	أكبر من 29
2	أيه محمد الجبور	أنثى	-	0594927589	أقل من 29
3	م. عماد أحمد	ذكر	مديرية زراعة يطا	0592055635	أكبر من 29
4	ذكريات أبو زهرة	أنثى	-	0503589985	أقل من 29
5	1. جميل النواجدة	ذكر	التربية والتعليم	0562400159	أكبر من 29
6	1. عبد الكريم شريتح	ذكر	بلدية يطا	0598844005	أكبر من 29
7	د. عماد المصري	ذكر	التربية والتعليم	0599080807	أكبر من 29
8	نوال إسماعيل قرعيش	أنثى	-	0598183169	أكبر من 29
9	أمامة أحمد مصري	أنثى	-	0592632272	أقل من 29
10	1. عيسى حسن مخامرة	ذكر	التربية والتعليم	0598689550	أكبر من 29
11	م. نادر النجار	ذكر	مكتب هندسة معمارية	0599126888	أكبر من 29
12	نهلة أبو قبيطة	أنثى	بلدية يطا	0568899989	أكبر من 29
13	سوار كامل حمد	أنثى	المركز التخصصي للعلوم والتكنولوجيا	0595390136	29
14	عمار شريتح	ذكر	بلدية يطا	0562400600	أكبر من 29
15	ياسين سميرات	ذكر	قطاع خاص	0569070772	أكبر من 29
16	م. هيثم حمامة	ذكر	بلدية يطا	0592960593	أكبر من 29
17	خليل أبو زهرة	ذكر	غرفة تجارة وصناعة الجنوب	0597777760	أكبر من 29

10.1.4 لجنة التنمية الاجتماعية

الرقم	الاسم الرباعي	الجنس	مكان العمل	رقم النقال	العمر
1.	عفاف محمد شحادة مخامرة	انثى	مدرسة بنات شهداء يطا الثانوية	0562501984	29 فما فوق
2.	جميل نواجعه	ذكر	التربية والتعليم	0562400159	29 فما فوق
3.	عبير سمير سليمان حريزات	انثى	جمعية سيدات يطا / ضريبة الاملاك	0598423049	29 فما فوق
4.	شاهر محمود يونس ادعيس	ذكر	وزارة الصحة مديرية صحة يطا	0599428803	29 فما فوق
5.	شفاء موسى اسماعيل هريني	انثى	بنات الشهيد كمال الصريع الثانوية	0562502007	29 فما فوق
6.	سحر عمر أبو زهرة	انثى	بنات الشهيد كمال الصريع الثانوية	0562502007	من 15-29
7.	مجدي يوسف عيسى عبد ربه	ذكر	مدرسة ذكور زيف الثانوية	0562501991	29 فما فوق
8.	عمر خليل محمد محمد	ذكر	مركز بلدية يطا المجتمعي	0562400610	29 فما فوق
9.	خلف خليل يوسف ادعيس	ذكر	جامعة القدس المفتوحة	0598027242	29 فما فوق
10.	أسمهان محمد محمود شواهين	انثى	مديرية التربية يطا	0568228036	29 فما فوق
11.	عيسى مصطفى موسى النجار	ذكر	مستشفى يطا	0562401846	29 فما فوق
12.	رشاد سمير احمد ابو حميد	ذكر	مركز نرسان الثقافي	0599352058	29 فما فوق
13.	بسمة غطاشة	انثى	التنمية/يطا	0594243523	29 فما فوق
14.	اثير عطا الله حسن خلايلة	انثى	مدرسة بنات شهداء يطا الثانوية	0595329534	من 15-29
15.	محمد ماجد إبراهيم زين	ذكر	ذكور يطا الثانوية		من 15-29
16.	جبر حميدات	ذكر	مديرية اوقاف يطا	0592061277	29 فما فوق

17	جمال خلاوي	ذكر	وزارة السياحة	059201153 9	29 فما فوق
18	اسراء احمد الجبور	انثى	بلدية يطا	059779246 6	من 15-29
19	رنيم محمود اعمر	انثى	بلدية يطا	059879559 4	من 15-29
20	مرح باسل عواودة	انثى	بلدية يطا	059945242 0	من 15-29

10.1.5 لجنة الأمن و الإدارة والحكم الرشيد

الرقم	الاسم الرباعي	الجنس	مكان العمل	رقم النقال	العمر
1.	د. حجازي دعاجنة	ذكر	جامعة الخليل	059812717 5	أكبر من 29
2.	شاهر محمود ادعيس	ذكر	مديرية صحة يطا	056240217 8	أكبر من 29
3.	د. عناد النواجدة	ذكر	جمعية يطا للتعليم العالي	059981485 0	أكبر من 29
4.	نضال حسن الهريني	ذكر	مستشفى يطا الحكومي	056885853 7	أكبر من 29
5.	م. خلف خليل ادعيس	ذكر	جامعة القدس المفتوحة	059802724 2	أكبر من 29
6.	نهلة أبو قببطة	أنثى	بلدية يطا	056889998 9	أكبر من 29
7.	ملازم اول محمد نصار	ذكر	الدفاع المدني	059897441 6	أقل من 29
8.	م. حسام أبو زهرة	ذكر	محافظة بيت لحم	056280061 5	أكبر من 29
9.	م. محمد عادل ربيع	ذكر	عمل خاص - مقاولات	059755498 7	29
10	سعيد حوشية	ذكر	شركة SELCO	059891073 6	أكبر من 29
11	مفيد الهروش	ذكر	جامعة القدس المفتوحة	059955776 3	أكبر من 29

الرقم	الاسم الرباعي	الجنس	مكان العمل	رقم النقال	العمر
12	أشرف إبراهيم البيراوي	ذكر	التنمية الاجتماعية	059942367 2	أكبر من 29
13	محمد حسن علايا الهريني	ذكر	مديرية الأوقاف	059763547 4	أكبر من 29
14	سوار كامل حمد	أنثى	المركز التخصصي للعلوم والتكنولوجيا	059539013 6	29
15	م. فداء شريتح	أنثى	بلدية يطا	056240044 1	أكبر من 29
16	م. هيثم حمامة	ذكر	بلدية يطا	059296059 3	أكبر من 29
17	م. مازن مهانية	ذكر	بلدية يطا	056240044 2	أكبر من 29
18	محمد أبو غنيم	ذكر	جمعية عين شمس	059553007 3	أكبر من 29
19	م. محمود أبو قبيطة	ذكر	بلدية يطا	056240046 2	أكبر من 29
20	ناصر أبو علي	ذكر	الارتباط المدني – ناشط شبابي	056918319 2	أقل من 29

10.2 البرامج التنموية

10.2.1 رفع كفاءة قطاع الطرق والمواصلات

رقم البرنامج (01/EI)

1. مقدمة: وجود الطرق يجعل حركة تنقل المواطنين أسهل وأكثر أماناً، حيث تتعهد البلدية بمهمة شق وتعبيد وتأهيل الطرق بشكل مناسب، ويوجد في المدينة شبكة طرق واسعة تضم طرق رئيسية وشريانية وفرعية وغيرها كالزراعية، وبسبب الطول الكبير لشبكة الطرق في المدينة فإننا نحتاج إلى مبالغ وتمويل ضخم من أجل شق وتعبيد الطرق أو إعادة تأهيلها بعد انتهاء العمر الافتراضي لها، لذا تعاني المدينة من وضع الطرق المزري، فغالبيتها غير مؤهلة و غير آمنة خاصة خلال فصل الشتاء وضعف تصريف مياه الأمطار فيها، وتفتقد للأرصفة والإنارة وعوامل السلامة والأمان عليها.

المواصلات هي إحدى أهم الخدمات في حياة الإنسان، يعتمد عليها في التنقل والسفر من مكان إلى آخر، وكما ذكرنا في التقرير التشخيصي وجود خطوط مواصلات خارجية إلى الخليل، رام الله، بيت لحم وأريحا، من خلال سيارات العمومي ذات الـ 7 ركاب، وتفتقد المدينة إلى خطوط الباصات والسرفيس الداخلي ويعتمد المواطنين على التنقل الداخلي من خلال سيارات خاصة نسبة منها غير قانونية، علماً أن مديرية النقل والترخيص ونقابة سائقي العمومي بمساعدة البلدية تدير هذا القطاع، بالإضافة إلى ذلك تعاني المدينة من غياب موقف للسيارات العمومية لتنظيم حركة السير والمواصلات فيها.

كذلك تعاني المدينة من الازدحام المروري في عدة مقاطع من الشارع الرئيسي، بسبب عشوائية استخدام الطريق، و عرضه غير المناسب، بالإضافة لاستخدام السيارات غير القانونية، وغياب لخطط مرورية فعالة في المدينة تنظم حركة السير.

وجب علينا خلال هذا البرنامج التركيز على هذا القطاع بعدة مشاريع منها إعادة تأهيل 5 من مداخل المدينة، بطول يصل إلى 15 كم (الشارع الرئيسي، مدخل قلقس، مدخل خلة المية، مدخل الكرمل، مدخل الريحية)، وتعبيد وتأهيل حوالي 30 كم من الطرق الداخلية والرابطة، وشق ما يقارب من 20 كم من الطرق المقترحة على المخطط الهيكلي والتي من شأنها التخفيف على المواطنين ومعاناتهم.

واستكمال مشروع مجمع السيارات العمومية ، والحصول على عدد من خطوط البيرمت الداخلي (السرفيس الداخلي) داخل مناطق المدينة، وربط المدينة مع تجمعاتها المحيطة مثل الكرمل و خلة المية وبيت عمرة، وتركيب إشارتي مرور على أكثر المفترقات خطورة وازدحاما.

كذلك تنظيم حركة السير والمرور من خلال وضع خطط مرورية وإشارات مرورية في أكثر من موقع

2. النتائج المتوقعة: بعد تنفيذ هذا البرنامج سنحصل على شبكة طرق مؤهلة ومناسبة لاستخدام المواطنين و موائمة لذوي الاعاقة، وستزيد نسبة الطرق المعبدة والمؤهلة بشكل جيد على الطرق الترابية والمعبدة ولكنها بحالة سيئة، و تنظيم وتفعيل قطاع المواصلات والمرور ، حيث سنحصل على مجمع للسيارات العمومية، وإشارات مرور و خطوط للسرفيس الداخلي على رأس عملها.

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
الطرق المعبدة	125 كم	180 كم
عدد المداخل الرئيسية المؤهلة بشكل مناسب	1	6
عدد المركبات العمومية الداخلية	0	52
عدد مواقف السيارات العمومية	0	1
عدد إشارات المرور الموجودة	0	2
نسبة شق طرق مقترحة من المخطط الهيكلي	5%	35%

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 4 سنوات

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: جميع سكان مدينة يطا داخل المخطط الهيكلي (90,000 مواطن)، وجميع أهالي

المدينة الذي يتجاوز عددهم 110 ألف مواطن

5. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
1. بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
تعبيد 5 مداخل رئيسية بطول 15 كم.	000,000,6	البلدية جهات مانحة	فني مالي
تعبيد 30 كم من طرق المدينة الداخلية والرابطة.	4,500,000	البلدية جهات مانحة	مالي فني
شق 20 كم من الطرق المقترحة ضمن المخطط الهيكلي	500,000	البلدية جهات مانحة	مالي فني
موائمة الطرق لذوي الإعاقة حسب المخططات والدراسات	60,000	البلدية جهات مانحة	مالي فني
استكمال موقف السيارات العمومية	300,000	وزارة المواصلات جهات مانحة	فني مالي
تركيب إشارات مرور عدد 2	300,000	وزارة المواصلات جهات مانحة	مالي فني
2. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:			
تدريب مهندسي الإشراف ورفع قدراتهم في متابعة تنفيذ المشاريع وإعداد التقارير	20,000	البلدية جهات مانحة	إداري ومالي
تشغيل 52 خط بيرمت داخلي	300,000	وزارة النقل والمواصلات	إداري ومالي
3. دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:			
- دراسة للأثر البيئي. - دراسة حول واقع المدينة لتحديد الاحتياجات وعدد السيارات العمومية المطلوبة	20,000	بلدية يطا	إداري وفني مالي
التكلفة الإجمالية	12,000,000		

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج: التمويل، مخطط هيكلي يضم الطرق المعنية، توفر المواد المختلفة لتعبيد الطرق و بناء مجمع السيارات.

10.2.2 تحسين الموارد المائية وتطوير الصرف الصحي وبنيتها التحتية رقم البرنامج (02/EI).

1. مقدمة: تعتبر خدمة المياه من أهم الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، فهي شريان الحياة والاقتصاد، ويتوقف عليها التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تعاني المدينة من نقص في كمية المياه المزودة، وسوء بعض خطوط الشبكة الداخلية، وكانت الشبكة تغطي أكثر من 85% من مساحة البلدية قبل التوسعة الأخيرة، وبعد ضم عدد من الأحياء والأراضي أصبحت الشبكة تغطي حوالي 75% منها.

خدمة المياه في المدينة تقع ضمن مهام ومسؤولية البلدية، التي تسعى دائما لرفع أدائها في تقديم هذه الخدمة، رغم المعوقات التي تواجهها ومن أهمها التمويل اللازم.

يهدف البرنامج إلى تغطية معظم أراضي المخطط الهيكلي والحد من نسبة الفاقد في الشبكات، حيث سيقوم بتطوير وتوسعة الشبكة بطول 30 كم كخطوط رئيسية وفرعية وبأقطار مختلفة، واستبدال 20 كم من الخطوط القديمة بمواسير ذات أقطار أكبر وجودة أعلى للحد من الفاقد، وإعادة ترتيب الوصلات المنزلية واستبدال البرابيش العشوائية، وتركيب 5200 عداد مسبق الدفع، و استكمال مشروع USAID الذي توقف لسحب التمويل نتيجة عوامل سياسية، واستكمالته من خلال المشروع الهولندي الجاري حاليا والذي يشمل بناء خزانات مياه (عدد 2) داخل المدينة، وخزان في منطقة بيت عمرة، كذلك استبدال وتجديد لمعظم خطوط التوزيع الرئيسية، وعمل Master Plan واقعي لشبكات المياه، وتوفير ورش فنية متكاملة لقسم المياه ورفع قدرات العاملين فيه.

لا يوجد في المدينة شبكة صرف صحي، ويعتمد الأهالي على الحفر الامتصاصية غير الصماء، وهذا يؤدي إلى مشكلة بيئية كبيرة، من حيث تلوث المياه والتربة على حد سواء، فكانت هذه القضية من أهم أولويات المجتمع المحلي، ونأمل بتنفيذ هذا البرنامج خلال عمر الخطة الحالية، والذي يتكون من إعداد المخططات والمسوحات لشبكة صرف صحي، وتشمل جميع مساحة حدود البلدية، وعمل دراسة حول الأثر البيئي المتوقع مع إعداد دراسة جدوى واقعية، والحصول على التراخيص المطلوبة، والبدء الفعلي لإنشاء وتشغيل نواة لشبكة الصرف الصحي تغطي الجهة الشمالية والغربية للمدينة (ابتداء من الشارع الرئيسي خليل الرحمن)، بمساحة إجمالية تقدر ب 10 آلاف دونم، يتم ربطها مع مجرى سيل المجاري الذي سيتم تغطيته ومعالجته بالتزامن مع تنفيذ هذا البرنامج.

2. النتائج المتوقعة: بعد تنفيذ المشروع نتوقع الحد من نسبة الفاقد بشكل ملحوظ وبالتالي زيادة حصة المواطن من المياه، والحصول على شبكة مياه بمواصفات عالية وذات عمر افتراضي أكبر، وزيادة نسبة تحصيل ثمن المياه من المواطنين.

وجود نواة شبكة صرف صحي تغطي جزء من مساحة المدينة ، مما يسهل استكمال الشبكة لتشمل كامل حدود البلدية في المرحلة التالية عند انتهاء الخطة خصوصا مع توفر المخططات والدراسات والموافقات المطلوبة.

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
نسبة تغطية شبكة المياه.	75%	100%
عدد خزانات المياه في المدينة	4	6

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
نسبة الفاقد من شبكة المياه	30%	17%
نسبة تحصيل ثمن المياه من المواطن.	30%	100%
عدد الورش الفنية المؤهلة بشكل كامل في البلدية	0	1
حصة الفرد من المياه يوميا	25 لتر	73 لتر
عدد الدورات التدريبية لموظفي قسم المياه سنويا	1	5
عدد اشتراكات المياه	5200	10000
عدد اشتراكات المياه مسبقة الدفع	0	5,200
المساحة المشمولة بشبكة صرف صحي	0 دونم	10,000 دونم
عدد الحفر الامتصاصية في المنطقة الشمالية الغربية من المدينة	2,500	500

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 4 سنوات

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: جميع سكان مدينة يطا داخل المخطط الهيكلي (90,000 مواطن).

5. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (اداري، مالي، وفني)
1. بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
اكمال المرحلة الأولى من مشروع شبكة مياه يطا	6,300,000	البلدية جهات مانحة مجتمع محلي اتحاد مزودي خدمة المياه	فني مالي حشد دعم الأهالي
توفير ورشة فنية متخصصة بالصيانة لقسم المياه في البلدية تحتوي على المعدات والآليات والأجهزة الضرورية	300,000	البلدية سلطة المياه جهة مانحة	فني مالي

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (اداري، مالي، وفني)
ترتيب الوصلات المنزلية وتركيب 5200 عداد مياه مسبق الدفع	1,000,000	البلدية سلطة المياه	مالي فني
عمل شبكة Master Plan واقعية ومحدثة لشبكة المياه	50,000	البلدية	فني مالي
إبرام اتفاقية جديدة مع سلطة المياه لزيادة حصة المدينة	000,10	البلدية	مالي فني
أعمال توريد و تمديد مواسير للصرف الصحي حسب الأطوال والأقطار في المخططات والدراسات	2,000,000	البلدية سلطة المياه جهة مانحة	مالي فني
أعمال توصيل وربط المنازل على شبكة الصرف الصحي	500,000	البلدية سلطة المياه جهة مانحة	مالي فني
اكمال مشروع سقف السيل الجاري حاليا	9,000,000	البلدية سلطة المياه جهة مانحة	مالي فني
2. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:			
تشغيل وتدريب طاقم محلي	200,000	البلدية سلطة المياه جهة مانحة	اداري ومالي
استقطاب كفاءات خارجية كفوءة للتشغيل وتدريب الطاقم المحلي	100,000	البلدية سلطة المياه جهة مانحة	اداري ومالي
3. دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:			
- دراسة حول واقع المياه ومكونات النظام المائي في المدينة	50,000	بلدية بطا جهات مانحة مكاتب استشارية	اداري وفني مالي

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (اداري، مالي، وفني)
دراسة حول الأثر البيئي لمشاريع الصرف الصحي خصوصاً	50,000	بلدية يطا جهات مانحة مكاتب استشارية	اداري وفني مالي
أتمتة المياه والصرف الصحي على برامج سكادا و GIS	120,000	بلدية يطا جهات مانحة مكاتب استشارية	اداري وفني مالي
دراسات جدوى اقتصادية	20,000	بلدية يطا جهات مانحة مكاتب استشارية	اداري وفني مالي
التكلفة الإجمالية	19,700,000		

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج: مواسير مختلفة الأقطار، عدادات مياه دفع مسبق ذات جودة عالية، التمويل، حشد ودعم جماهيري

10.2.3 تعزيز وتنويع مصادر الطاقة وجودتها رقم البرنامج (03/EI)

1. مقدمة:

تحصل مدينة يطا على خدمة الكهرباء لشبكة الجهد المتوسط والجهد المنخفض من خلال ربطها بشبكة شركة كهرباء الجنوب صاحبة الامتياز لتوزيع الطاقة الكهربائية في المنطقة والتي بدورها تستمد الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية على خطوط التغذية 33 كيلوفولت، وتضم الشركة كل من مناطق دورا و الظاهرية ويطا، حيث تتواجد مقرات مملوكة للشركة في مركز كل مدينة بالإضافة للمركز الرئيسي للشركة ومستودعها الأساسي في منطقة الهجرة، وتعتبر المدينة اكبر المساهمين في شركة كهرباء الجنوب وتقع ضمن منطقة الوسط التي تمر بها الشبكات الرئيسية للشركة، ويوجد على مدخلها الجنوبي الغربي نقطة الربط الوحيدة مع الشبكة القطرية وشملت العديد من مشاريع التطوير وإعادة التأهيل لشبكات الضغط العالي والمتوسط ومحطات التوزيع.

وتقوم شركة كهرباء الجنوب بتوصيل الخدمة الكهربائية للمشاركين بالمدينة وتطوير الشبكات والمحطات الكهربائية لملائمة التطور السكاني والعمراني وبجباية رسوم استهلاك الكهرباء من خلال عدادات الدفع المسبق والفاتورة للمشاركين حيث بلغت نسبة عدادات الدفع المسبق حوالي 90% من المجمال العام . ويوجد في مدينة يطا نحو 11,200 مشترك منزلي وصناعي وتجاري ويشار إلا أن هذه الإحصائية بناء على سجلات شركة كهرباء الجنوب. حيث أن الاشتراكات الصناعية تتوزع بشكل عشوائي داخل المدينة وتضم الصناعات الحرفية الخفيفة ومناشير الحجر ومصنع ورق أما المنطقة الصناعية بالمدينة فتقع في المنطقة الغربية واغلبها محاجر .

بالرغم من جودة الشبكات والمحطات الجيدة، إلا أن المدينة تعاني من انقطاع متكرر للتيار خصوصا في فصل الشتاء، وذلك بسبب الاحمال الزائدة على الشبكة، وبسبب كون نقط الربط التي تغذي المدينة غير كافية يتكون هذا البرنامج من عدة أنشطة أهمها العمل على تفعيل نقطة ربط جديدة في الجهة الشمالية الشرقية (زيف)، وتحسين الشبكة والبنية التحتية من خلال تركيب محطات تقوية جديدة عدد 23، واستبدال شبكة الألمنيوم بالكابل المعزول، وتركيب 20 كم شبكة ضغط متوسط، وتركيب وحدات LED لإنارة طرق المدينة، وتفعيل الاعتماد على الخلايا الشمسية ودعم الحصول على الطاقة البديلة.

2. النتائج المتوقعة: بعد استكمال البرنامج سيزيد رضا المواطن خدمة الكهرباء كون الانقطاع سيكون محصورا بشكل لافت، كذلك وجود شبكة داخلية قوية ومؤهلة أكثر. بالإضافة لتركيب خلايا شمسية وانتشارها بين المواطنين

والمؤسسات

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
عدد نقاط الربط	2	3
طول شبكة الضغط المتوسط	102 كم	122 كم
عدد محطات التقوية	157	180
نسبة تغطية الإنارة لشوارع المدينة	50%	90%
عدد الاشتراكات المختلفة	14,458	20,000
نسبة كوابل ABC	98.5%	100%

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 4 سنوات

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: جميع سكان مدينة يطا داخل المخطط الهيكلي (90,000 مواطن).

5. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (اداري، مالي، وفني)
1. بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
توريد وتركيب 23 محطة تقوية	1,000,000	البلدية SELCO	فني مالي
تمديد 20 كم شبكة ضغط متوسط	700,000	البلدية SELCO	فني مالي
استبدال 3 كم من شبكة الضغط المنخفض الألمنيوم بكوابل معزولة	100,000	البلدية SELCO	مالي فني
تشغيل وتركيب نقطة ربط جديدة	50,000	البلدية SELCO	إداري ومالي

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (اداري، مالي، وفني)
تركيب شبكات جهد منخفض ABC بطول 30 كم	1,000,000	البلدية SELCO	إداري ومالي
تركيب خلايا شمسية لإنتاج الطاقة البديلة عدد 10 بقدره إنتاجية مختلفة	2,000,000	البلدية SELCO	إداري ومالي
2. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:			
تدريب طواقم الشركة (فنيين واداريين)	50,000	SELCO	إداري ومالي
3. دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:			
- دراسة حول كمية الكهرباء المطلوبة فعلياً بالاعتماد على عدد السكان واستخدام الكهرباء، وعمل قاعدة بيانات شاملة لقطاع الكهرباء	25,000	بلدية يطا جهات مانحة مكاتب استشارية	اداري وفني مالي
حملات توعية للحد من التعدي على الشبكة وتقليل نسبة الفاقد	50,000	SELCO	إداري ومالي
التكلفة الإجمالية	4,975,000		

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج: التمويل، موافقة الجانب الإسرائيلي على نقطة ربط جديدة، المعدات والمحطات والكوابل، حشد ودعم الأهالي.

10.2.4 تنمية الصناعة المحلية ومكوناتها

رقم البرنامج (01/EC).

1. مقدمة: بدأ المجتمع باعتماده على الرعي وتربية الماشية (حياة البادية)، ينتقل من مكان إلى آخر، ثم استقر وبدأ يعمل في المجال الزراعي أيضاً، ثم بدأ بالتطور شيئاً فشيئاً، فأصبح يعتمد على الصناعة بالإضافة للأمور السابقة، وذلك مواكبة للتطور ودخول التكنولوجيا في حياتنا، وبدأ المجتمع يعمل على المواد الخام وكيفية تحويلها من شكل ومادة إلى شكل آخر ومادة أخرى.

حيث وجدت عدة أنواع من الصناعة منها: (البدائية، البسيطة، الحديثة، الاستخراجية والتحويلية)، والمواد الخام أيضاً تقسم إلى (نباتية، حيوانية، ومعدنية).

ارتبطت بداية انطلاق النشاط الصناعي الآلي في المدينة باستخراج الحجر الذي اشتهرت به يطا، ومن ثم ظهور مشاغل قص الحجر (المناشير)، ومنه توسعت صناعات أخرى ارتبطت في غالبيتها باحتياجات توسع

المدينة العمرانية والزراعية، كمصانع الطوب والبلاط وخراطة الحجر. وأهم المنشآت الصناعية في المدينة (مناشير الحجر والبلاط والطوب، معاصر زيتون ، ورق صحي، مواد تنظيف، الحدادة والألمنيوم وغيرها من الحرف)

سوف يضم هذا البرنامج عدد من المشاريع من أهمها: تأهيل منطقة حرف وصناعات خفيفة، انشاء حاضنة أعمال تساعد على الاستثمار، تفعيل المجلس الاقتصادي المحلي والشراكة مع القطاع الخاص، توفير مصنع للأعلاف والأسمدة، برامج مشاريع صغيرة خصوصا للفئات المهمشة، مصنع لدباغة الجلود خصوصا بعد عمل المسلخ البلدي وغيرها

2. النتائج المتوقعة: وجود منطقة حرف وصناعات خفيفة ومؤهلة، انتشار لحاضنات الأعمال، مجلس اقتصادي محلي قوي وفعال، وجود مشاريع صغيرة على أرض الواقع للفئات المهمشة.

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
نسبة عدد العاملين في قطاع الصناعة	3%	10%
عدد المنشآت الصناعية المسجلة	50	200
عدد حاضنات الأعمال	0	1
عدد مناطق الحرف الخفيفة المؤهلة	0	1

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 4 سنوات

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: جميع سكان مدينة يطا داخل المخطط الهيكلي (90,000 مواطن).

5. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
1. بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
تأهيل نواة منطقة حرف وصناعات خفيفة	1,000,000	البلدية جهات مانحة القطاع الخاص	فني مالي
بناء وتشغيل مصنع لدباغة الجلود	500,000	البلدية وزارة الزراعة القطاع الخاص جهات مانحة	فني مالي
بناء وتشغيل مصنع للأعلاف والأسمدة	500,000	وزارة الزراعة جهات مانحة البلدية والقطاع الخاص	فني مالي
دعم وتمويل 40 مشروع صغير للفئات المهمشة	200,000	القطاع الخاص جهات مانحة الحكومة الفلسطينية	فني مالي

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
2. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:			
تدريب وتشغيل طاقم محلي	60,000	البلدية الحكومة الفلسطينية غرفة تجارة وصناعة الجنوب	إداري ومالي
انشاء حاضنة اعمال	50,000	البلدية الحكومة الفلسطينية غرفة تجارة وصناعة الجنوب	إداري ومالي
بناء قدرات الفئات المهمشة ودمجهم في مجال الصناعة الخفيفة	100,000	البلدية الحكومة الفلسطينية غرفة تجارة وصناعة الجنوب جهات مانحة	إداري ومالي
3. دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:			
عمل دراسة وقاعدة بيانات شاملة حول قطاع الصناعة ودراسة جدوي لكل نشاط	60,000	غرفة تجارة وصناعة الجنوب جهات مانحة الحكومة الفلسطينية	اداري وفني مالي
التكلفة الإجمالية	2,450,000		

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج: التمويل، قطع أراضي، مشاركة القطاع الخاص.

10.2.5 تعزيز جودة القطاع الزراعي ومكوناته

رقم البرنامج (02/EC).

1. مقدمة: يمتاز المجتمع البطاوي بكونه زراعيا، قديما كانت الزراعة مصدر الرزق الوحيد للاهالي، ومع تقدم السنوات وازدياد عدد السكان وانتشار الأبنية، ووجود مصادر رزق جديدة، أدت هذه العوامل إلى ضعف الاهتمام بالزراعة والتعدي على الأراضي الزراعية.

تملك المدينة ثروة حيوانية كبيرة ومميزة على مستوى الوطن، ولكنها تفتقد لسوق مواشي مؤهل ونموذجي، حيث يتم عقد سوق المواشي يومين أسبوعيا في قطعة أرض غير مؤهلة، وكذلك لا يوجد في المدينة سوق خضار مركزي (حسبة) تساعد على تسويق منتجات المزارعين و تسهيل الحركة الشرائية.

سيتم إدراج عدة مشاريع في هذا البرنامج منها تأهيل سوق نموذجي للمواشي، تأهيل سوق مركزي للخضار، واستصلاح أراضي زراعية بمساحة 1500 دونم، وشق طرق زراعية طول 60 كم، انشاء مسلخ بلدي، توفير مركز لتحسين السلالات، انشاء مشتل زراعي مؤهل لإنتاج الأشتال، آبار وبرك لجمع المياه والسدود وغيرها من المشاريع الحيوية التي تخدم هذا المجال

2. النتائج المتوقعة: سوق مواشي نموذجي و سوق مركزي للخضار ومسلخ بلدي ومركز لتحسين السلالات على أرض الواقع ، وزيادة امكانية الوصول للأراضي الزراعي جراء شق الطرق الزراعية.

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
عدد أسواق المواشي المؤهلة	0	1
عدد الأسواق المركزية للخضار والفواكة	0	1
عدد المسالخ المرخصة والمؤهلة	0	1
مشتل حكومي مؤهل	0	1
طول الطرق الزراعية التي يتم شقها سنويا	7 كم	15 كم
مساحة الأراضي المستصلحة سنويا	150 دونم	350 دونم
عدد مراكز تحسين السلالات	0	1

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 4 سنوات

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: جميع سكان مدينة يطا داخل المخطط الهيكلي (90,000 مواطن).

5. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
1. بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
تأهيل سوق مواشي نموذجي	000,650	البلدية وزارة الزراعة	فني مالي
إنشاء سوق خضار مركزي بالشراكة مع القطاع الخاص	860,000	البلدية وزارة الزراعة القطاع الخاص	فني مالي
انشاء مسلخ بلدي مؤهل	2,700,000	وزارة الزراعة جهات مانحة البلدية والقطاع الخاص	فني مالي

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
شق 60 كم من الطرق الزراعية	1,000,000	البلدية وزارة الزراعة جهات مانحة	فني مالي
استصلاح أراضي بمساحة 1000 دونم	1,000,000	وزارة الزراعة جهات مانحة	فني مالي
بناء وتشطيب وتشغيل مركز لتحسين السلالات	1,000,000	وزارة الزراعة جهات مانحة	فني مالي
انشاء مشتل متخصص ومؤهل لإنتاج الأشتال بمساحة 3 دونم	300,000	وزارة الزراعة جهات مانحة	فني مالي
انشاء 50 بئر جمع مياه و سدود عدد 2	700,000	وزارة الزراعة جهات مانحة	فني مالي
2. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:			
تدريب وتشغيل طاقم محلي	150,000	البلدية وزارة الزراعة	إداري ومالي
تفعيل الجمعيات التعاونية غير النشطة	50,000	وزارة الزراعة	إداري ومالي
3. دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:			
عمل دراسة وقاعدة بيانات شاملة حول قطاع الزراعة والثروة الحيوانية	300,000	وزارة الزراعة جهات مانحة	إداري وفني مالي
التكلفة الإجمالية	7,200,000		

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج: التمويل، قطع أراضي، موافقة الأهالي على شق الطرق الزراعية.

10.2.6 تنمية الترفيه والسياحة المحلية ومكوناتها

رقم البرنامج (EC/03).

1. مقدمة:

تعاني مدينة يطا من عدم وجود أماكن سياحية وترفيهية ومنتزهات داخلية، حيث يقوم المواطنون بالسفر إلى منتزهات وأماكن سياحية داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى، ويقصدوا مناطق الداخل خلال المواسم السياحية والأعياد حال تمكنهم من الحصول على التصاريح اللازمة، وهذا يكلفهم الكثير من الجهد والمال.

خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت بلدية يطا في تنفيذ مشروع منتزه بلدية يطا الأثري في الكرمل، وهو يقع خارج المخطط الهيكلي لبلدية يطا، على مساحة 13 دونم، وهو غير مكتمل حتى هذه اللحظة، حيث نفذت البلدية عدة مراحل عبر حصولها على تمويل من جهات مانحة، ومن ميزانيتها الذاتية، ونفذت مشاريع الأسوار والمدرجات وألعاب الأطفال وحماية البركة الأثرية، ومؤخراً بناء كافيتيريا داخلية للمنتزه، وبئر ماء، وتنفيذ مشروع إغلاق للمنتزه بالأسوار والشيك، حيث تبقت بعض المراحل من أهمها المسابح الداخلية وتأهيل القسم الشمالي الشرقي والساحات ومباني الخدمات، وبالرغم من عدم اكتمال المنتزه، فالأهالي تتراده للتنزه والاستجمام، وترفيه الأطفال من خلال الألعاب الموجودة، وأقامت البلدية فيه معرض ربيع يطا للترويج الاقتصادي والتجاري وبعض الفعاليات والندوات والأمسيات الثقافية والشعرية.

ولتعزيز وتطوير القطاع التراثي والسياحي في المدينة، نفذت البلدة عدت مشاريع ترميم للمباني العربية في البلدة القديمة، كما ذكر سابقاً في المجال الفرعي الثقافة والتراث ضمن المجال الرئيسي التنمية الاجتماعية.

تعمل البلدية والمدينة على تعزيز القطاع السياحي خلال السنوات القادمة من خلال إنشاء مسار سياحي جاذب للسياحة الداخلية والخارجية، يبدأ من البلدة القديمة وسط المدينة، ومنها إلى منتزه بلدية يطا الأثري في الكرمل، وصولاً إلى المنطقة الشرقية ومسافر يطا، ذات الإطلالة الرائعة والمساحات الكبيرة من الجبال والتلال التي تطل على مدن عراد والسبع و تشرف على البحر الميت، وبالتالي تنشيط السياحة والترفيه دعماً للاقتصاد المحلي وخلق لفرص العمل.

سيضم هذا البرنامج عدداً من المشاريع أهمها، إنشاء منتزه عام داخل مدينة يطا، وإكمال مشروع منتزه بلدية يطا في الكرمل، إكمال ستاد بلدية يطا، عمل بيت ضيافة في البلدة القديمة والعمل على تأهيلها وترميمها، عمل مسار سياحي للدراجات، ومسار سياحي ترفيهي يربط المناطق السياحية ببعضها البعض وغيرها من المبادرات.

2. النتائج المتوقعة: منتزهات عدد 2 مؤهلة بشكل كامل، ستاد بلدية يطا مؤهل بالكامل، وجود مسارات سياحية، والحفاظ على البلدية القديمة من الاندثار من خلال ترميمها.

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
عدد المرافق السياحية المؤهلة في المدينة	0	3
عدد المنتزهات الداخلية	0	1
عدد العاملين في المنشآت السياحية	3	50
عدد بيوت الضيافة في البلدة القديمة	0	1
نسبة ترميم البلدة القديمة	2%	35%

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 4 سنوات

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: جميع سكان مدينة يطا داخل المخطط الهيكلي (90,000 مواطن).

5. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
1. بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
اكمال بناء وتشطيب متنزه بلدية يطا في الكرمل	1,000,000	البلدية جهات مانحة القطاع الخاص	فني مالي
انشاء متنزه عام داخل المدينة	1,500,000	البلدية القطاع الخاص جهات مانحة	فني مالي
اكمال بناء وتشطيب ستاد بلدية يطا	2,000,000	جهات مانحة البلدية والقطاع الخاص	فني مالي
ترميم 30% من مباني وساحات البلدية القديمة	600,000	القطاع الخاص ، جهات مانحة، البلدية	فني مالي
تأهيل وترميم وتشطيب بيت ضيافة في البلدة القديمة	100,000	القطاع الخاص ، جهات مانحة، البلدية	فني مالي
انشاء وتشغيل مسار سياحي للدراجات الهوائية	500,000	القطاع الخاص ، جهات مانحة، البلدية	فني مالي
2. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:			
تدريب وتشغيل طاقم محلي	50,000	البلدية جهات مانحة	إداري ومالي
عمل مسار سياحي يربط تجمعات المدينة	150,000	القطاع الخاص ، جهات مانحة، البلدية	فني مالي
بناء قدرات الفئات المهمشة ودمجهم في مجال الترفيه والسياحة	50,000	القطاع الخاص ، جهات مانحة، البلدية	فني مالي
3. دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:			
عمل دراسات ذات طابع ارشادي للتعريف بالمناطق السياحية مع وضعها على GIS وطباعة المنشورات الإعلانية	80,000	القطاع الخاص جهات مانحة البلدية	فني مالي

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
دراسات جدوى	20,000	القطاع الخاص ، جهات مانحة، البلدية	فني مالي
التكلفة الإجمالية	6,080,000		

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج: التمويل، قطع أراضي، مشاركة القطاع الخاص.

10.2.7 رفع كفاءة القطاع التجاري

رقم البرنامج (04/EC).

1. مقدمة:

تتركز الحركة التجارية على طول الشارع الرئيسي من مدخل المدينة وحتى وسطها والتفرعات المجاورة مباشرة، وتعد المحال التجارية الموجودة هناك سهلة الوصول لمرتادي المدينة والمتسوقين، ولا توجد أية عوائق باستثناء حركة المرور. كما توجد غالبية أنواع المحال التجارية والسلع المطلوبة سواء البقالة والتموين، مواد البناء، الأدوات والمواد الزراعية والصناعية، والورش المهنية والفنية المختلفة، مما يعزز من كفاءة توفير كافة الاحتياجات لأهالي المدينة والقرى المجاورة، أسهم هذا في تعزيز ربط مواطني تلك القرى بالمدينة باعتماد سوق مدينة يطا كوجهة رئيسية لتلبية احتياجاتهم، لسهولة وقرب المدينة والسوق والتنوع في السلعة. وأخيراً فإن وجود عدد من محطات الوقود، وأربعة بنوك و صرافات آلية لبنكين آخرين على طول الشارع العام ومراكز الخدمة يرفع من قدرة وكفاءة المدينة في خدمة السكان والمناطق القريبة.

ومن المشاكل التي تواجه النشاط التجاري هي قيمة ايجار المحال التجارية والزيادة المستمرة فيها بشكل سنوي، خصوصاً تلك المحال التي تقع على الشارع الرئيسي ووسط المدينة (السوق التجاري المركزي)، أيضاً اعتماد التوزيع التجاري على مناطق التجاري الطولي حسب المخطط الهيكلي للبلدية، وغياب المراكز التجارية الفرعية على ارض الواقع، حيث يقتصر وجودها على المخطط الهيكلي.

حيث يضم هذا البرنامج عدة مشاريع من أهمها انشاء وتشغيل أربعة مراكز تجارية، وانشاء سوق شعبي، عمل موقف للسيارات عدد 2، عمل محطة لتعبئة الغاز، عمل مجمع للدوائر الحكومية، توحيد أبواب المحلات وترتيب السوق الرئيسي.

2. النتائج المتوقعة: سوق متناسق ومنظم بصورة جيدو، انتشار مراكز تجارية على طول الشارع الرئيسي، وجود مجمع

للدوائر الحكومية، وجود محطة لتعبئة الغاز المنزلي، وجود سوق شعبي، وغيرها من المنشآت التجارية.

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
عدد المحال التجارية المسجلة في البلدية	3500	5500
عدد فروع البنوك العاملة في المدينة	4	6
عدد المناطق التجارية الفرعية المؤهلة	0	1
عدد الأسواق الشعبية	0	1
عدد مواقف السيارات المؤهلة على الشارع الرئيسي	0	2

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 4 سنوات

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: جميع سكان مدينة يطا داخل المخطط الهيكلي (90,000 مواطن).

5. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
1. بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
بناء وتشطيب مراكز تجارية عدد 2	4,000,000	القطاع الخاص	فني مالي
إنشاء سوق شعبي مؤهل	100,000	البلدية القطاع الخاص جهات مانحة	فني مالي
عمل مواقف سيارات مؤهلة عدد 2	400,000	البلدية والقطاع الخاص	فني مالي
ترتيب واجهة المحال التجارية من حيث اللون والأرمام	300,000	القطاع الخاص البلدية	فني مالي
موائمة المنشآت التجارية لذوي الإعاقة	300,000	القطاع الخاص البلدية	فني مالي
2. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:			
تدريب وتشغيل طاقم محلي	50,000	البلدية جهات مانحة	إداري ومالي
3. دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:			

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
دراسات جدوى ومسوحات ميدانية	50,000	القطاع الخاص جهات مانحة البلدية	فني مالي
التكلفة الإجمالية	5,200,000		

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج: التمويل، قطع أراضي، مشاركة القطاع الخاص.

10.2.8 تعزيز جودة الخدمات الصحية ومكوناتها

رقم البرنامج (01/SO).

1. مقدمة: الصحة هي مبعث الطمأنينة والراحة النفسية وقوة لمواجهة المشاكل والتحديات، يضم النظام الصحي في المدينة مستشفى حكومي و آخر خاص، والعديد من المراكز الطبية والعيادات وغيرها من المراكز المساندة كالمختبرات والصيدليات ومراكز التصوير، وقد تم شرحها بالتفصيل خلال التقرير التشخيصي. لكن المنظمة الصحية في المدينة لا تكفي حاجة المواطنين المتزايدة بسبب عدد السكان الكبير للمدينة والتجمعات المحيطة بها، فمثلا يقدم المستشفى خدماته لمدينة يطا والسموع والفوار والريحية رغم شح إمكانياته. خلال هذا البرنامج سندرج عدد من الأنشطة التي تدعم القطاع الصحي الحكومي، منها إكمال تشطيب عيادة السلام كمقر لمديرية الصحة على نفقة المجتمع المحلي، تأهيل مستشفى يطا الحكومي من خلال بناء عيادات وأقسام جديدة تلبي حاجة المرضى، وإنشاء مستودع مؤهل لتخزين الأدوية، وتشغيل عيادة العروس وتلة الصمود بمستوى 3+. تشغيل عيادة للصحة النفسية والعناية بالمسنين، إضافة بناء للعيادة المركزية، تأهيل عيادات اعزيز، العروس، تلة الصمود.
2. النتائج المتوقعة: نتوقع من هذا البرنامج العمل على خفض عدد التحويلات الطبية الخارجية للمستشفيات المجاورة، والنهوض بالقطاع الصحي الحكومي من خلال توفير عيادات ومستشفى بمستوى مرضي.

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
عدد العيادات العاملة بمستوى +4	1	3
عدد العيادات بمستوى 3+	4	6
عدد العيادات بمستوى ثاني	11	15
عدد العيادات بمستوى أول	10	7
عدد الأسرة في قسم الولادة في المستشفى الحكومي	14	30

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
عدد الأقسام التي تحتاج لتطوير وتأهيل في المستشفى الحكومي	4	0

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 4 سنوات

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: جميع سكان يطا، السموع، الفوار، الريحية (180 ألف مواطن).

5. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
1. بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
بناء وتشطيب وتشغيل أقسام جديدة في المستشفى الحكومي	1,500,000	وزارة الصحة جهات مانحة	فني مالي
بناء وتشطيب وتأهيل مستودع لتخزين الأدوية	500,000	وزارة الصحة جهات مانحة	فني مالي
إضافة مبنى للعيادة المركزية	350,000	وزارة الصحة جهات مانحة مجتمع محلي	فني مالي
تأهيل عيادات العروس، تلة الصمود، اعزيز	450,000	وزارة الصحة جهات مانحة مجتمع محلي	فني مالي
إضافة طابق لمبنى مديرية الصحة - عيادة السلام، وتأهيل المبنى	450,000	وزارة الصحة جهات مانحة مجتمع محلي	فني مالي
2. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:			
تشغيل عيادة رقعة وتلة الصمود بمستوى 3+	100,000	وزارة الصحة	إداري ومالي
أنظمة محوسبة وأدلة إجراءات وعمل	50,000	وزارة الصحة	إداري ومالي
تشغيل وتدريب طاقم طبي محلي	50,000	وزارة الصحة	إداري ومالي
تشغيل عيادة رعاية نفسية للمسنين	150,000	وزارة الصحة	إداري ومالي
3. دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:			

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
دراسة ومسوحات لتحديد احتياجات المواطنين لعدد ونوع الأقسام الطبية التي يجب توفرها في المستشفى الحكومي. وتقييم للخدمات الصحية	000,50	وزارة لصحة	اداري وفني مالي
التكلفة الإجمالية	3,650,000		

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج: التمويل، قطع أراضي، أجهزة ومعدات طبية.

10.2.9 رفع كفاءة قطاع التربية والتعليم وبيئته التحتية

رقم البرنامج (02/SO).

1. مقدمة: يعتبر التعليم من أهم الأساسيات التي يحتاجها الإنسان لتحقيق ما يسعى إليه، حيث شيدت أول مدرسة في المدينة منذ عام 1929 م، وبدأت بعدها عملية نمو وتطور قطاع التعليم على مر السنوات، حتى وصلت إلى هذه المرحلة والتي تم شرحها مفصلاً في التقرير التشخيصي.

يشرف على نظام التعليم في المدينة كل من مديرية التربية والتعليم و جامعة القدس المفتوحة التي تعمل من خلال فرع لها في المدينة.

نسبة كبيرة من مدارس المدينة (28% تقريباً) هي مستأجرة، وجامعة القدس المفتوحة كذلك تمارس أنشطتها من خلال مبنى مستأجر غير مؤهل للعملية التعليمية، ومن خلال هذا البرنامج سنركز على دعم وإسناد العملية التعليمية عبر أنشطة مهمة منها: بناء 5 مدارس جديدة، صيانة 14 مدرسة، بناء قاعة كبيرة للاجتماعات والاحتفالات، بناء وتشغيل مدرسة مهنية وصناعية واستكمال المبنى الرئيسي من مشروع الحرم الجامعي لجامعة القدس المفتوحة في اعزير.

2. النتائج المتوقعة: بعد تنفيذ البرنامج سنحد من نسبة المدارس المستأجرة، ووجود وسائل وبيئة تعليمية مناسبة، وتوجه نحو التعليم المهني والصناعي.

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
نسبة المدارس المستأجرة	31.8%	5 %
عدد شعب التعليم المهني والصناعي	2	8
عدد المباني المستأجرة لجامعة القدس المفتوحة	12	20

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 4 سنوات

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: جميع طلاب وطالبات مدينة يطا داخل وخارج المخطط الهيكلي (مدرسي وجامعي) أي ما يقارب 25 ألف طالب وطالبة.
5. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
1. بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
بناء وتشطيب 5 مدارس	7,500,000	البلدية وزارة التربية والتعليم جهات مانحة	فني مالي
تشطيب وتشغيل 5 مدارس مبنية حاليا	2,000,000	البلدية وزارة التربية والتعليم جهات مانحة	فني مالي
صيانة 14 مدرسة	000,750	البلدية وزارة التربية والتعليم جهات مانحة	فني مالي
بناء قاعة اجتماعات واحتفالات	500,000	البلدية وزارة التربية والتعليم جهات مانحة	فني مالي
بناء وتشطيب وتشغيل مدرسة مهنية وصناعية	5,000,000	البلدية وزارة التربية والتعليم جهات مانحة	فني مالي
استكمال جزء من المبنى الرئيسي لمشروع جامعة القدس المفتوحة	500,000	البلدية وزارة التربية والتعليم جهات مانحة جامعة القدس المفتوحة	فني مالي
موائمة 50% من المدارس القائمة لذوي الإعاقة	220,000	البلدية وزارة التربية والتعليم جهات مانحة	فني مالي
2. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:			
تشغيل موظفي حراسة للمدارس	25,000	وزارة التربية	إداري ومالي
استحداث قسم صيانة للمباني المدرسية في مديرية التربية	25,000	وزارة التربية	إداري ومالي
3. دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:			

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
استطلاعات ، استبيانات، دراسات	30,000	وزارة التربية	اداري وفني مالي
التكلفة الإجمالية	16,550,000		

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج: التمويل، قطع أراضي، تراخيص

10.2.10 تمكين الفئات المهمشة والخدمات الاجتماعية

رقم البرنامج (SO/03).

1. مقدمة: يندرج تحت هذا المجال العديد من الخدمات والمهام التي تهم المواطن، وتشمل على دعم للأسر الفقيرة والمحتاجة، ودعم لذوي الإعاقة، وتعزيز مكانة المرأة، وتنظيم المقابر والمساجد (أماكن العبادة)، وبالتالي فإن مديرية أوقاف يطا ومديرية التنمية الاجتماعية تختص وتتابع هذه الأعمال وتقديم الخدمات لأهالي المدينة. هناك العديد من الأسر التي تحتاج إلى مساعدات بسبب الظروف الاقتصادي السيئ ، وعدد كبير من ذوي الإعاقة، وبالتالي يصعب على مديرية التنمية الاجتماعية تقديم العون ومتابعة هذه الحالات الكثيرة. تعاني المدينة من غياب المقابر المؤهلة وانتشار المقابر العشوائية بشكل غير منظم، لذا سنعمل من خلال هذا البرنامج على عدد من الأنشطة التي تعمل على تعزيز الخدمات والتمكين الاجتماعي للمواطن خصوصا تلك الفئات المهمشة، ومنها (بناء مركز مؤهل وكاف لذوي الإعاقة، وتأهيل مقابر عامة (عدد 2)، وتعزيز مكانة المرأة و دمج ذوي الإعاقة في المجتمع).

2. النتائج المتوقعة: محصلة البرنامج ستكون عبارة عن وجود مركز لذوي الإعاقة بمواصفات عالية، ووجود مقابر مؤهلة، و تحسن مستوى الخدمات الاجتماعية.

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
عدد المقابر العامة المؤهلة	0	1
عدد مراكز ذوي الإعاقة المؤهلة	1	2
نسبة ذوي الإعاقة في الوظائف	1%	5%
عدد الأسر المشمولة بخدمات التنمية الاجتماعية	6000	9000
عدد المستفيدين من مركز بلدية يطا المجتمعي	100	250
عدد النوادي والجمعيات النسوية الفاعلة	3	5
عدد المديریات الممثلة للوزارات في المدينة	9	12

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 4 سنوات

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: ذوي الإعاقة، والسيدات، والأسر المحتاجة وتعتبر المقابر عامة، لذلك جميع

أهالي المدينة (مع تجمعاتها) هم المستفيدون (120 ألف) مواطن

5. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
1. بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
بناء وتشطيب مركز لذوي الإعاقة	000,1,500	وزارة التنمية الاجتماعية جهات مانحة	فني مالي
تأهيل مقابر عامة عدد 2	500,000	وزارة الأوقاف	فني مالي
زيادة عدد الأسر المشمولة بدعم وزارة التنمية الاجتماعية إلى 9000 أسرة	300,000	وزارة التنمية الاجتماعية	فني مالي
بناء مجمع للمديریات والمؤسسات الحكومية في المدينة	1,500,000	البلدية، جهات مانحة، الحكومة الفلسطينية	فني مالي
2. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:			
زيادة نسبة توظيف ذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع لتصل 5%	20,000	جميع مؤسسات المدينة	إداري ومالي
برامج دمج ذوي الإعاقة في المجتمع	180,000	وزارة التنمية الاجتماعية	إداري ومالي
برامج تمكين للأسر المعيلة للفئات المهمشة	000,400	جهات مانحة، الحكومة الفلسطينية	إداري ومالي
3. دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:			
عمل نشرات و ندوات حول توعية المرأة والطفل وتمكينهم.	50,000	جهات مانحة	إداري وفني مالي
التكلفة الإجمالية	4,550,000		

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج: التمويل، قطع أراضي، أجهزة ومعدات .

1. مقدمة:

يعتبر التراث رمزا للهوية والإنسانية، ويساهم في تعزيز العلاقات والروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل، ويساعد على استمرارية المجتمعات وحفاظها على نفس العادات والقيم، وللثقافة أهمية كبرى في إيجاد وحدة متجانسة ومتماسكة بين أفراد المجتمع، من خلال تقاطعات وميول واهتمامات مشتركة بين الأفراد، حيث أن الثقافة والتراث تميز بوضوح كل مجتمع عن غيره من المجتمعات المحيطة.

سعت البلدية خلال السنوات القليلة الماضية على عمل ترميم وتأهيل لبعض المباني في البلدة القديمة، من خلال مؤسسة رواق، حيث تم ترميم واستعمال 8 مباني بشكل كامل، كمجلس قروي للمسافرين، وجمعية أصدقاء الشهيد ومركز نرسان الثقافي، ولجنة زكاة وصدقات يطا وغيرها، وتنفيذ ترميم وقائي لـ 25 مبنى آخر.

تنتشر بعض المراكز الثقافية في المدينة، كمركز نرسان الثقافي ومركز الأفق ومكتبة بلدية يطا، وبعض مكاتب الخدمات الصغيرة، التي تساعد الطلاب وتقدم لهم دروس التقوية وغيرها، وتفتقر المدينة لوجود مركز ثقافي شامل ومؤهل بصورة عالية من مكتبات وقاعات ومدرجات وغيرها.

بشكل عام نلاحظ وجود ضعف في قطاع التراث والثقافة وبنيتها التحتية، حيث توجد مكتبة واحدة تابعة للبلدية فقط، لا تكفي أهالي المدينة وطلابها ومؤسساتها، كذلك ضعف آلية ترميم المباني القديمة بسبب عدم توفر الدعم اللازم لتنفيذ مثل هذه المشاريع.

تم افتتاح مكتب لمديرية الآثار في المدينة، لتسهيل معاملات المواطنين، والحفاظ على الأبنية القديمة، والمناطق الأثرية من الاعتداء.

سيضم البرنامج عدد من النشاطات التي ستعزز وتدعم هذا القطاع وتطوِّره، كافتتاح نواه لمتحف تراثي، وإعادة ترميم البلدة القديمة، وإنشاء مركز ثقافي بالإضافة لوضع خريطة تراثية وعمل برامج توعية وغيرها

2. النتائج المتوقعة: محصلة البرنامج ستحافظ على البلدة القديمة من الاندثار والتعديات، والحفاظ على المناطق الأثرية الأخرى، كذلك وجود أماكن سياحية تراثية يمكن الاستفادة منها واستغلالها اجتماعيا واقتصاديا، بالإضافة لوجود مركز ثقافي مؤهل بشكل مناسب.

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
عدد الأبنية المرممة بشكل كامل في البلدة القديمة	8	50
عدد الأبنية القديمة المرممة وقائيا	200	400
عدد المراكز الثقافية الفاعلة	3	6
قاعة و مركز ثقافي عام مؤهل	0	1

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 4 سنوات

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: جميع سكان مدينة يطا ومحيطها (120 ألف) مواطن

5. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
1. بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
ترميم 15 مبنى في البلدة القديمة	000,750	وزارة السياحة والآثار جهات مانحة والبلدية	فني مالي
ترميم وقائي ل 80 مبنى قديم	250,000	وزارة السياحة والآثار جهات مانحة والبلدية	فني مالي
بناء وتشطيب مركز ثقافي عام	900,000	جهات مانحة والبلدية	فني مالي
2. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:			
عمل خريطة وياقظات بالأماكن السياحية التراثية	100,000	جهات مانحة والبلدية	إداري ومالي
برامج توعية للحفاظ على المباني القديمة والمناطق الاثرية	50,000	وزارة السياحة والآثار وجهات مانحة	إداري ومالي
تدريب كوادر محلية	000,50	وزارة السياحة والآثار وجهات مانحة	إداري ومالي
3. دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:			
عمل نشرات و ندوات توعوية، ودراسات جدوى	50,000	وزارة السياحة والآثار وجهات مانحة	اداري وفني مالي
التكلفة الإجمالية	2,150,000		

10.2.12 تطوير وتأهيل المؤسسات ذات الصلة بالأمن والسلامة العامة وإدارة الكوارث
رقم البرنامج (01/GO).

1. مقدمة: الأمن هو حماية الأسرة، المواطن والأملك، وهو حاجة فطرية لدى الإنسان من أجل الاستمرار على قيد الحياة.

يتكون نظام الأمن في المدينة من أطراف عديدة، أهمها الشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر، وهذه الأطراف تحديدا تعاني من أوضاع تحد من خدماتها بصورة مثالية، خلال هذا البرنامج سنضع بعض النشاطات من شأنها رفع مقومات الأمن والأمان في المدينة، ومن بينها: ترقية مركز الدفاع المدني في المدينة إلى مديرية ومركز إسناد بكامل المعدات والآليات والطواقم، ترقية مركز شرطة مدينة يطا إلى مديرية كاملة، وتطوير مركز الهلال الأحمر في المدينة إلى مركز كامل يشتمل على مقر مملوك وعيادات وسيارات وطواقم مختصة).

2. النتائج المتوقعة: نتوقع بعد تنفيذ المشروع زيادة في الأمن و شعور بالطمأنينة من قبل الأهالي ووجود مديريات على أرض الواقع للدفاع المدني والشرطة ومستشفى الهلال الأحمر.

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
عدد مراكز الإسناد التابعة للدفاع المدني	0	1
عدد المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهلال الأحمر	0	1

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 4 سنوات

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: جميع سكان مدينة يطا بحدودها الإدارية (حوالي 120 ألف مواطن)

5. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
1. بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			
تشطيب مقر الهلال الأحمر وتشغيله	750,000	الهلال الأحمر المجتمع المحلي جهات مانحة	فني مالي
إنشاء مركز إسناد للدفاع المدني مؤهل بشكل مناسب	1,250,000	وزارة الداخلية جهات مانحة	فني مالي
2. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:			
تحويل مركز شرطة يطا إلى مديرية للشرطة مع الطاقم والآليات المطلوبة	150,000	وزارة الداخلية	إداري ومالي
3. دراسات وبحث وتطوير، وتشمل:			
دراسة تحديد الاحتياج دراسة جدوى	50,000	الحكومة الفلسطينية	اداري وفني مالي
التكلفة الإجمالية	2,200,000		

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج: التمويل، قطع أراضي، أجهزة ومعدات .

10.2.13 رفع كفاءة التخطيط والتنظيم العمراني

رقم البرنامج (02/GO).

1. مقدمة:

مع بداية إطلاق مسمى بلدية لمدينة يطا، بدأت عملية إصدار التراخيص و الضبط التنظيمي للمدينة، حيث صدرت أول رخصة بناء في مدينة يطا بتاريخ 1971/9/1م أي قبل 52 سنة مما يعني بداية تنظيم المباني والطرق للمدينة الذي يساهم في ضبط تسارع التقدم العمراني والسيطرة على الأخطاء البشرية والتجاوزات والاعتداءات التي تهدد حياة الإنسان وتؤثر على وجوده من حيث عدم ترك الفراغات والارتدادات المطلوبة والسلامة الإنشائية للمباني، ولما للتعمير أهمية في حياة الناس واستقامة معاشهم ظهر مفهوم تنظيم المدن والقرى، وذلك بدون وجود مخطط هيكلي معتمد.

هناك مشكلة كبيرة تعاني منها المدينة وهي الملكيات والتسجيل القديم للأراضي بأسماء الجد القديم، حيث آلت الأراضي للورثة وتوزعت بين بيع وشراء، ولغاية الآن لم نستطيع ضبط الملكيات والمساحات بشكل المناسب، ومن هنا ظهرت حاجتنا الماسة والفعالية لعمل مشروع تسوية أراضي بشكل سريع وفعال، حيث بدأت البلدية في هذا المشروع وهو قيد التنفيذ.

يشمل هذا البرنامج مشاريع تهدف لتطوير هذا القطاع، منها استكمال لمشروع التسوية وتسجيل الأراضي الجاري حالياً، تحديث المخطط الهيكلي بناء على مخرجات التسوية والتوسعة المقترحة، وغيرها من تدريب الطواقم وفتح محكمة بلديات.

2. النتائج المتوقعة: نظام للتخطيط والتنظيم العمراني فعال ومناسب، يعكس صورة حضارية عن المدينة، وتسهيل تسجيل الأراضي عند البيع والشراء وغيرها.

المؤشر	القيمة الحالية	القيمة المنشودة
عدد رخص الأبنية الصادرة سنوياً	310	490
مساحة المخطط الهيكلي الحالي	30.7 كم ²	35 كم ²
عدد المخالفات التنظيمية سنوياً	200	100

3. مدة التنفيذ المتوقعة للبرنامج: 4 سنوات

4. الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين: جميع سكان مدينة يطا (90 ألف مواطن)

5. مكونات البرنامج:

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
1. بنية تحتية وإنشاءات، وتشمل:			

المكونات	التكلفة التقديرية/دولار	اسم الشركاء	دوره (إداري، مالي، وفني)
لا يوجد مشاريع بنية تحتية			
2. بناء قدرات وتطوير مؤسسي، وتشمل:			
اكمال مشروع تسوية وتسجيل الأراضي	200,000	البلدية و دائرة الأراضي	إداري ومالي
تحديث المخطط الهيكلي الحالي	100,000	البلدية وصندوق البلديات	إداري ومالي
انشاء محكمة بلديات خاصة بمدينة يطا	100,000	البلدية والحكومة الفلسطينية	إداري ومالي
تدريب الكوادر التابعة لدائرة الهندسة والأراضي	20,000	البلدية جهات مانحة	إداري ومالي
3. دراسات وبحث وتطوير ، وتشمل:			
دراسة تحديد الاحتياج ومسوحات ميدانية	20,000	البلدية	إداري وفني مالي
التكلفة الإجمالية	440,00		

6. المدخلات الرئيسية لتنفيذ البرنامج: التمويل، قطع أراضي، أجهزة ومعدات .

10.3 وصف مكونات بعض المشاريع والبرامج المهمة

ملخص مكون برنامج/ مشروع			
اسم مكون البرنامج/المشروع: تعبيد و تأهيل المدخل الرئيسي الشمالي (زيف)	الرقم: 1\01\EI	البرنامج: رفع كفاءة قطاع الطرق والمواصلات 01\EI	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ	
المشروع عبارة عن تأهيل وتعبيد المدخل الرئيسي الشمالي للمدينة بطول لا يقل عن 4 كم ، بتكلفة تقدر بحوالي 2,000,000 دولار وتشمل أعمال توسعة بعض المقاطع وتسويتها، وقشط الإسفلت القديم وإعادة التعبيد وغيرها من الأعمال الإنشائية لحماية جسم الطريق، كذلك تركيب لوحات مرورية وأعمال الدهان في مناطق معينة حسب المخططات، مع ملاحظة ضرورة الاهتمام بعناصر البنية التحتية الأخرى كالمياه والهاتف والكهرباء وأخذها بعين الاعتبار . يتوقع بدء العمل في المشروع في الربع الثالث من هذا العام ولمدة 180 يوم تقويمي. سيساهم المشروع في الحد من الآثار السلبية للتغير المناخي والمرتبطة بالفيضانات من خلال مراعاة التصميم لتصريف مياه الأمطار بطريقة تحمي السيارات والمارة والمواطنين ومداخل البيوت وممتلكاتهم.		● طرق داخل المدينة	التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
		● 06/2023	مدة التنفيذ
		● 180 يوم تقويمي	
هل المشروع يتطلب دراسة أثر بيئي	هل يقع المشروع في أو بالقرب من مناطق حساسة بيئياً كالمحميات الطبيعية أو المناطق الرطبة أو المواقع الأثرية المسجلة أو الأماكن التراثية؟	هل يترتب على المشروع ترحيل مواطنين أو تجمعات سكانية؟	هل يحتاج المشروع لنشاطات تطويرية أخرى قد يكون لها آثار بيئية هامة؟
☐ نعم ☒ لا	☐ نعم ☒ لا	☐ نعم ☒ لا	☐ نعم ☒ لا
أهداف مكون البرنامج/المشروع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	عدد المستفيدين المتوقع	الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها
- تحسين حركة المرور في المدينة من خلال توفير طريق رئيسي آمن ومريح للتنقل. - الحد من مصاريف صيانة سيارات المواطنين التي يعانون منها بسبب سوء حال المدخل حالياً. - تحسين المنظر الجمالي والبيئي للمدينة	كافة فئات المجتمع وموائمة الطريق الرئيسي لذوي الإعاقة	كافة سكان المدينة بما يقارب (110,000 نسمة)	- تطوير شبكة الطرق الداخلية والرئيسية وتأهيل نظام المواصلات والمرور. -زيادة الامن والأمان على الطرق -الاعتناء بتوفير منظر جمالي وبيئية مناسب
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية			

عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله	التكلفة التقديرية* 1000 (\$) حسب سنوات الخطة				المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لمكون البرنامج/المشروع
•	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	• أعمال الشق و التوسعة باستخدام معدات البلدية والمقاول.
• أعمال شق و توسعة. • تسوية أرضية الطرق • أعمال بيسكورس • أعمال قشط اسفلت • أعمال أسفلت. • ملحقات الطرق (علامات مرور، دهان، أكتاف باطون وغيرها)	2,000	2,000	1,000	1,000	
المجموع (بالأرقام)		6,000,000			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*	عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*				
□ الأرض متوفرة □ الأرض غير متوفرة □ المشروع ليس ذو بعد مكاني	• من خلال خطة الصيانة والتشغيل في البلدية				
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟	• و قسم تنفيذ المشاريع بالتعاون مع الأقسام الفنية الأخرى.				
•	• العائد المادي السنوي المتوقع (\$)؟ غير ربحي				
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة	☑ نعم □ لا				
جهة التنفيذ المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)			
• قسم تنفيذ المشاريع		• صندوق تطوير و إقراض البلديات والمشروع الهولندي و وزارة الاشغال			
جهة التمويل المقترحة					
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)			
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: صيانة الطرق		• صندوق تطوير و إقراض البلديات			
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع □ متوفرة ☑ متوفرة جزئياً □ غير متوفرة		• هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☑ نعم □ لا			
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع					
• الموارد البشرية □ متوفرة □ متوفرة جزئياً □ غير متوفرة		• بناء قدرات الجهة المنفذ □ غير مطلوب □ مطلوب (حدد):			
• دراسات/مخططات □ متوفرة □ متوفرة جزئياً □ غير متوفرة		• دعم جماهيري □ مطلوب □ مطلوب جزئياً □ غير مطلوب			
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*					
إيجابية:		سلبية:		تدابير التخفيف:	
* أمان على الطرق * ثقة من قبل المواطن * تحسين المرور وتقليل الازدحام. سرعة في التنقل		غبار وأتربة خلال تنفيذ المشروع		اعداد خطة ادارة بيئية واجتماعية ESMP تتضمن مصفوفة خطة المراقبة والادارة البيئية للمشروع وغرامات للمخالفات	
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع					

المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها
• عدم تعاون المجتمع المحلي بخصوص التوسعة.	• تشكيل لجنة دعم و اسناد من المجتمع المحلي.

ملخص مكون برنامج/ مشروع			
اسم مكون البرنامج/المشروع: تعبيد و تأهيل طرق داخلية بطول 6 كم .	الرقم: 2\01\EI	البرنامج: رفع كفاءة قطاع الطرق والمواصلات 01\EI	
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ	
• الطرق هي إحدى الخدمات الضرورية في حياة المواطن تعمل على تسهيل حركته وتنقله بأمان، حيث تتسع شبكة الطرق في المدينة بشكل لافت، تتجاوز 200 كم غالبيتها بحاجة إلى تعبيد وتأهيل. فعملية تأهيل الطرق تعطي الأمان والثقة للمواطن، وتساهم في تعزيز الوجود والانتشار السكاني المناسب في مناطق المدينة المختلفة. المشروع يتكون من تعبيد وتأهيل طرق داخلية في المدينة بطول 6 كم، بتكلفة تقدر بحوالي 1,000,000 دولار وتشمل أعمال الحفریات الأولية، وتسوية الموقع، و فرد طبقة البيسكورس والإسفلت، كذلك تركيب لوحات مرورية وأعمال الدهان في مناطق معينة حسب المخططات، مع ملاحظة ضرورة الاهتمام بعناصر البنية التحتية الأخرى كالمياه والهاتف والكهرباء وأخذها بعين الاعتبار. يتوقع بدء العمل في المشروع في الربع الثالث من هذا العام ولمدة 90 يوم تقويمي. سببها المشروع في الحد من الآثار السلبية للتغير المناخي والمرتبطة بالفيضانات من خلال مراعاة التصميم لتصريف مياه الامطار بطريقة تحمي السيارات والمارة والمواطنين ومداخل البيوت وممتلكاتهم.		• طرق داخل المدينة	
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ	
		• 07/2023	
		مدة التنفيذ	• 90 يوم تقويمي
هل المشروع يتطلب دراسة اثر بيئي	هل يقع المشروع في او بالقرب من مناطق حساسة بيئيا كالمحميات الطبيعية او المناطق الرطبة أو المواقع الاثرية المسجلة او الاماكن التراثية؟	هل يترتب على المشروع ترحيل مواطنين او تجمعات سكانية؟	هل يحتاج المشروع لنشاطات تطويرية أخرى قد يكون لها آثار بيئية هامة؟
نعم ☐ لا ☒	نعم ☐ لا ☒	نعم ☐ لا ☒	نعم ☐ لا ☒
أهداف مكون البرنامج/المشروع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	عدد المستفيدين المتوقع	الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها

- تطوير شبكة الطرق الداخلية والرئيسية وتأهيل نظام المواصلات والمرور. -زيادة الامن والأمان على الطرق	• كافة سكان المدينة بما يقارب (110,000 نسمة)	كافة فئات المجتمع	• تحسين مستوى شبكة الطرق الداخلية بزيادة كمية الطرق المعبدة و بالتالي تقليل نسبة الطرق الترابية. • تحسين جودة الطرق الرابطة ما بين المدينة و القرى المحيطة. • تحسين حركة المرور في المدينة بعمل طرق داخلية حيوية لتخفيف الازمة على الطريق الرئيسي. • زيادة التواصل الجغرافي ما بين المدينة و القرى المحيطة بها و تسهيل حركة المرور من و الى مركز المدينة.		
المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع	وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية				
	عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله	التكلفة التقديرية* 1000 (\$) حسب سنوات الخطة			
• أعمال الشق و التوسعة باستخدام معدات البلدية والمقاول.	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	• أعمال شق و توسعة. • تسوية أرضية الطرق • أعمال بيسكورس • أعمال أسفلت. • ملحقات الطرق (علامات مرور ، دهان ، أكتاف باطون وغيرها)
	1,000	1,500	1,000	1,000	المجموع (بالأرقام)
4,500,000	عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*				
• من خلال خطة الصيانة والتشغيل في البلدية	متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*				
• و قسم تنفيذ المشاريع بالتعاون مع الأقسام الفنية الأخرى.	□ الأرض متوفرة □ الأرض غير متوفرة □ المشروع ليس ذو بعد مكاني				
• العائد المادي السنوي المتوقع (\$)؟ غير ربحي	في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟				
• نعم □ لا	هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة				
جهة التنفيذ المقترحة					
• صندوق تطوير و إقراض البلديات والمشروع الهولندي ومشاركة المجتمع المحلي	الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)				
• قسم تنفيذ المشاريع					
جهة التمويل المقترحة					

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)	
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: صيانة الطرق		● صندوق تطوير و إقراض البلديات	
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة		● هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا	
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
● الموارد البشرية ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة		● بناء قدرات الجهة المنفذ ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): _____	
● دراسات/مخططات ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة		● دعم جماهيري ☒ مطلوب ☐ مطلوب جزئياً ☐ غير مطلوب	
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*			
إيجابية:		سلبية:	
* أمان على الطرق		غبار وأتربة خلال تنفيذ المشروع	
* ثقة من قبل المواطن		تدابير التخفيف:	
* تحسين المرور وتقليل الازدحام.		اعداد خطة ادارة بيئية واجتماعية ESMP	
سرعة في التنقل		تتضمن مصفوفة خطة المراقبة والادارة البيئية للمشروع وغرامات للمخالفات	
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع			
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها	
● عدم تعاون المجتمع المحلي بخصوص التوسعة.		● تشكيل لجنة دعم و اسناد من المجتمع المحلي.	
●		●	
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*			
سيتم إدراجه في ملحقات الخطة			

ملخص مكون برنامج/ مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: بناء و تشطيط وتشغيل مدرسة مهنية وصناعية.	الرقم: 5\02\SO	البرنامج: رفع كفاءة قطاع التربية والتعليم وبنيتها التحتية 02\SO
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ
يعتمد التعليم في المدينة بشكل شبه كامل على التعليم الأكاديمي، الأدبي والعلمي، مع ظهور بعض الشعب المدرسية في مدارس قليلة بتخصص التجاري والصناعي، ولكن لا تتوفر لها الساحات والمختبرات الكافية لصقل موهبة الطلاب. يهدف المشروع للحد من ظاهرة التسرب التعليمي من المدارس، واستيعاب الطلاب في مدرسة مهنية وصناعية، تعطيهم فرصة الاستفادة من اكتساب حرفة معينة، تفتح سوق العمل أمامهم، لدعم أسرهم ودعم الاقتصاد وسوق العمل المحلي الذي يعاني من ندرة الأيدي العاملة بسبب هجرتها للعمل داخل الخط الأخضر. مع وجود مدرسة صناعية ومهنية في المدينة، سنرى اقبالا على التعليم المهني، وزيادة كفاءة التعليم المحلي، وتخفيف العبء والضغط عن المدارس النظامية. سيعاى التصميم اسس البناء الاخضر واستخدام وحدات انارة موفرة للطاقة ومواد وأجهزة صديقة للبيئة.		• داخل المدينة التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ • 8/2023 مدة التنفيذ • 2-3 سنوات

هل المشروع يتطلب دراسة اثر بيئي ☐ نعم ☒ لا	هل يقع المشروع في او بالقرب من مناطق حساسة بيئيا كالمحميات الطبيعية او المناطق الرطبة أو المواقع الاثرية المسجلة او الاماكن التراثية؟ ☐ نعم ☒ لا	هل يترتب على المشروع ترحيل مواطنين او تجمعات سكانية؟ ☐ نعم ☒ لا	هل يحتاج المشروع لنشاطات تطويرية أخرى قد يكون لها آثار بيئية هامة؟ ☐ نعم ☒ لا
أهداف مكون البرنامج/المشروع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	عدد المستفيدين المتوقع	الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها
- توفير مكان لتطوير مهارات الطلاب والطالبات ذوي الميول المهنية والحرفية. - تخفيف العبء عن المدارس الأكاديمية	الطلاب والطالبات بعمر 16-18 سنة	500 طالب وطالبة سنويا	الحد من ظاهرة التسرب من خلال فتح آفاق تعليم وتشغيل جديدة
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية			
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية * 1000 (\$) حسب سنوات الخطة	
		الأولى	الثانية
		الثالثة	الرابعة
أعمال بناء و تشطيب مبنى وساحات المدرسة المهنية والصناعية وتزويدها بالأدوات والبرامج التعليمية المطلوبة.		1000	3,000
		1,000	0
المجموع (بالأرقام)		5,000,000	
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني) *		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة *	
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذو بعد مكاني		كيف؟ ستتم عملية التنفيذ من مقاول معتمد بإشراف مديرية تربية وتعليم يطا ومكتب استشاري خاص لمتابعة التنفيذ (مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع)	
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		متوفرة	
		العائد المادي السنوي المتوقع (\$)؟ بحاجة إلى دراسة جدوى	
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة ☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة			
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)	
دائرة التخطيط و المشاريع و وحدة التنمية ولا استثمار		مديرية التربية والتعليم - يطا	
جهة التمويل المقترحة			
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)	
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: لا يوجد		الحكومة الكورية / كويكا	
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا	

المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
- الموارد البشرية متوفرة متوفرة جزئيا غير متوفرة - دراسات/مخططات متوفرة متوفرة جزئيا غير متوفرة	- بناء قدرات الجهة المنفذة غير مطلوب - مطلوب (حدد): - دعم جماهيري	
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*		
إيجابية: تحقيق أهداف المشروع. رغد سوق العمل المحلي بأيدي عاملة كفوة. الحد من ظاهرة التسرب. تحسين الوضع الاقتصادي للعائلات	سلبية: لا ينطبق	تدابير التخفيف: اعداد خطة ادارة بيئية واجتماعية ESMP تتضمن مصفوفة خطة المراقبة والادارة البيئية للمشروع وغرامات للمخالفات
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها	
عدم توافر التمويل اللازم.	تفعيل عمل العلاقات العامة و العمل على توفير التمويل اللازم.	
خارطة البعد المكانية لمكون البرنامج/المشروع*		
☒ سيتم ادراجها في ملحق الخطة		

ملخص مكون برنامج/ مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: بناء و تشطيب مسلخ بلدي	الرقم: EC\3\02	البرنامج: تعزيز جودة القطاع الزراعي ومكوناته
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ
تنتشر في المدينة الملاحم بشكل لافت، تقوم بذبح المواشي والدواجن بصورة ذاتية لا تخضع للرقابة الصحية والبيئية، مما يعرض المواطنين لأخطار صحية وانتشار للأمراض والأوبئة، لذلك لا بد من وجود مسلخ بلدي مؤهل تعمل فيه كافة الطواقم المسؤولة عن توفير الأمن الصحي والبيئي وتوفير لحوم مراقبة ومتابعة قبل الذبح وخلال التوزيع على نقاط البيع. وسنعمل من خلال هذا المشروع على بناء مسلخ بلدي مؤهل بما يضمه من بركسات و مباني و عيادات بيطرية ويمكن التخلص من النفايات الناتجة دون إلحاق ضرر بالبيئة المحيطة.		داخل المدينة
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
		8/2023
		مدة التنفيذ
		3-2 سنوات

سيراعي التصميم أسس البناء الأخضر واستخدام وحدات انارة موفرة للطاقة ومواد ومعدات صديقة للبيئة.				
هل المشروع يتطلب دراسة أثر بيئي ☒ نعم ☐ لا	هل يقع المشروع في او بالقرب من مناطق حساسة بيئيا كالمحميات الطبيعية او المناطق الرطبة أو المواقع الأثرية المسجلة أو الأماكن التراثية؟ ☐ نعم ☒ لا	هل يترتب على المشروع ترحيل مواطنين أو تجمعات سكانية؟ ☐ نعم ☒ لا	هل يحتاج المشروع لنشاطات تطويرية أخرى قد يكون لها آثار بيئية هامة؟ ☐ نعم ☒ لا	
أهدافمكون البرنامج/المشروع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	عدد المستفيدين المتوقع	الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها	
• توفير موقع مرخص لضبط عمليات الجزارة في المدينة و تنظيم عمليات التخلص من نفايات أعمال الجزارة.	• كافة فئات المجتمع.	• كافة سكان المدينة و القرى المجاورة بما يقارب (110,000 نسمة)	• المساهمة في الحد من التلوث البيئي وتعزيز الرقابة على الصحة العامة.	
• التخلص من ظاهرة انتشار الملاحم في احياء المدينة و ما يتبعها من أثر مغل بالبيئة.				
• تعزيز الرقابة الصحية على المواشي والدواجن قبل الذبح				
• حماية البيئة				
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية				
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية * 1000 (\$) حسب سنوات الخطة		
		المشاركة التي تمثل متطلبا سابقا لمكون البرنامج/المشروع		
•	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة
• أعمال بناء و تشطيب مسلخ بلدي بما يشمل من بركسات و أعمال خرسانية وساحات	1000	1,000	700	0
المجموع (بالأرقام)		2,700,000		
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*		
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذو بعد مكاني		• كيف؟ سيتم عملية التنفيذ من خلال دائرة التخطيط و المشاريع في بلدية يطا عن طريق اعداد و ثائق العطاء و المخططات و طرحه للمنافسة بين المقاولين و من ثم متابعة التنفيذ من قبل قسم تنفيذ المشاريع و وحدة التنمية والاستثمار و مديرية زراعة يطا سيتم متابعة تشغيل و صيانة هذا المكون من خلال ادراجه على خطة الصيانة و التشغيل لبلدية يطا و بالتنسيق مع كافة الدوائر في البلدية.		
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		• متوفرة		

• العائد المادي السنوي المتوقع (\$)؟ بحاجة إلى دراسة جدوى	
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة ☐ نعم ☐ لا	
جهة التنفيذ المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)	جهات أخرى (حدد)
• دائرة التخطيط و المشاريع و وحدة التنمية ولاستثمار	• مديرية زراعة وبيطرة يطا
جهة التمويل المقترحة	
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)	جهات أخرى (حدد)
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: لا يوجد	•
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة	• هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
• الموارد البشرية ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة	• بناء قدرات الجهة المنفذ ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): _____
• دراسات/مخططات ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة	• دعم جماهيري ☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئيا ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*	
ايجابية: تحقيق أهداف المشروع. توفير الرقابة الصحية على اللحوم حماية البيئة من التلوث إيجاد مردود مادي يساهم في تشغيل وصيانة المسلخ	سلبية: لا ينطبق تدابير التخفيف: اعداد خطة ادارة بيئية واجتماعية ESMP تتضمن مصفوفة خطة المراقبة والادارة البيئية للمشروع وغرامات للمخالفات
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع	
المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها
• عدم توافر التمويل اللازم.	• تفعيل عمل العلاقات العامة و العمل على توفير التمويل اللازم.
•	•
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*	

ملخص مكون برنامج/ مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: أعمال خارجية وتنشيطات استاد بلدية يطا الدولي	الرقم: 3\03\EC	البرنامج: تعزيز دور فئة الشباب.
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع	مكان التنفيذ	
يشمل المشروع أعمال تأهيل وتعبيد ساحات خارجية ومداخل استاد بلدية يطا الدولي، بالإضافة الى تصريف مياه الامطار للحفاظ على المقدرات المستثمرة في هذا المرفق، وتحضيرا لاستكمال المتطلبات اللازمة لتشغيل هذا المرفق باعتباره متنفس لفئة الشباب وملاذ	• داخل المدينة	
	التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ	
	• 6/2023	
	مدة التنفيذ	

1-2 سنوات	لتفريغ طاقة الشباب من خلال تفعيل الانشطة الرياضية في المدينة وتوفير ملعب بيتي للأندية الرياضية في المدينة. كما يشمل المشروع استكمال التشطيبات والأثاث داخل الاستاد لضمان تشغيله وفق متطلبات المجلس الاعلى للشباب والرياضة.			
هل المشروع يتطلب دراسة أثر بيئي	هل يقع المشروع في او بالقرب من مناطق حساسة بيئيا كالمحميات الطبيعية او المناطق الرطبة أو المواقع الأثرية المسجلة او الاماكن التراثية؟	هل يترتب على المشروع ترحيل مواطنين او تجمعات سكانية؟	هل يحتاج المشروع لنشاطات تطويرية أخرى قد يكون لها آثار بيئية هامة؟	
نعم ☐ لا ☐	نعم ☐ لا ☐	نعم ☐ لا ☐	نعم ☐ لا ☐	
أهداف مكون البرنامج/المشروع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	عدد المستفيدين المتوقع	الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها	
توفير متنفس لفئة الشباب وتعزيز واقع الاندية الرياضية في المدينة.	كافة سكان المدينة والقرى المحيطة بأعمار متفاوتة	ما يزيد على 30000 مواطن ومواطنة سنوياً	تعزيز دور فئة الشباب	
تعزيز مصادر دخل البلدية من خلال تشغيل الاستاد والاستفادة من عوائده				
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية				
المشاريع التي تمثل متطلباً سابقاً لمكون البرنامج/المشروع	عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية *1000 (\$) حسب سنوات الخطة	
	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة
•	1300			0
• أعمال تأهيل وتعبيد ساحات ومداخل الاستاد	700			
• أعمال تشطيبات وأثاث لكافة مرافق الاستاد				
المجموع (بالأرقام)	2,000,000			
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني)*	عملية الإدارة والتشغيل والصيانة*			
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذو بعد مكاني	كيف؟ ستتم عملية التنفيذ من مقابل معتمد بإشراف بلدية يطّا			
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟	متوفرة			
•	العائد المادي السنوي المتوقع (\$)؟ بحاجة إلى دراسة جدوى			
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة	☒ نعم ☐ لا			
جهة التنفيذ المقترحة				
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)		
دائرة التخطيط و المشاريع و وحدة التنمية ولاستثمار ودائرة المرافق المساندة.		المجلس الاعلى للشباب والرياضة		
جهة التمويل المقترحة				
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)		

بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: يوجد		لا يوجد
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع ☐ متوفرة ☒ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
- الموارد البشرية ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة - دراسات/مخططات ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة	- بناء قدرات الجهة المنفذة ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): _____ - دعم جماهيري ☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئياً ☐ غير مطلوب	
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*		
ايجابية: تحقيق أهداف المشروع. رغد مصادر دخل البلدية بعوائد تشغيل الاستاد.	سلبية: لا ينطبق	تدابير التخفيف: اعداد خطة ادارة بيئية واجتماعية ESMP تتضمن مصفوفة خطة المراقبة والادارة البيئية للمشروع وغرامات للمخالفات
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات		إجراءات التغلب عليها
عدم توافر التمويل اللازم.		تفعيل عمل العلاقات العامة و العمل على توفير التمويل اللازم.
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*		
☒ سيتم ادراجها في ملحق الخطة		

ملخص مكون برنامج/ مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: أعمال بناء وتشطيب مسلخ بلدية يطا	الرقم: 3\02\EC	البرنامج: تعزيز واقع قطاع الصحة العامة.
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		
مكان التنفيذ	داخل المدينة	
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ	يشمل المشروع أعمال بناء وتشطيب مبنى مسلخ بلدية يطا بالإضافة الى توريد كافة المعدات والاثاث اللازم لتشغيله وفق المواصفات المطلوبة، وقد كانت الحاجة الملحة لوجود المسلخ لضبط عمليات توريد السوق المحلي باللحوم الحمراء وفق المواصفات والشروط المطلوبة للحفاظ على الصحة العامة.	
6/2023		
مدة التنفيذ	سيراعي التصميم اسس البناء الاخضر واستخدام وحدات انارة موفرة للطاقة ومواد ومعدات صديقة للبيئة.	
2-1 سنوات		

هل المشروع يتطلب دراسة أثر بيئي ☒ نعم ☐ لا	هل يقع المشروع في أو بالقرب من مناطق حساسة بيئيا كالمحميات الطبيعية أو المناطق الرطبة أو المواقع الأثرية المسجلة أو الأماكن التراثية؟ ☐ نعم ☒ لا	هل يترتب على المشروع ترحيل مواطنين أو تجمعات سكانية؟ ☐ نعم ☒ لا	هل يحتاج المشروع لأنشطة تطويرية أخرى قد يكون لها آثار بيئية هامة؟ ☐ نعم ☒ لا	
أهداف مكون البرنامج/المشروع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	عدد المستفيدين المتوقع	الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها	
توفير مكان لضبط عمليات الذبح وتزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء.	كافة سكان المدينة والقرى المحيطة بأعمار متفاوتة	120,000 مواطن ومواطنه سنويا	تعزيز دور فئة الشباب	
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية				
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية *1000 (\$) حسب سنوات الخطة		
		الأولى	الثانية	الثالثة
		1000	900	0
		المجموع (بالأرقام)		
		1,900,000		
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني) *		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة *		
☒ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذو بعد مكاني		- كيف؟ - ستتم عملية التنفيذ من مقاول معتمد بإشراف بلدية يطا ووزارة الزراعة ووزارة الأشغال العامة		
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		متوفرة		
		- العائد المادي السنوي المتوقع (\$)؟ - بحاجة إلى دراسة جدوى		
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ إذا كان نعم أدرج الخارطة		☒ نعم ☐ لا		
جهة التنفيذ المقترحة				
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)		
دائرة التخطيط و المشاريع و وحدة التنمية ولاستثمار ودائرة المرافق المساندة.		- وزارة الزراعة - وزارة الأشغال العامة		
جهة التمويل المقترحة				
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)		
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: يوجد		لا يوجد		
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☒ نعم ☐ لا		
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع				
الموارد البشرية ☒ متوفرة ☐ متوفرة جزئيا ☐ غير متوفرة		بناء قدرات الجهة المنفذ ☒ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): _____		

دراسات/مخططات متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة		دعم جماهيري ☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئياً ☐ غير مطلوب
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع*		
ايجابية: تحقيق أهداف المشروع. رصد مصادر دخل البلدية بعوائد تشغيل المسلخ.	سلبية: لا ينطبق	تدابير التخفيف: اعداد خطة ادارة بيئية واجتماعية ESMP تتضمن مصفوفة خطة المراقبة والادارة البيئية للمشروع وغرامات للمخالفات
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
المخاطر/المعيقات	إجراءات التغلب عليها	
• عدم توافر التمويل اللازم.	• تفعيل عمل العلاقات العامة و العمل على توفير التمويل اللازم.	
•	•	
خارطة البعد المكاني لمكون البرنامج/المشروع*		
☑ سيتم ادراجها في ملحق الخطة		

ملخص مكون برنامج/ مشروع		
اسم مكون البرنامج/المشروع: أعمال بناء وتشطيب سوق المواشي.	الرقم: EC\1021	البرنامج: تعزيز واقع قطاع الصحة العامة.
خلفية عن مكون البرنامج/المشروع		مكان التنفيذ
يشمل المشروع أعمال بناء وتشطيب سوق المواشي المركزي لمدينة يطا باعتباره ضرورة ملحة نظرا لاعتماد فئة كبيرة من سكان المدينة على تربية المواشي والاتجار بها بالإضافة لدوره في تعزيز قطاع الزراعة وتربية المواشي. سيراغي التصميم اسس البناء الاخضر واستخدام وحدات انارة موفرة للطاقة ومواد ومعدات صديقة للبيئة.		• داخل المدينة
		التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
		• 6/2023
		مدة التنفيذ
		• 1-2 سنوات

هل المشروع يتطلب دراسة اثر بيئي ☐ نعم ☐ لا	هل يقع المشروع في او بالقرب من مناطق حساسة بيئيا كالمحميات الطبيعية او المناطق الرطبة أو المواقع الاثرية المسجلة أو الاماكن التراثية؟ ☐ نعم ☐ لا	هل يترتب على المشروع ترحيل مواطنين او تجمعات سكانية؟ ☐ نعم ☐ لا	هل يحتاج المشروع لنشاطات تطويرية أخرى قد يكون لها آثار بيئية هامة؟ ☐ نعم ☐ لا								
أهداف مكون البرنامج/المشروع	الفئة/ات المستهدفة (مرأة، شباب، فئات مهمشة، ... الخ)	عدد المستفيدين المتوقع	الأهداف التنموية التي يعمل على تحقيقها								
توفير مكان لضبط لبيع وتداول المواشي بين مربي الماشية والتجار .	كافة سكان المدينة والقرى المحيطة بأعمار متفاوتة	120,000 مواطن ومواطنة سنوياً	تعزيز قطاع الزراعة								
وصف مختصر لمكون البرنامج/المشروع وتكاليفه التقديرية											
عناصر مكون البرنامج/المشروع (بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ) حسب مراحله		التكلفة التقديرية * 1000 (\$) حسب سنوات الخطة									
أعمال بناء وتشطيب مسلخ بلدية يطا		<table border="1"> <tr> <td>الأولى</td> <td>الثانية</td> <td>الثالثة</td> <td>الرابعة</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>		الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	800			0
الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة								
800			0								
المجموع (بالأرقام)		800,000									
متطلبات الأراضي (في حال ان مكون البرنامج/المشروع ذي بعد مكاني) *		عملية الإدارة والتشغيل والصيانة *									
☐ الأرض متوفرة ☐ الأرض غير متوفرة ☐ المشروع ليس ذو بعد مكاني		- كيف؟ - ستتم عملية التنفيذ من مقاول معتمد بإشراف بلدية يطا									
في حالة عدم توفر الأرض، ما هي الترتيبات اللازمة لتوفيرها؟		متوفرة									
		- العائد المادي السنوي المتوقع (\$)؟ - بحاجة إلى دراسة جدوى									
هل مكون البرنامج/المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة		☐ نعم ☐ لا									
جهة التنفيذ المقترحة											
الهيئة المحلية (حدد القسم/الأقسام المعنية)		جهات أخرى (حدد)									
دائرة التخطيط و المشاريع و وحدة التنمية ولاستثمار ودائرة المرافق المساندة.		وزارة الزراعة									
جهة التمويل المقترحة											
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)		جهات أخرى (حدد)									
بند الموازنة التي يندرج المشروع ضمنه: يوجد		لا يوجد									
تكاليف تنفيذ مكون البرنامج/المشروع ☐ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة		هل تم الحصول على موافقتها المبدئية؟ ☐ نعم ☐ لا									
المصادر/الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع											
- الموارد البشرية ☐ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة - دراسات/مخططات ☐ متوفرة ☐ متوفرة جزئياً ☐ غير متوفرة		- بناء قدرات الجهة المنفذ ☐ غير مطلوب ☐ مطلوب (حدد): - دعم جماهيري ☐ مطلوب ☐ مطلوب جزئياً ☐ غير مطلوب									
الآثار المتوقعة لتنفيذ مكون البرنامج/المشروع *											

تدابير التخفيف: اعداد خطة ادارة بيئية واجتماعية ESMP تتضمن مصفوفة خطة المراقبة والادارة البيئية للمشروع وغرامات للمخالفات	سلبية: لا ينطبق	ايجابية: تحقيق أهداف المشروع. رقد مصادر دخل البلدية بعوائد تشغيل السوق.
المخاطر/المعيقات التي تواجه تنفيذ مكون البرنامج/المشروع		
إجراءات التغلب عليها		المخاطر/المعيقات
● تفعيل عمل العلاقات العامة و العمل على توفير التمويل اللازم.		● عدم توافر التمويل اللازم.
●		●
